

د افغانستان په ننگرهار ولايت کې د ټولنيزې پرمختيا، بياراستو شويو مهاجرينو او ځايي

هستو ګڼو لپاره پروژه

اخري راپور

جون 2013


د جاپان نړيوالو مرستو نماينده ګی

کتهيرا اونړيوال انجيران

EI

JR

13-056

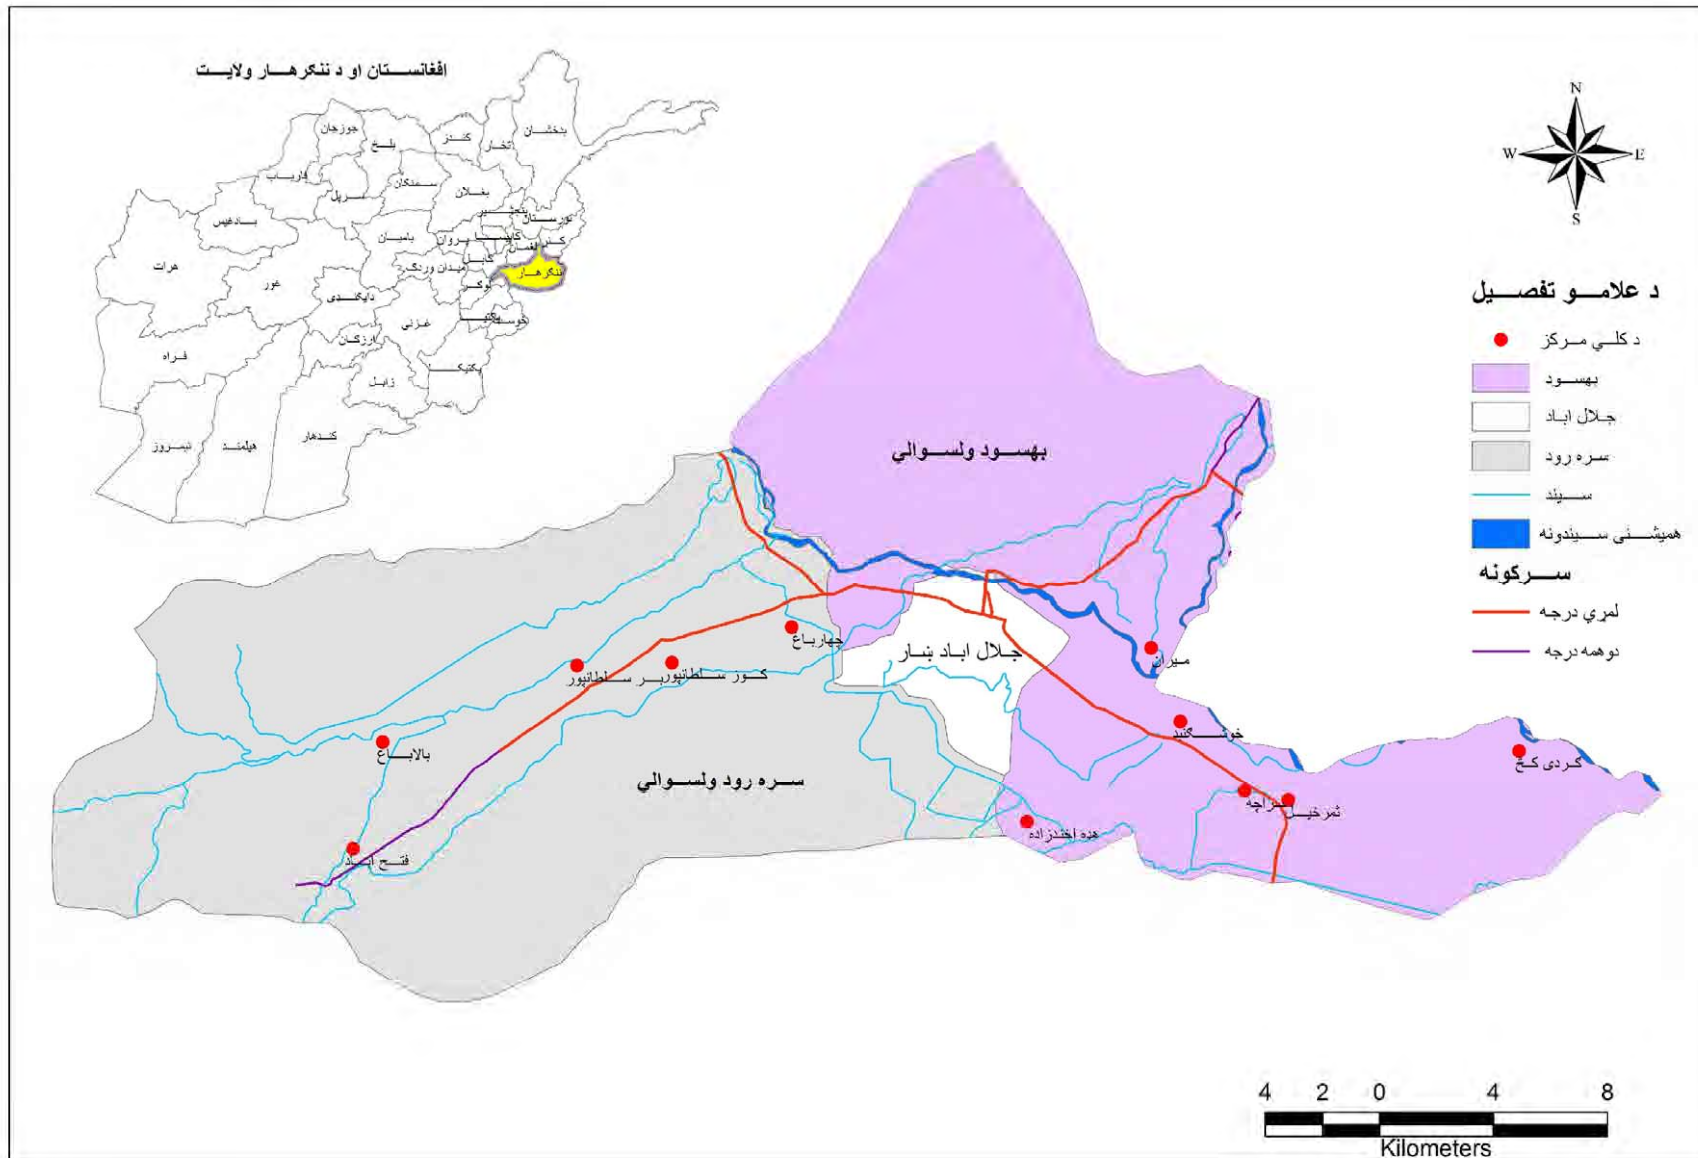

جغرافيايي نقشه

دفعالیتونو انخورونه د پروژی

د امتحانی پروژې پلان کول او انتخابول (۶/۱)
(غونډي)



د ننګرهار ولايت د اجرائيوي رئيس بناغلي محمد حنيف گريوال سره
غونډه
(2010/09/07)



د سره رود ولسوالي محترم ولسوال صاحب سره غونډه
(2010/07/08)



د بهسود ولسوالي محترم ولسوال صاحب سره (2011/01/16)
غونډه



د کليو او پراختيا رياست محترم رئيس سره غونډه (2010/07/05)



د عامي روغتيا رياست محترم رئيس سره غونډه (2010/07/24)



د بنووني او روزني محترم رئيس سره غونډه (2010/07/24)

د امتحانی پروژې پلان کول او انتخابول (۶/۲)
(غونډي)



د ملگرو ملتونو د مهاجرینو ادارې سره غونډه (2010/08/08)



د مهاجرینو محترم رییس سره غونډه (2010/07/21)



د بهسود ولسوالي د هډه اخنډزاده د کلي محترم ملک سره غونډه
(2010/08/05)



د سره رود ولسوالي د چهارباغ د کلي محترم ملک سره غونډه
(2010/08/03)



د بهسود ولسوالي د گردې کڅ د کلي محترم ملک سره غونډه
(2010/08/04)



د سره رود ولسوالي د کوزسلطانپور د کلي محترم ملک سره غونډه
(2010/08/03)

د امتحانی پروژې پلان کول او انتخابول (۶/۳)
(غونډي، ورکشاپ او ساحوي سروی)



د بهسود ولسوالي د خوشگنډ د کلي محترم مشرانو سره غونډه
(2010/08/05)



د بهسود ولسوالي د ثمرخیل د کلي محترم ملک او کلیوالو سره غونډه
(2010/08/04)



ورکشاپ په اجتماعي سروی باندي



ورکشاپ په اجتماعي سروی باندي



د اجتماعي سروی فعالیت



د اجتماعي سروی فعالیت

د امتحانی پروژي پلان کول او انتخابول (۶/۴)
(غوندي او ورکشاپونه)



د مکتب سرینونکي سره غونډه (S-SPU01)
(2010/10/12)



په روغتون کي غونډه (B-HA02)
(2010/10/07)



د نظرونو موافقی ظرفیت لورول، ورکشاپ (ان ار اسی/اف جی ای)
(2011/11/27/28)



د نظرونو موافقی ظرفیت لورول، ورکشاپ د بورډ شورا ته
(2011/11/12)



د نظرونو موافقی ظرفیت لورول، ورکشاپ
(2011/11/13)



د نظرونو موافقی ظرفیت لورول، ورکشاپ د ان ار اسی او همکارۍ موسیسی له لاري بورډ شورا ته
(2011/12/7)

د امتحانی پروژي پلان کول او انتخابول (۶/۵)
 (ولایتي هماهنگي کمیټي غونډه او ساحوي سروی)



د ولایتي هماهنگي کمیټي د غونډي گډونوال (2010/11/09)



د موافقه لیک تبادلې د ولایتي هماهنگي کمیټي په غونډه کي
 (2010/11/09)



د B-SM01 پروژي ساحوي سروی (د ثمرخیل لیسېه)
 (2010/10/09)



د S-BB05 پروژي ساحوي سروی (2010/10/05)
 (د ټول اوبه خور سیستم بیا رغونه)



پیشنهاد کری شوی ځمکه د کلینک د ودانې لپاره د ثمرخیل په هدیره
 کي / د کلینک د ودانې جوړولو لپاره مناسبه نه ده



پیشنهاد کری شوی ځمکه د مکتب د ودانې لپاره په ثمرخیل کي د خور
 په غاره / د مکتب د ودانې جوړولو لپاره مناسبه نه ده

د امتحانی پروژي پلان کول او انتخابول (۶/۶)
 (ولایتي هماهنگي کمیټي غونډه او ساحوي سروی)



نوبتي غونډه د همکاري اداري سره



نوبتي غونډه د همکاري اداري سره



ولایتي هماهنگي کمیټي غونډه (2013/2/12)



ولایتي هماهنگي کمیټي غونډه (2013/2/12)



د حفظ مراقبت او میننول ورکشاپ د بورډ شورا لپاره



د حفظ مراقبت او میننول ورکشاپ د بورډ شورا لپاره

د امتحاني پروژي تطبيق

GK05 پروژه، اوله مرحله د كليوالو په واسطه (۱۴/۱)



د ساحی څخه لیدنه (B-GK05)



پروژه د تطبيق نه مخکي (B-GK05)



د B-GK05 پروژي د کار جریان



بشپړ شوي پروژه (B-GK05)



بشپړ شوی پلچک (B-GK05)



د پروژي کار ته سپارلو مراسم (B-GK05)

د امتحاني پروژي تطبيق

B-KB08 پروژه، اوله مرحله د کليوالو په واسطه (۱۴/۲)



پروژه د تطبيق نه وړاندي (B-KB08)



د پروژي پيل (B-KB08)



د کار جريان (B-KB08)



بشيرشوي پروژه (B-KB08)



بشيرشوي پروژه (B-KB08)



د پروژي کار ته سپارلو مراسم (B-KB08)

د امتحاني پروژي تطبيق

B-KB09 پروژه، اوله مرحله د كليوالو په واسطه (۱۴/۳)



د پروژي پرانيسته (B-KB09)



پروژه د تطبيق نه وړاندي (B-KB09)



د کار جریان (B-KB09)



بشپړشوي پروژه (B-KB09)



بشپړشوي پروژه (B-KB09)



د پروژي کار ته سپارلو مراسم (B-KB09)

د امتحاني پروژي تطبيق

B-KB11 پروژه، اوله مرحله د كليوالو په واسطه (۱۴/۴)



د پروژي پرانيسته او د کار تياري (B-KB11)



پروژه د تطبيق نه وړاندي (B-KB11)



د کار جريان (B-KB11)



بشپړشوي پروژه (B-KB11)



بشپړشوي پروژه (B-KB11)



د پروژي کار ته سپارلو مراسم (B-KB11)

د امتحاني پروژي تطبيق

B-M07 پروژه، اوله مرحله د کليوالو په واسطه (۱۴/۵)



د پروژي د کار جريان (B-M07)



د پروژي تطبيق نه وړاندي (B-M07)



د پروژي د کار جريان (B-M07)



بشپړشوي پروژه (B-M07)



بشپړشوي پروژه (B-M07)



د پروژي کار ته سپارلو مراسم (B-M07)

د امتحاني پروژي تطبيق

B-SR12 پروژه، اوله مرحله د كليوالو په واسطه (۱۴/۶)



د پروژي تطبيق نه وړاندي (B-SR12)



د پروژي پيل (B-SR12)



د پروژي د کار جريان (B-SR12)



بشپړشوي پروژه (B-SR12)



بشپړشوي پروژه (B-SR12)



د پروژي کار ته سپارلو مراسم (B-SR12)

د امتحاني پروژي تطبيق

S-BB05 پروژه، اوله مرحله د كليوالو په واسطه (۱۴/۷)



د پروژي پرانيسته (S-BB05)



د پروژي د تطبيق نه وړاندي (S-BB05)



بشپړشوي پروژه (S-BB05)



بشپړه پروژه (S-BB05)



بشپړشوي پروژه (S-BB05)



د پروژي کار ته سپارلو مراسم (S-BB05)

د امتحاني پروژي تطبيق

S-CB15 پروژه، اوله مرحله د كليوالو په واسطه (۱۴/۸)



د پروژي پرانيسته او تطبيق (S-CB15)



د پروژي تطبيق څخه وړاندي (S-CB15)



د کار جريان (S-CB15)



بشپړ شوي پروژه (S-CB15)



بشپړه پروژه (S-CB15)



د پروژي کار ته سپارلو مراسم (S-CB15)

د امتحاني پروژي تطبيق
S-CB17 پروژه، اوله مرحله د كليوالو په واسطه (۱۴/۹)



د پروژي پرانيسته او تطبيق (S-CB17)



د پروژي د تطبيق نه وړاندي (S-CB17)



د کار جريان (S-CB17)



بشپړشوي پروژه (S-CB17)



بشپړشوي پروژه (S-CB17)



د پروژي کار ته سپارلو مراسم (S-CB17)

د امتحاني پروژي تطبيق

S-SPL03 پروژه، اوله مرحله د کليوالو په واسطه (۱۴/۱۰)



د تطبيق نه وړاندې (S-SPL03)



د پروژي پيل (S-SPL03)



د کار جريان (S-SPL03)



بشپړ شوي پروژه (S-SPL03)



بشپړ شوي پروژه (S-SPL03)



د پروژي کار ته سپارلو مراسم (S-SPL03)

د امتحاني پروژي تطبيق

S-SPL07 پروژه، اوله مرحله د کليوالو په واسطه (۱۴/۱۱)



د پروژي تطبيق نه وړاندي (S-SPL07)



د پروژي پيل (S-SPL07)



د کار جریان (S-SPL07)



بشپړشوي پروژه (S-SPL07)



بشپړشوي پروژه (S-SPL07)



د پروژي کار ته سپارلو مراسم (S-SPL07)

د امتحاني پروژي تطبيق

S-SPU11 پروژه، اوله مرحله د کليوالو په واسطه (۱۴/۱۲)



د پروژي تطبيق نه وړاندي (S-SPU11)



د پروژي پيل (S-SPU11)



د کار جريان (S-SPU11)



بشپړشوي پروژه (S-SPU11)



بشپړشوي پروژه (S-SPU11)



د پروژي کار ته سپارلو مراسم (S-SPU11)

د امتحاني پروژي تطبيق

S-SPU12 پروژه، اوله مرحله د کليوالو په واسطه (۱۴/۱۳)



د پروژي تطبيق نه مخکي (S-SPU12)



د پروژي پيل (S-SPU12)



د کار جريان (S-SPU12)



بشپړشوي پروژه (S-SPU12)



بشپړشوي پروژه (S-SPU12)



د پروژي کار ته سپارلو مراسم (S-SPU12)

د امتحاني پروژي تطبيق

S-SPU15 پروژه، اوله مرحله د کليوالو په واسطه (۱۴/۱۴)



د پروژي تطبيق نه وړاندې (S-SPU15)



د پروژي پيل (S-SPU15)



د کار جريان (S-SPU15)



بشپړ شوي پروژه (S-SPU15)



بشپړ شوي پروژه (S-SPU15)



د پروژي کار ته د سپارلو مراسم (S-SPU15)

د امتحاني پروژي تطبيق

S-FA07 پروژه، دوهمه مرحله د کليوالو په واسطه (۲/۱)



د پروژي تطبيق نه مخکي (S-FA07)



د پروژي پيل (S-FA07)



د کار جريان (S-FA07)



بشپړشوي پروژه (S-FA07)



بشپړشوي پروژه (S-FA07)



بشپړشوي پروژه (S-FA07)

د امتحاني پروژي تطبيق

S-SPU08 پروژه، دوهمه مرحله د كليوالو په واسطه (۲/۲)



د پروژي پرانيسته (S-SPU08)



د تطبيق نه وړاندي (S-SPU08)



د کار جريان (S-SPU08)



بشپړشوي پروژه (S-SPU08)



بشپړشوي پروژه (S-SPU08)



بشپړشوي پروژه (S-SPU089)

د امتحاني پروژي تطبيق
B-GK07 پروژه، دريمه مرحله د كليوالو په واسطه (۸/۱)



د تطبيق نه مخکي (B-GK07)



د پروژي پيل (B-GK07)



د کار جريان (B-GK07)



بشپړه شوي پروژه (B-GK07)



بشپړشوي پروژه (B-GK07)



د پروژي کار ته د سپارلو مراسم (B-GK07)

د امتحاني پروژي تطبيق
B-GK09 پروژه، دريمه مرحله د كليوالو په واسطه (۸/۲)



د کار پیل (B-GK09)



د کار جریان (B-GK09)



بشپړ شوی کوهي (No. 4, B-GK09)



بشپړ شوی کوهي (No. 21, B-GK09)



بشپړ شوی کوهي (No. 37, B-GK09)



د پروژي کار ته سپارلو مراسم (B-GK09)

د امتحاني پروژي تطبيق
 B-SM14 پروژه، دريمه مرحله د كليوالو په واسطه (۸/۳)



د تطبيق نه وړاندي (B-SM14)



د کار پیل (B-SM14)



د تطبيق جريان (B-SM14)



بشپړ شوی پروژه (B-SM14)



بشپړ شوي پروژہ (B-SM14)



د پروژي کار ته سپارلو مراسم (B-SM14)

د امتحاني پروژي تطبيق
 S-CB08 پروژه، دريمه مرحله د كليوالو په واسطه (۸/۴)




د تطبيق نه وړاندي (S-CB08)



بشپړ شوی پروژه (S-CB08)



د کار جریان (S-CB08)

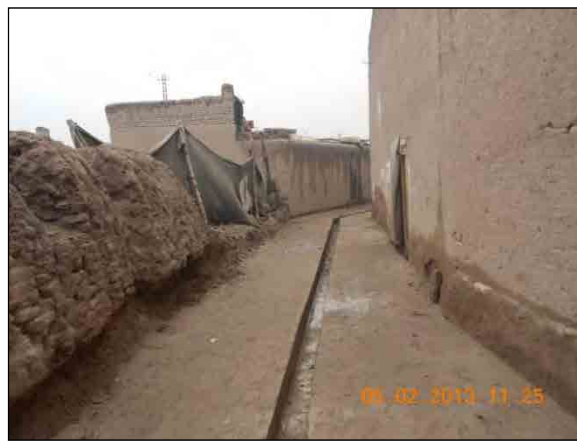

بشپړ شوی پروژه (S-CB08)



بشپړ کړی شوی پروژه (S-CB08)



د پروژي کار ته سپارلو مراسم (S-CB08)

د امتحاني پروژي تطبيق

S-CB13 پروژه، دريمه مرحله د کليوالو په واسطه (۸/۵)



د تطبيق نه وړاندي (S-CB13)



د پروژي پيل (S-CB13)



د کار جريان (S-CB13)



بشپړ شوی پروژه (S-CB13)



بشپړ شوی پروژه (S-CB13) Completion



د پروژي کار ته سپارلو مراسم (S-CB13)

د امتحاني پروژي تطبيق
S-CB18 پروژه، دريمه مرحله د كليوالو په واسطه (۸/۶)



د کوهی لپاره د خای انتخاب (S-CB18)



د کار جریان (S-CB18)



بشپړ شوی کوهی (No.1, S-CB18)



بشپړ شوی کوهی (No. 7, S-CB18)



بشپړ شوی کوهی (No. 21, S-CB18)



د پروی کار ته سپارلو مراسم (S-CB18)

د امتحاني پروژي تطبيق

S-FA14 پروژه، دريمه مرحله د کليوالو په واسطه (۸/۷)



د کار پیل (S-FA14)



د کار جريان (S-FA14)



بشپړ شوی کوهي (No. 5, S-FA14)



بشپړ شوی کوهي (No. 7, S-FA14)



بشپړ شوی کوهي (No. 20, S-FA14)



د پروژي کار ته سپارول مراسم (S-FA14)

د امتحاني پروژي تطبيق

S-SPL04 پروژه، دريمه مرحله د كليوالو په واسطه (۸/۸)



د تطبيق نه وړاندي (S-SPL04)



د پروژي پيل (S-SPL04)



د کار جريان (S-SPL04)



بشپړ شوي سرک (S-SPL04)



بشپړ شوی سرک (S-SPL04)



د پروژي کار ته سپارلو مراسم (S-SPL04)

د امتحاني پروژي تطبيق
داولي مرحلي قراردادی پروژو د داوطلبی مراسم



د داوطلبی نه وړاندي غونډه (2010/12/11)



د داوطلبی جریان (2010/12/18)



د قرارداد امضا (2010/12/19)



د قرارداد امضا (2010/12/19)

د امتحاني پروژي تطبيق
د دوهمي مرحلي قراردادى پروژو د داوطلبى مراسم



د داوطلبى څخه وړاندي غونډه
(2011/08/16)



د داوطلبى اسنادو خلاصول
(2011/09/13)



د داوطلبى اسنادو خلاصول
(2011/9/13)



داوطلبى د نتيجى اعلان
Lot-8/(2011/09/19)

Rank	Company Name	Score	Price
1	Tech Myanmar Group Construction Company (T.M.G.C)	✓	23711800
2	Yes-Service, Connectivity and Experience Co (Y.S.E.C)	✓	21722150
3	Tech-Consulting & Services (T.C.S)	✓	20280000
4	Myanmar Electric Construction Company (M.E.C)	✓	10040000
5	Myanmar Service Construction Company (M.S.C)	✓	18609600
6	Myanmar Electric Construction Company (M.E.C)	✓	17554700

د داوطلبى د نتيجو اعلان
Lot-8/(2011/09/19)



د قراردادونو امضا مراسم
(2011/10/05)

د امتحاني پروژي تطبيق

B-KB01 پروژه، لمري مرحله د قراردادياتو په واسطه (۵/۱)



د پروژي د پرانيستني مراسم (B-KB01)



د پروژي تطبيق نه وړاندي (B-KB01)



د کار جريان (B-KB01)



بشر شوي پروژه (B-KB01)



بشپړشوي پروژه (B-KB01)



د پروژي کار ته سپارلو مراسم (B-KB01)

د امتحاني پروژي تطبيق

B-SM01 پروژه، لمري مرحله د قرارداد ايانو په واسطه (۵/۲)



د پروژي د تطبيق نه وړاندې (B-SM01)



د پروژي پيل (B-SM01)



د کار جريان (B-SM01)



بشپړ شوی پروژه (B-SM01)



بشپړ شوی پروژه (B-SM01)



د پروژي کار نه سپارول مراسم (B-SM01)

د امتحاني پروژي تطبيق

B-SR01 پروژه، لمري مرحله د قراردادياتو په واسطه (۵/۳)



د پروژي تطبيق نه وړاندې (B-SR01)



د پروژي پيل (B-SR01)



د کار جريان (B-SR01)



بشپړ شوی پروژه (B-SR01)



بشپړ شوی پروژه (B-SR01)



د پروژي کار ته د سپارلو مراسم (B-SR01)

د امتحاني پروژي تطبيق

B-SR02 پروژه، لمري مرحله د قراردادياتو په واسطه (۵/۴)



د پروژي تطبيق نه وړاندې (B-SR02)



د پروژي پيل (B-SR02)



د کار جريان (B-SR02)



بشپړ شوی پروژه (B-SR02)



بشپړ شوی پروژه (B-SR02)



پروژه کار ته د سپارلو مراسم (B-SR02)

د امتحاني پروژي تطبيق

S-FA01 پروژه، لمري مرحله د قراردادياتو په واسطه (۵/۵)



د پروژي پيل نه وړاندې غونډه (S-FA01)



د پروژي د تطبيق نه وړاندې (S-FA01)



د کار جريان (S-FA01)



بشپړ شوی پروژه (S-FA01)



بشپړ شوی پروژه (S-FA01)



د پروژي کار ته د سپارلو مراسم (S-FA01)

د امتحاني پروژي تطبيق

B-HA01 پروژه، دوهمه مرحله د قراردادياتو په واسطه (۱۱/۱)



د پروژي تطبيق نه وړاندې (B-HA01)



د کار جريان (لمري مرحله / B-HA01)



د کار جريان (لمري مرحله / B-HA01)



بشپړ شوی پروژه ((دوهمه مرحله / B-HA01)



بشپړ شوی پروژه ((دوهمه مرحله / B-HA01)



بشپړ شوی پروژه ((دوهمه مرحله / B-HA01)

د امتحاني پروژي تطبيق

B-GK01_02 پروژه، دوهمه مرحله د قراردادياتو په واسطه (۱۱/۲)



د پروژي تطبيق نه وړاندې (B-GK01_02)



د کار جريان (لمري مرحله / B-GK01_02)



د کار جريان (لمري مرحله / B-GK01_02)



بشپړ شوي پروژه (دوهمه مرحله / B-GK01_02)



بشپړ شوي پروژه (دوهمه مرحله / B-GK01_02)



بشپړ شوي پروژه (دوهمه مرحله / B-GK01_02)

د امتحاني پروژي تطبيق

B-GK02_03 پروژه، دوهمه مرحله د قراردادياتو په واسطه (۱۱/۳)



د پروژي د تطبيق نه مخکي (B-KB02_03)



د کار جريان (لمري مرحله / B-KB02_03)



د کار جريان (اوله مرحله / B-KB02_03)



بشپړ شوی پروژه (دوهمه مرحله / B-KB02_03)



بشپړ شوی پروژه (دوهمه مرحله / B-KB02_03)



پروژي کار ته د سپارلو مراسم

د امتحاني پروژي تطبيق

B-M01 پروژه، دوهمه مرحله د قراردادياتو په واسطه (۱۱/۴)



د تطبيق نه وړاندي (B-M01)



د کار جريان (اوله مرحله / B-M01)



د کار جريان (لمري مرحله / B-M01)



بشپړ شوی پروژه (دوهمه مرحله / B-M01)



بشپړ شوی پروژه (دوهمه مرحله / B-M01)



بشپړ شوی پروژه (دوهمه مرحله / B-M01) C

د امتحاني پروژي تطبيق

B-M03 پروژه، دوهمه مرحله د قراردادياتو په واسطه (۱۱/۵)



د پروژي پرانيسټونکي غونډه (B-M03)



د پروژي تطبيق نه وړاندي (B-M03)



د کار جريان (B-M03)



د کار جريان (B-M03)



بشپړ شوی سرک (B-M03)



بشپړ شوی سرک (B-M03)

د امتحاني پروژي تطبيق

B-SR03 پروژه، دوهمه مرحله د قراردادياتو په واسطه (۱۱/۶)



د پروژي پرانيستنه (اوله مرحله / B-SR03)



د پروژي تطبيق نه وړاندي (اوله مرحله / B-SR03)



د کار جريان (اوله مرحله / B-SR03)



د کار جريان (اوله مرحله / B-SR03)



بشپړ شوی پروژه (دوهمه مرحله / B-SR03)



بشپړ شوی پروژه (دوهمه مرحله / B-SR03)

د امتحاني پروژي تطبيق

B-SR05 پروژه، دوهمه مرحله د قراردادياتو په واسطه (۱۱/۷)



د پروژي پرانيستنه (B-SR05)



د پروژي تطبيق نه وړاندې (B-SR05)



د کار جريان (اوله مرحله / B-SR05)



بشپړ شوی پروژه (دوهمه مرحله / B-SR05)



بشپړ شوی پروژه (دوهمه مرحله / B-SR05)



بشپړ شوی پروژه (دوهمه مرحله / B-SR05)

د امتحاني پروژي تطبيق

S-CB01_02 پروژه، دوهمه مرحله د قراردادياتو په واسطه (۱۱/۸)



د تطبيق نه وړاندي
(S-CB01_02)



د کار جريان
(لمري مرحله / S-CB01_02)



Implementation Progress
(لمري مرحله / S-CB01_02)



بشپړ شوی پروژه
(دوهمه مرحله / S-CB01_02)



بشپړ شوی پروژه
(دوهمه مرحله / S-CB01_02)



پروژي کار ته د سپارلو مراسم
(دوهمه مرحله / S-CB01_02)

د امتحاني پروژي تطبيق

S-CB07 پروژه، دوهمه مرحله د قراردادياتو په واسطه (۱۱/۹)



د پروژي تطبيق نه وړاندي / د شروع نقطه (S-CB07)




د پروژي د تطبيق نه وړاندي (S-CB07)



د کار جريان (S-CB07)



د کار جريان (S-CB07)

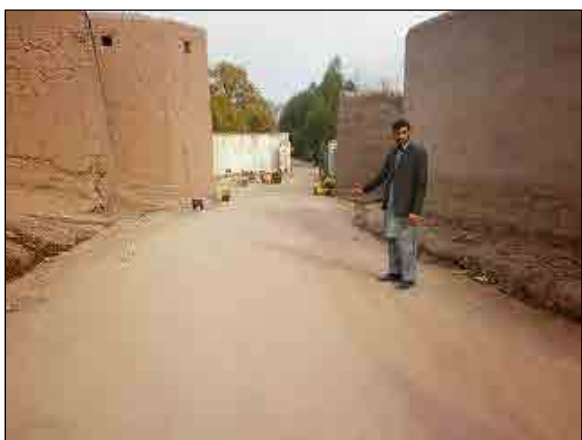

بشپړ شوی پروژه (S-CB07)



بشپړ شوی پروژه (S-CB07)

د امتحاني پروژي تطبيق

S-SPL10_11 پروژه، دوهمه مرحله د قراردادياتو په واسطه (۱۱/۱۰)



د پروژي پرائيستونکي غونډه (لمړی مرحله / S-SPL10_11)



د کار جريان (لمړی مرحله / S-SPL10_11)



د کار جريان (لمړی مرحله / S-SPL10_11)



بشپړ شوی پروژه (دوهمه مرحله / S-SPL10_11)



بشپړ شوی پروژه (دوهمه مرحله / S-SPL10_11)



بشپړ شوی پروژه (دوهمه مرحله / S-SPL10_11)

د امتحاني پروژي تطبيق

S-SPU01 پروژه، دوهمه مرحله د قراردادياتو په واسطه (۱۱/۱۱)



د پروژي پرانيستونکي غونډه (S-SPU01)



د پروژي د تطبيق نه وړاندې (S-SPU01)



د کار جريان (اوله مرحله / S-SPU01)



د کار جريان (اوله مرحله / S-SPU01)



بشپړ شوی پروژه (دوهمه مرحله / S-SPU01)



بشپړ شوی پروژه (دوهمه مرحله / S-SPU01)

د امتحاني پروژي تطبيق

B-HA02 & B-SR01_02 (1/4,2/4) پروژه، دوهمه مرحله د قراردادياتو په واسطه (وړی پروژي)



د تطبيق نه وړاندي (B-HA02)



د کار جريان (B-HA02)



د کار جريان (B-HA02)



بشپړ شوي پروژه (B-HA02)



د پروژي تطبيق نه وړاندي (B-SR01_02)



بشپړ شوي پروژه (B-SR01_02)

د امتحاني پروژي تطبيق

S-BB01_02 & (S-FA02(3/4,4/4)) پروژه، دوهمه مرحله د قراردادياتو په واسطه (وری پروژي)



د تطبيق نه وړاندي (S-BB01_02)



د کار جريان (S-BB01_02)



بشپړ شوي پروژه (S-BB01_02)



د تطبيق نه (S-FA02) وړاندي
Before Project Implementation



د کار جريان (S-FA02)



بشپړ شوي پروژه (S-FA02)

د افغانستان په ننګرهار ولايت کې د ټولنيزې پرمختيا، بياراستو شويو مهاجرينو او حلي هستوګنولپاره پروژه

اخري راپور

فهرست

جغرافيه نقشه

د فعاليتونو انځورونه - پروژي

لړليک

1	د پروژې مهم ټکي	1
1.1	پس منظر	1
1.2	د پروژې کاري چوکاټ	1
1.2.1	د پروژې موخه:	1
1.2.2	لاسته راوړنې:	1
1.2.3	د پروژې دکاري چوکاټ طرحه:	2
2	فعاليتونه	2
2.1	لومړۍ پړاو:	2
2.1.1	د پيل دراپور تهياد او ترتيب:	2
2.1.2	د FP همکاري موسسې سره تړون:	2
2.1.3	په ننګرهار ولايت کښې د امنيتي حالت او دشخړو مخنيوی مطالعه:	3
2.1.4	د 11 ټکل شويو کليو لپاره ټولنيزه سروی:	4
2.1.5	د سلختمني چارو لپاره د قرار دايانو غوره کول:	5
2.1.6	د نظر يووالي طريقه:	5
2.1.6.1	نکلي په کچې د نظر يووالي سيستم جوړول	5
2.1.6.2	د زمينې پروژو په ټاکلو کې د اړوند برخوالو نظر يووالي:	6
2.1.6.3	د زمينې پروژو د تطبيق د پلان لپاره دکومي تدابيرو تهياد:	8
2.1.6.4	د نظرونو موافقي ته قوت ورکول:	8
2.1.7	د لومړۍ مرحلې کاري طرحې په بله کې خپري تړی:	9
2.1.8	د لومړي گروپ زمينې پروژو غوره کول او پلانول:	9
2.1.9	د لومړي گروپ زمينې پروژو پلي کول:	10
2.1.9.1	د کليو او په واسطه د لومړۍ زمينې پروژې تطبيق د حفظ او مراقبت د لارښود په اسلې:	10
2.1.9.2	د څارنې او ساتنې د لارښود له مخې د لومړي گروپ قرار داي پروژو تطبيق:	14
2.1.10	د لومړي گروپ زمينې پروژو په څارنه او سلنه کې مرسته:	17
2.1.10.1	د څارنې او سلنې د لارښود برابرول:	17
2.1.11	نيمه نهيلی لارښود برابرول	18

18.....	2.1.11.1 د تطبيق لارښود:
19.....	2.1.11.2 د ځل لارښود
19.....	2.1.12 د دويم گروپ ازماينتي پروژو غوره کول او پلانول:
21.....	2.1.13 د دويم گروپ ازماينتي پروژو پلي کول
21.....	2.1.13.1 د ځل لارښود په اسس دکليوالو په واسطه د عملی کيدونکو پروژو پلي کول:
24.....	2.1.13.2 د ځل او کل د لارښود له مخي دويم گروپ قراردادي پروژو پلي کول:
28.....	2.1.14 په بهسودو او سره رود ولسواليو کې د پرمختيايي اړتياو سره کول:
28.....	2.1.15 د پروژي د لومړي پړاو د پرمختگ د راپور جوړول:
28.....	2.2 دويم پړاو
28.....	2.2.1 د دويم پړاو کاري طرحه په اړوند نظر ونو تېلله:
28.....	2.2.2 همکاري موسيسی سره تړون
29.....	2.2.3 د دوهم گروپ قراردادی ازماينتي پروژو تطبيق (د لومړي پړاو په دوام)
32.....	2.2.4 د امتحالی پروژو د لمری او دوهم گروپ لپاره د حفظ او مراقبت سره مرسته
32.....	2.2.5 د دريم گروپ امتحالی پروژو انتخاب او پلانول
33.....	2.2.6 دکليوالو په واسطه پلي کيدونکو دريم گروپ ازماينتي پروژي
35.....	2.2.7 دريم گروپ امتحالی پروژو حفظ او مراقبت سره مرسته کول-
35.....	2.2.8 د GA د پروژي انتخاب او طرحه "د NRRC نور فعاليتونه"
35.....	2.2.9 د لارښودونو تقسيم او کره کول
35.....	2.2.9.1 د ځل د لارښود کره کول:
36.....	2.2.9.2 -د تطبيق د لارښود کره کول:
37.....	2.2.9.3 د رهنما لارښودونو تشریح او تقسيمول
37.....	2.2.10 د امتحالی پروژو ارزلیلی
39.....	2.2.11 د قرار د لياتو په واسطه تطبيق شویو دويم گروپ ازماينتي پروژو دورتي يا تضمین څخه وروستی ليدنه:
39.....	2.2.12 د آخري راپور جوړول
39.....	2.3 د قرار د لياتو په دوران کې ټول تر سره شوي فعاليتونه
39.....	2.3.1 په متناوم شکل د امنيتي حالاتو سره
39.....	2.3.2 د معلوماتو شريکول مجلسونه د پروژي د همغږی غونډه کې
40.....	3 د پروژو پلي کولو پر مهل اور پيل، زده کړه او تنگوني
40.....	3.1 په تنگي هر ولايت کې دشخړو مخنيوي او امنيتي حالاتو مطالعه کول:
41.....	3.2 په يو ولسواليو کې ټولنيزه سره:
41.....	3.3 د سلختمن چارو مطالعه او يقيني کول:
42.....	3.4 دکلي په کچه د نظر د يووالي جوړښت رامنځته کول:
43.....	3.5 د ازماينتي پروژو غوره کول او پلانول:
43.....	3.6 د ازماينتي پروژي پلي کول
43.....	3.6.1 دکليوالو په واسطه پلي کيدونکو پروژو پلي کول:
44.....	3.6.2 د قراردادي پروژو پلي کول:
45.....	3.7 د سلتي او ځل په برخه کې مرسته کول:
45.....	3.8 په بهسودو او سره رود ولسواليو کې د پرمختيايي اړتياو سره کول:
46.....	3.9 د لري نه ځلنه

46.....	د پروژې هدف تر لاسه کول	4
46.....	دلومړي کاري جريبن دنظارت هيئت:	4.1
47.....	کاري پر مختگ او د پروژې نور فعاليتونه	4.1.1
47.....	د پروژې د نتيجې خپرول:	4.1.2
47.....	دويم ټکري پر مختگ دنظارت هيئت:	4.2
47.....	وروستي ارزيلي:	4.3
47.....	دارزيلي نتيجې:	4.3.1
48.....	درس، زده کړه او سپارښتنې:	4.3.2
49.....	د عمومي هدف لاسته راوړنو سپارښتنې:	5
50.....	مل (ضميمه)	6
50.....	د پروژې د طرحې او ديزاين لومړۍ بڼه (مسوده)	6.1
52.....	چلريز مهلويش:	6.2
53.....	د چلريز جوړښت تفصيل	6.3
56.....	د چلرو سپارلو مهلويش:	6.4
58.....	د ولايتي مشورتي ټلې يادښت:	6.5

2. په 1-2.1 جنول دFP سره دقرار دخالصه.....
5. په 2-2.1 جنول دتطبيق لپاره ترتيب شوی جوړښت.....
6. په 3-2.1 جنول د لومړي گروپ پروژو د نظر يووالي اسلسي مراحل.....
7. په 4-2.1 جنول په دويم گروپ پروژو کې د نظر يووالي اسلسي مراحل يووالي لپاره جنول وگورئ:.....
8. په 5-2.1 جنول هغه فعاليتونه چې د نظرونو يووالي او جوړښت قوي کوي په لاندې جنول کې وگورئ.....
9. په 6-2.1 جنول د لومړي گروپ از مینتي پروژو د انتخاب معيارونه.....
10. په 7-2.1 جنول د لومړي گروپ د از مینتي پروژو لپست په لاندې جنول کې وگورئ:.....
11. په 8-2.1 جنول د لومړي گروپ از مینتي کليوالي پروژو کې د ورکړل شويو تريتنگونو دخالصه.....
12. په 9-2.1 جنول اړوندو خواوو مسوليتونه:.....
13. په 10-2.1 جنول دکليوالو په واسطه د لومړي گروپ از مینتي پروژو نچر (خالصه).....
14. په 11-2.1 جنول د لومړي گروپ از مینتي پروژو د ازادې سيلی د مراحلو لخوا.....
14. په 12-2.1 جنول کې لومړي گروپ از مینتي پروژو لپاره قرار داديوا لپست.....
15. په 13-2.1 جنول د لومړي گروپ از مینتي پروژو د قرار داد شرايط.....
15. په 14-2.1 جنول لومړی گروپ د امتحانی قرار دادی پروژي دروزنی خالصه.....
16. په 15-2.1 جنول لومړي گروپ کې د قرار داديوا په واسطه دتطبيقونکو از مینتي پروژو لنډيز.....
18. په 16-2.1 جنول دتطبيق د لارښود محتويات.....
19. په 17-2.1 جنول دڅارني د لارښود محتويات.....
19. په 18-2.1 جنول کې دويم گروپ د پروژو د انتخاب معيارونه.....
20. په 19-2.1 جنول دوهم گروپ انتخاب شويو از مینتي پروژو لپست.....
23. په 20-2.1 جنول دنتوانی په واسطه د عملی کيدونکو امتحانی پروژو دوهم گروپ خالصه.....
25. په 21-2.1 جنول کې دوهم گروپ د امتحانی پروژو د لواطلی خالصه.....
25. په 22-2.1 جنول دويم گروپ د امتحانی پروژو د قرار داديوا لپست.....
25. په 23-2.1 جنول دويم گروپ از مینتي پروژو د قرار داد شرايط.....
27. په 24-2.1 جنول دوهم گروپ د قرار دادی امتحانی پروژو خالصه.....
29. په 1-2.2 جنول همکاري موسيسی سره دنتون لنډيز.....
29. په 2-2.2 جنول کې د لواطلی مراحل دويم گروپ دپلي قرار دادی په واسطه دتطبيق کيدونکی امتحانی پروژي.....
30. په 3-2.2 جنول دوهم گروپ د امتحانی پروژو لپاره د قرار داديوا لپک.....
30. په 4-2.2 جنول دوهم گروپ د امتحانی پروژو د قرار داد حالت.....
31. په 5-2.2 جنول دوهم گروپ د قرار دادی امتحانی پروژو خالصه.....
32. په 6-2.2 جنول د حفظ او مراقبت دور کشلپونه لست.....
32. په 7-2.2 جنول دکليوالو په واسطه پلي کيدونکی دريم گروپ از مینتي پروژو د انتخاب معيارونه.....
33. په 8-2.2 جنول د دريم گروپ انتخاب شويو امتحانی پروژو لپست.....
34. په 9-2.2 جنول د دريم گروپ امتحانی پروژو خالصه.....
36. په 10-2.2 جنول دکليوالو په واسطه دتطبيقونکو پروژو دڅار د لارښود جوړښت.....
36. په 11-2.2 جنول دکليوالو په واسطه پلي کيدونکی نوعي د نظرات د جوړښت لارښود.....
37. په 12-2.2 جنول دتطبيق د لارښود جوړښت.....
37. په 13-2.2 جنول د لارښودونو د تقسيمولو لپست.....
38. په 14-2.2 جنول د امتحانی پروژو ارزلیبی.....
39. په 1-2.3 جنول د پروژي د همغږی غونډي تفصیلاتو جنول.....

په 1-4.3 جنول دارزېلې نتیجه 48.....

شکل 1-2.1 دکلیو الوپه واسطه پلي کېدونکو پروژو زیدخلو لور و رابطوي انځور په لاندې توگه لیدلای شئ: 11.....

شکل 2-2.1 تکمیلونکی اداری دقرار دادی پروژو لپاره (پلان) 14.....

شکل 3-2.1 بشپړ اداری تشکیل دکلېوالی پروژو لپاره پلان 24.....

شکل 4-2.1 دقرار دادی از مایننتی پروژو لپاره عملی بڼه 24.....

1. د پروژې مهم ټکي

1.1 پس منظر

د افغانستان ټول نفوس 24.5 میلیونه اوسیدونکی اټکل شوی، چې د ټولو نفوس څخه 5.6 میلیونه اوسیدونکی یې بیرته راسته شوی دی. په دې سره بیرته 1.2 میلیونه کورنۍ په داخل د هیواد کې بې ځای شوی دی چې د بېلارو سرته شوی او د غه پروسه دوام لري.

هیواد ته د بیرته راستنیدونکو مهاجرینو پروسه به دوام وکړي ځکه چې اوس هم 2.2 میلیونه مهاجر افغان په پاکستان او 0.9 میلیونه افغان مهاجر په ایران کې اوسېږي. د هیواد بیرته راستنیدونکو مهاجرینو مرکزي ساحه کابل او په ختیځ زون کې ننګرهار ولایت ټاکل شوی دی په ځنګړي توګه د ننګرهار ولایت د نیمه زیات اوسیدونکی بیرته راسته شوی مهاجرین اټکل شوی دی.

د بیرته راستنې شویو مهاجرینو د نیمه زیاتو راستنیدل یوه جدې ستونزه د ټولنیز استحکام، بیل غونې او د افغانستان د اقتصادي پرمختیا عامل ګرځیدلی ده. په دې اسلې د بیرته راستنې شویو مهاجرینو په ځای کول په افغانستان کې یوه بېرته مهمه موضوع ټاکل شوی ده.

په هغه یاد شوی حالت کې UNHCR د کوالوچلو وزارت په مرسته بیرته راستنې شویو مهاجرینو ته د هغوی په خپلو بنارونو کې د کلز مینه او بشري مرستې ورکړي.

پردې سره د ژوندانه بهیر ښه کیدل، د ټولنیز او اقتصادي بنسټ لوړتیا، هیواد ته د راستنې شویو مهاجرینو په پراخې کولو کې بېرته مهم او ضروري بلل شوی دی. په ځنګړي توګه د ننګرهار په ولایت کې دا ضروري ده چې ټولنیز بنسټونه لوړ شي ځکه چې له پاکستان څخه د راستنې شویو مهاجرینو مرکز ګڼل شوی دی.

د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د ملي پېوستون پروګرام تر سره کوي، چې دا د پراختیایي شوراګانو جوړول د کلیو په کچې دی. د سیمه ییزو ارګانونو قوې کول او د هغوی نظر فیټونو لوړول د پراختیایي پروژو په ترسره کولو سره چې د نړیوال بانک په مرسته ترسره کېږي سره بېرته ډیرې زیاتې ستونزې لکه د قرار دای موسسو ضعیفه کار کولو، د تجارتي قرار دایټو ضعیف او کمزوري اصول، د مدیریت سیستم او د ټولنیزو غیر مسؤلانه او کمزوري تصمیم نیونه د پروژو د شفاف تطبیق مانع ګرځي او همدارنګه نورو مرستو او همکارو ته ضرورت لیدل کېږي.

1.2 د پروژې کلري چوکاټ

1.2.1 د پروژې موخه:

د ابتدایي ټولنیزو بنسټونو د لوړولو لپاره په سره رود او بهسودو ولسوالیو کې د پروژو ترسره کول ترڅو هلته ابتدایي ټولنیز بنسټونه لوړ او بیرته راستنې شویو مهاجرینو او ځایي هستوګنو د ټولنیز ژوند چاپیریال بهتر شي.

1.2.2 لاسته راوړنې:

- (1) د ننګرهار په سره رود او بهسودو ولسوالیو کې د موجوده حالاتو د پرمختیایي اړتیا د ضرورتونو سره یو.
- (2) د محلي خلکو په ونډې اخستې سره د ازملینتې پروژو غوره کول او د تطبیق طرحه برابرول.
- (3) داسې یو چوکاټ جوړول چې د کوچنیو کلیوالي اسلې پروژې د کلیوالو په واسطه تطبیق شي.
- (4) داسې یو چوکاټ برابرول چې اسلې پروژې د ځایي (افغاني) قرار دایټو په واسطه تطبیق شي.
- (5) د کلی په کچه د زیربینایي پروژو لپاره د حفظ او مراقبت د پلان تقریبه کول.

1.2.3 د پروژې د کاري چوکاټ طرحه:

د پروژې پایله او کاري بهیر لومړۍ بڼه په (6-1) شکل کې لیدلای شئ.
د پروژې کاري چوکاټ لومړۍ طرحه به د پروژې د همغږي ډلې له تائید وروسته تکمیل شي.

2. فعالیتونه

2.1 لومړۍ پړاو:

2.1.1 د پیل دراپور تهیه او ترتیب:

د 2010 کل د جولای 14 څخه تر 17 تلریخ پورې د پروژې د پیل یا شروع راپور د ننګرهار ولایت مقام، اړوند ریلستونه د بهسونو اوسره رود ولسوالیو د افغانستان جلیکا دفتر د جلیکا جلال اباد سلحوی دفتر، UNHCR محترم مواد ورته تسلیم شول. همداراز د NRRC د پروژې جلیکې کار موندلو د 2010 کل د جولای او اګست په میاشتو کې د تقسیم شوی راپور د محتویاتو په اړوند چې (د پروژې عمده ټکي، اسلېسی پالیسی، ګرناړه او د پروژې د تطبیق مهل ویش) څخه عبارت دی، تشریح او په اړوند یې د هغوی د نظرونو موافقه واخستله.

2.1.2 د FP همکاري موسسې سره تړون:

همکاره موسسه (FP) د 2006 زېږدیز کل د جون د جلیکا د پیرو ډلو د لارښود له مخې انتخاب شوی دی.

د تړون بهیر په (2.1-1) جدول کې نکر شوی دی.

په 2.1-1 جدول FP سره د قرارداد خلاصه

د تړون نمبر	د تړون برخې	د تړون موده	د تړون نیټه
FPC#01	کاري لایحه: 1- د امنیتي حالاتو سروی. 2- د یوولسو کلیو لپاره ټولنیزه سروی. 3- د (1.2.3.4 پړاو) ازملینتي پروژو لپاره د نظر یووالی، غوره کول او پلان برابروول. 4- په دوو ولسوالیو کې د اړتیاو سروی. 5- د کلیوالي پروژو تفصیلي ډیزاین او څارنه (ارزښت یی: له پروژې د قیمت څخه %26) 6- د قراردادې پروژو تفصیلي ډیزاین او څارنه (ارزښت یی: له پروژې د قیمت څخه %9.19)	د 16 اګست 2010 څخه د 31 اګست 2011 پورې	د 16 اګست 2010
FPC#-01-2	د 2011 د جولای په 15 جلیکا د تړون په اسلېس اصلي قرارداد FPC#-01-2 په 01 سره تغیر شو. د امنیتي حالاتو سروی (وخت تمدیدول) یوولسو کلیو لپاره ټولنیزه سروی (بیانه تر سره کول). د (1.2 پړاو) ازملینتي پروژو لپاره د نظر نومو افقه، غوره کول او پلان برابروول. یوولسو کلیو لپاره ټولنیزه سروی (بیانه تر سره کول). په دوو ولسوالیو کې د اړتیاو سروی (بیانه تر سره کول).	د 25 جولای 2011 څخه د 31 مارچ 2012 پورې	د 25 جولای 2011
FPC#-02	د لومړي ګروپ پروژو د اسیست د تئید FPC#-02 سره د هغو پروژو د پلي کول. د FPC#-01 همکاري برابروولو د لګښت تړون او همدارنګه کاري لایحه په لاندې توګه: 1- د لومړي ګروپ پروژو تفصیلي طرحه (ډیزاین)، تطبیق او څارنه د	د 30 نومبر 2010 څخه د 31 اګست 2011 پورې	د 30 نومبر 2010

د تړون نېټه	د تړون موده	د تړون برخې	د تړون نمبر
		کلیوالي پروژو لپاره. 2- د لومړي گروپ قرار دادي پروژو لپاره تفصیلي طرحه (بیزاین)، تطبيق او څارنه.	
11 اپریل 2011	د 11 اپریل 2011 څخه د 31 د ملچ 2012 پوری	د دویم گروپ پروژو د لیست د تائید FPC#03 سره د هغو پروژو د پلي کول. د FPC#01 د همکارۍ برابرولو د لگښت تړون او همدارنگه کاري لایحه لاندې توگه: 1- د دویم گروپ پروژو تفصیلي طرحه (بیزاین)، تطبيق او څارنه د کلیوالي پروژو لپاره. 2- د دویم گروپ قرار دادي پروژو لپاره ازاده سیلي، تفصیلي طرحه (بیزاین)، تطبيق او څارنه.	FPC#03
19 اکتوبر 2011	31 د ملچ 2012	د تړون په اساس د دویم گروپ اصلي قرار د FPC#03 په FPC#- 03-2 تعیل شو.	FPC#- 03-2
12 د دسمبر 2011	31 د ملچ 2012	د خبرو اترو او مطالعي په اساس د دویم گروپ پروژو څنډ او ورڅخه ځینی لیري کول چې تړون یې 03-2# تعیل شو.	FPC#- 03-3
03 د ملچ 2012	31 د ملچ 2012	د تطبيق د څنډه لامله د دویم گروپ د ځینو پروژو تړون 03-3# ته تعیل شو.	FPC#- 03-4

2.1.3 په تنګرهار ولایت کې د امنیتي حالت او دشخړو مخنیوی مطالعه:

لکه څنګه چې د تنګرهار ولایت دشخړو او جنگونو له امله اغیزمن شوی، نو ټول خلک په عام ډول پوه شي چې د پروژو کل جریان لپاره د تنګرهار ولایت د امنیتي حالاتو، قووی جهتونه، د انسلي روابطو حکمیت د مستقیمو تر منځ د اختلافاتو حل تګلاره او داسې نور ملوماتو راټولول او تحلیل ډیر اړین دي.

دا څیرنه (سروي) د FGA په مټ تر سره شوي. لومړی راپور چې د لومړنیو ملوماتو څخه تر تیب شوی پکې د ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي، رغنیزو، راستنیدونکو، د کابل او اسلام اباد پر اړیکو او د امنیتي حالاتو ملومات د جنگ ضد ډلې او نړیوالو ځواکونو فعالیت په اړه او دشخړو او تګونو په اړه راپور جلیکا ته د FGA له لوري تر تیب شوی او د 2010 تر دسمبر پورې لېږلی وه.

له بله پلوه یې په تنګرهار ولایت کې میاشتنی امنیتي راپور برابرولو او جلیکا ته لېږل او د امنیتي، سیاسي او ټولنیزو پېښو په اړه نور بیلابیل ملومات هم لېږلي دي.

د همدې امنیتي راپور په نظر کې نیولو سره بلید NRRC د ((د پروژو چارو ته په کتلو)) د 2010 له دسمبر څخه نچور برابره شوي او د پروژو اړوند موهمو نقطو په بنډلو سره یې د میاشتنی کاري راپور په افغانتان کې د جلیکا ادارې ته سپارلي.

د اراپور په ولایتی او یا هم کلیوالي کچې د انسلي اړیکو په اړه د NRRC غړو تر منځ د مهمو ملوماتو د شریکولو په برخه کې دی. په هر ترتیب د 2011 په فبرورۍ کې د NRRC غړو فعالیت ته په جلال اباد کې او د هدف لاندې دوه ولسوالیو کې د کابل بانک د جلال اباد څانګې له پېښې را وروسته اجزه نه ورکوي.

نودې امله نوموړی راپور تر بیلابیلو وروسته ((د امنیتي او جګړیزو پېښو له بندیدو سره د پلټې له مخې په تنګرهار ولایت کې)) تر تیب شوی.

دا میاشتنی راپور د FGA لخوا برابره شوی چې د امنیتي حالاتو په اړه ملومات یې د انتر نیټ له خبري سلیتونو، محلي خبر پانو او افغاني کلرکونکو څخه تر لاسه کړي چې د امنیت تر څنګ ټولنیز، اقتصادي او سیاسي مسیلو ته هم پکې ځای ورکړل شوی دی همدارنگه په ولسوالیو کې د هدف لاندې کلیو کې د پروژو اړوند شخړو او د پروژو کاري بهیر په اړه هم ملومات لري، مګر هره میاشت د تنګرهار ولایت اړوند او په ځنګړی توګه د هدف لاندې دوه ولسوالیو په اړه موضوعات د افغاني کلرکونکو او FGA ادارې لپاره د په افغانتان کې د جلیکا ادارې ته د پروژې په اړه د میاشتنی راپور سره لېږل شوي او د NRRC کلرکونکي په مهمو نقطو پوه شوي او لار ښوونه ورته شوي ده، چې د امنیتي حالاتو کچې ور ته په میاشتنی توګه ملومه وي.

پر دې سر بيره FGA د انسو (د افغان تجبو گڼو د امنيت اداره) هره اونۍ امنيتي راپور شريکوي او د لاريون، اضطرابي حالاتو او چاودني پر مهال FGA ته اويا FGA د NRRC افغان کار کونکو ته د ميليل له لاري پيغام سوي.

دا معلومت د اسلحه لاري لپاره برابر شوي وو چې د دقت او پاملرنه ونيښي او د امنيتي حالاتو څخه د کار کونکو د صحت سلته وي.

د پروژي د لومړي پر او فعاليتونو په جريان کي، امنيتي حالت په تيزي خرابيدلو له کبله د پروژي فعاليتونه تطبيق دريموت کنترول په نر بعه له کبل څخه اداره کيدل په هر حل، د پروژي فعاليتونه تطبيق بيون دکوم جدي مشکل څخه تر سره شوو دلچي په پروژه کي کوم جدي مشکل او ستونزه او منفي تاثيرات د پروژي په رابطه ندي پيداشوي نو دا د امنيتي حالتوسمه ارزونه د مناز عاتو در ايبداکيو دمخنيوي د پروژي په رابطه درست معلومت په نظر کي نيول او دننگر هر دو لايي اداري او جليکا جلال ابا د سلحوي دفتر همکاري نتيجه وه.

2.1.4 د 11 ټاکل شويو کليو لپاره ټولنيزه سروی:

د JICA/NRRC ټولنيزي سروی دلي د تيري دويمې مرحلې معلومت په ځنگري توگه د OSD او جليکار اپورونه له نظره تير کړل او د نيمه جور شوي پوښتليک له مخي يې مرکي تر سره کړي، چې دا پلټنه پدې ډول وه:

- د کليو او شورا گڼو د حدوداتو او موقعيت معلومول او په نقشه کي بنودل.
- د نفوس او کورنيو (بنځي، نرينه)، نژاد او قوم.
- دراستانو شويو کورنيو تعداد، د هستوگني او ژوند په اړه معلومت.
- ټولنيز جور بنديت (د شورا گڼو دوديز او قومي تشکيل).
- د زده کړو اسلټيوي.
- روغتيلي اسلټيوي.
- رغنيزي چلري (کليوالي سرکونه، اوبه خور، بريننا او د څښلو اوبه).
- د جنسيت له پلوه (بنځينه جور بنديتونه، فعاليتونه او د نارينه و شورا گڼو سره اړيکي).
- امنيت.
- ټولنيزي ننګوني.
- د نورو موسسو او تجبو گڼو د پروژو فعاليت.
- NRRC ته ورانديز شوي پروژي.

د پرمختيايي او ټولنيزي مطالعي متخصصينو په گډه پوښتنيزي سروی طرحه کړه او FGA ته يې د 2010 په اگست کي لار ښوونه وکړه، او په سلحه کي عملي کړل د 2010 په سپټمبر کي پيل شو.

د دقت لپاره د پيلي په توگه لاندې دري بنسټيز معلومت د هرې کليوالي شورا لپاره و ټاکل شول:

- د کليوالي شورا لپاره رئيس.
- د يوې کورني څخه رئيس د څو کلونو لپاره کولای شي پاتي شي.
- يو تن په نږدې وخت (بوه يا دري) کلونو کي دراستو شويو مهاجرينو څخه وي.

د ښوونځيو او کليني کونو لپاره هم په اړونده برخه کي مرکي شوي دي.

د معلومتو راټولول او شاملول د 2010 په نومبر کي تکميل شوي او په 2011 جنوري کي د پرمختيايي او ټولنيزي مطالعي متخصصينو په گډه د هغوي لارښووني يې FGA لپاره درجه بندي کړي او بيا د کلی لخوا معلومت راټول شول. د 2011 په جون کي د ټولنيزي سروی مسوده جليکا ته وليږل شوه او د 2011 په اگست مياشت کي اصلاح شوي مسوده بيا جليکا ته وليږل شوه.

د ټولنيزې پلټنې راپور متن تکميل شوی هغه ملومات چې پلس د يوولسو کليو لپاره پلن شول چې د هر کلي خصوصيتو په اړه هم ورسره ملومات ورکړل شوي.

د نتيجه په توگه يو راپور چې راتول شوی ملومات يې په پام کې ونیول شي د پروژې غوراوی، طرحه، پلي کول او څارنه او سلنتي په اړه لیکل شوي هم د 2011 په اگست میاشت کې د چلپاينو لخوا جلیکاته لېږل شوي.

2.1.5 د سلختمې چارو لپاره د قرار د لاینو غوره کول:

د NRRC بلې د 2010 کل په جنوري کې له دننگر هارو لایت د کلیو او بیل غوونې ریلست څخه د شلو غوره قرار د لاینو یو لیسټ تر لاسه کړ. دننگر شوو قرار د لاینو سره د نتر سره شوو مرکو دارو ندر یلستونو د نظر و نو په ناکې، او د NRRC افغلي کار کونکو په کومک په جلال اباد کې د سلختمې ساحو د لاینو د سلختمې حالاتو تر مطالعې ورسنه یو عملی کیدونکی چوکاټ د راپور په بڼه تېیه شوو. د دې راپور د نتيجه په اړه د سلس داسروې په 2-2.1 جنول کې د ر غنیزو چارو د کړنلاره په شکل پلان او تر تیب شوه.

په 2.1-2 جنول د تطبیق لپاره ترتیب شوی جوړښت

موضوع	لاره یا طریقه
د قرار د لاینو غوره کول	غوره کول به د اړوندو وزارتونو لخوا نه تر سره کېږي، بلکې د ویب پلټي د خبر تیا له لارې تر سره کېږي.
د پروژې اندازه	د پیسو مخکې نه ورکړې پر مهل د تړون اندازه د 250000 امریکایي ډالرو په کچه ده.
د ر غنیزو توکي (مواد)	د پیدا کیدونکو ر غنیزو توکو نه محدودیت.
کیفیت سلنته	زیات قرار د لاین انجنیران لري، په مناسبه اندازه د کیفیت کنترول د قرار د لاینو لخوا هم تر سره کول ممکن دی.
د معیارونو ټاکل	ټاکل به د شوي کار په تجربو تر سره کېږي.
تړون	تړون موافقه به په نړیواله کچه او معیار په انگلیسي ژبه کې تر تیبېږي.
د تړون ملولو زین	دا چې په افغانستان کې د تړون ملولو زیات معمول دي، نو په هماغه ټول به تر سره شي.
د پیسو مخکې ورکړه	دا چې په افغانستان کې په ورو پروژو کې د پیسو مخکې ورکړه عمده نه، نو دا به هم نه منل کېږي.
گرځونه	10% فیصده

2.1.6 د نظر یو والي طریقه:

2.1.6.1 د کلی په کچه د نظر یو والي سیستم جوړول

دا به غوره وي چې د NRRC لپاره د نظر یو والي په موجوده سیستم کې رامنځته شي، ځکه دا به یو لږې د دې پروژو د پلي کولو، نظارت او څارنې او سلنتې لپاره وي. په هدف لاندې کلیو کې دا مهل د NSP (ملي پيوستون) لخوا کلیوالي شورا گټې جوړې شوي، نو NRRC اداره کړې وه چې د نوموړو کلیو په سطحه ر هبري شورا (BCDCs) جوړه کړي چې دا شورا د کلی له ټولو شورا گټو استازیتوب کوي او نوی د کلی لخوا د تصمیم نیونکو په توگه فکر کوي. ر هبري شورا د 2010 له اگست څخه د 2010 تر اکتوبر پورې جوړ شوي. دا پروسه په دريو مرحلو سره ویشل شوي.

(1) ټولنیزه سمونه/تشریح په واسطه

د JICA/NRRC افغان کار کونکي د چلپايني متخصصینو او کلیو او تر منځ د غونډو لپاره زمینه برابروي. په 2010 کل اگست میاشت کې چې د جلیکا متخصصین هر کلي ته تلل، نو کلیو او ته د مشورتي تشکیل (جوړښت) جوړول تشریح کول. له دې وروسته د NRRC د FGA سره فرعي تړون وکړ تر څو د مشورتي تشکیل جوړول او نورې دندې بشپړ کړي. هغه معیار چې NRRC غوښتی وو دادی: له هرې شورا بیلډر تر لږه یو استازی د تشکیل لپاره غوره شي.

(2) اداري جوړښت

NRRC د هري شور اڅخه دوه تنه راو غوځل او ترينه يې و پوښل چې د مشورتي ميکټيزم له مخې دى يوه مشورتي شورا (رهي شورا) ورته ويل کېږي و تکل شى داد هغوى لخوا، د هغوى په رايو او يا هم د هغوى په مشوره غوره شوي. کليوالو په خپله خوښه د دې شورا ايلار رئيس، معلون، خزانه دار او مشي اود هر شور اڅخه يو غړي غوره کړل.

(3) بيا جوړول (تشکيلول):

په څلور ورهيزي شورا گڼو کې و موندل شول، چې له دې معيارونو راضي نه وو، نو د NRRC متخصصينو له FGA څخه غوښتنه وکړه چې د دې لخوا ننه زده، خوشگمېد، سراچې او بالا باغ کليو ايلار بيا ټکي وکړي، چې دا چاره د 2010 کل د اکتوبر په نيمايي کې تر سره شوه. راتلونکې رهي شورا گڼي د مشورې ورکولو په ميکټيزم برابري شوي، په ځنگري توگه دوه نويو (د ملي پيوستون لخوا نه وي جوړې شوي) شوراگانو ته هم پاملرنه وشوه او د شورا په توگه ومنل شوي، چې دا د کونړينو او ملاينو شورا گڼي وي چې د 2011 کل په جون مياشت کې د خوشگمېد په رهي شورا کې ځلي شوي.

د کلي په کچې ټولې شورا گڼي د هرې رهي شورا اړوند او پکې شلمې دي. د هرې رهي شورا غړي له 5 څخه تر 14 تنو پورې وي، خو دا تعداد په هر کلي کې بيل ټول دی او هغه چې %80 پکې مهاجرين دي. د رهي شورا اسلسي دننه د دې ازماينتي پروژې ايلار د نظرونو موافقه او خپرواترو د لارې د پروژې ايلار د ځمکو تر لاسه کولو چلې دي. د لومړي او دويم پړاو پروژو له تطبيق مخکې څو کميټي د (تطبيق او څارنې، ساتنې) ايلار جوړې شوي. د تطبيق کميټه د هرې پروژې ايلار له دې لاندې بيا د هرې پروژې ايلار خريداري او حفظ او مراقبت کميټي هم جوړې شوي.

2.1.6.2 د ازماينتي پروژو په ټکلو کې د اړوند برخوالو د نظر يووالی:

لاندې 2.1-3 او 2.1-4 جدولونو کې په ترتيب سره د لومړي او دويم پړاو ازماينتي پروژو د ټکلو ابتدايي بهير له اړوندو خواوو سره بنودل کېږي. دا ترتيبونه داسې شوي چې په

- (1) - برخه کې د اړتياؤ سروې، کليوالو سره مشورې او د امکنډو ارزونه.
- (2) - په دې برخه کې د پيسو د پېښکي ورکولو تفصيل.
- (3) - د نړون بيا تعيرون.
- (4) - د طرحې تر څنگ د وړانديزونو ترتيبول او د لگښت سنجول او بيا د وړانديزونه جليکاته لېږل تر څو منظور شي.
- (5) - د ولايتي ادارې څخه يې منظوري اخستل.

په 2.1-3 جدول د لومړي گروپ پروژو د نظر يووالي اسلسي مراحل

مرحله وخت پروژہ	د اړتياؤ سروې/کليوالو سره مشوره/امکنډو ارزونه		د مخکې ورکړې پيسو تفصيل/منظوري		د نړون بيا تعيرون		د وړانديزونو ترتيبول/د جليکاته خوا منظورول		د ولايتي ادارې منظوري	
	اگست څخه تر سپټمبر 2010	اگست څخه تر سپټمبر 2010	اگست څخه تر سپټمبر 2010	اگست څخه تر سپټمبر 2010	سپټمبر 2010	سپټمبر 2010	د سپټمبر څخه تر اکتوبر 2010	نومبر 2010	ولايتي همغږي غونډه	نومبر 2010
بنوونځی	کټا هيران نړيوال انجنيران، افغان مامورين او FGA	ولايت، ولسوالي او پوهنې رياست	رهي شورا	افغان مامورين/کټا هيران نړيوال انجنيران جليکاته	ولايتي همغږي غونډه					
روغتون	تر سره کول	ولايت، ولسوالي او صحت علمي رياست	تر سره کول	تر سره کول	تر سره کول					
اوبه خور	تر سره کول	ولايت او ولسوالي	تر سره کول	تر سره کول	تر سره کول					

مرحله وخت	د اړتیلو سروی/کلیوالو سره مشوره/د امکنتو ارزونه	د مخکې ورکړې پیسو تفصیل/منظوري	د تړون بیا تعینول	د وړاندیزونو ترتیبول/د جلیکاخوا منظورول	د ولایتي ادارې منظوري
سرک	اګست څخه تر سپټمبر 2010	اګست څخه تر سپټمبر 2010	سپټمبر 2010	د سپټمبر څخه تر اکتوبر 2010	نومبر 2010
پلي لارې او کوڅي	ترسره کول	ترسره کول	ترسره کول	ترسره کول	ترسره کول

په 421 جنول په دویم گروپ پروژو کې د نظر یووالي اسلسي مرحلو یووالي لپاره جدول وگوري:

مرحله وخت	د اړتیلو سروی/کلیوالو سره مشوره/د امکنتو ارزونه	پیسو دپیسې ورکولو تفصیل	د تړون بیا تعینول	د وړاندیزونو ترتیبول/د جلیکاخوا منظورول	د ولایتي ادارې منظوري
بنوونځی	اګست څخه تر نومبر 2010	اګست څخه تر نومبر 2010	د جون 2011	د نومبر 2010 څخه تر مارچ 2011	* اګست 2011
روغتون	ترسره کول	ولایت، ولسوالي او پوهنې ریاست	ترسره کول	افغان مملورین/کنا هیرا نړیوال لجنیران جلیکاته	ولایتي همغږی غونډه
سرک	ترسره کول	ولایت، ولسوالي او صحت علمي ریاست	ترسره کول	ترسره کول	ترسره کول
پلي لارې او کوڅي	ترسره کول	ولایت، ولسوالي او دکلیوبیل غونډی ریاست	ترسره کول	ترسره کول	ترسره کول

* داتیه هغه ولایتي پرمختللي غونډه پوځونه کوي، چې پلي وروستی پروژې پکې نښه شوي. تخنیکي غونډه میاشتې ده، نو د NRRC تم د تخنیکي غونډې سره په لیکه کې وي، ترڅو یې تر لاسه کړي او جلیکا یې یو په یو تڼی او منظور کړي.

- (1) د اړتیلو د معلوماتو جمع اوری په دوران کې د تکرار مخنیوی په منظور د نور تمویلونکو ادارو سره چیک او کره کول. د قرار دانیو یا کلیوالو په واسطه د پروژې د تطبیق نو عیت د خارجي کار مندانو لخوا په تخنیکي لهدامم کېت په اسلس تصمیم گیری شویده
- (2) د لازیتو توضیحاتو او مربوطه خواوو څخه د منظوري په خاطر د سلحی د لیدو په جریان کې د کلیوالی شور په مشورتي شکل ترسره کیدل
- (3) د کلیوالی شورا (BCDC) اعضو د هر ټولنی ضروریات بلندی پوهیږي او تعین شوی امتحانی پروژې څخه په مسلوبه توگه گټه اخستنه نور و اعضو سره د مشورې د لاری د ټول کلی په سطحه د نظرونو موافقه کول
- (4) د درخواست پنی محتویات عبارت دی له اسلسي طرحه تخمیني قیمت درخواست پایه جلیکا ته په ترتیب په نوبت وار شکل د منظوري لپاره تقیمول.
- (5) د G1 امتحانی پروژې د PCC په غونډه کې د ولایتي ادارې د ټولو منسوبینو لخوا د ولایت د مسوول په موجودیت کې د عاجل تطبیق په خاطر منظور شوی دی.

د G2 امتحانی پروژې د PDC او TWG منظور شوی د G2 امتحانی پروژې د 2011 کل د اپریل په 9 تاریخ د والی لخوا

منظور او تر منظوري ورسته بیا مهل ویش له مخې د PDC د غونډې د میاشتي په 4 تاریخ منظور شوی چه نهلی منظوري یې

د 2011 کل د اګست میاشت کې دی

2.1.6.3 د از مینځني پروژو د تطبیق د پلان لپاره د کومکي تدابیرو تهیه:

لومړي او دویم گروپ 16 کلیوالي پروژو لپاره د تطبیق او پیروندو کمیټي تشکیل شوي او همدارنگه یې د تطبیق پلان هم جوړ شو.

د تطبیق پلان جوړولو لپاره (NRRC) تطبیقي کمیټو سره د موسمی فصل د کرلو او خلکو سره په دی هکله بحث کړی دی. تطبیقي پلان د پروژي حتمی راپور سره په عربی فلم کی بنوللی شوی دی.

د کلیوالي قرار دادي پروژو لپاره فقط تطبیق کمیټه جوړېږي چې د سلحتملی کارونو پرمختگ او د قرار د ادیتو د کار څارنی او وړتیا راپور تیار کړی.

2.1.6.4 د نظرونو موافقی ته قوت ورکول:

د جولای څخه تر اگست 2011 کل پوری څارجي پوهانو د نظرونو د موافقی د جوړښت به تیرو کارونو رڼا او لچوله په اول او دوهم گروپونو کی یوځل بیا تکرار وکړ. او ددی نتیجو څخه د NRRC افغلی همکارانو او د FGA اجتماعی غړو سره د 2011 اکتوبر نه پس د اجتماعی کل مندانو استعداد جوړولو لپاره استفاده وکړه.

پنځم جدول مونږ ته د اکتوبر 2011 نه تر ملچ 2012 پوری سلحوی کارونه بنلیي د NRRC او د FGA د همکارانو لپاره یو داسی کړنلاره چلیی پوهانو له خوا جوړه شوی چې د اجتماعی پوهنی اسلس تیار کړی لومړی او دوهم گروپ کارونه د اول گروپ او دوهم گروپ د کارونو د تکرار او برخی کولو بندی توجه لوری او د دریم فعالیت نه پس توجه په افغان کل مندان او د ایف جی ای کل مندانو استعداد جوړولو او د نظرونو موافق جوړولو ته تغیر شو، او اخری دوه کارونه د افغلی کار کونکی او د FGA اجتماعی تنظیمونکی استعداد جوړولو ته مصرف شوی.

په 2.1.5 جدول هغه فعالیتونه چې د نظرونو یووالی او جوړښت قوي کوي په لاندې جدول کې وگورئ

تاریخ	د فعالیتونو عنوان	گډونکونکی/تعداد گډونکونکو	عمده اهداف	فعالیت
26، اکتوبر، 2011	دماغي حمله	NS,FGA,KEI, JICA/10	په تجلیو کتنه مسلیل شریکول	(1) د نظرونو د موافقی په اړه درس (2) د لومړي او دویم گروپ په تجلیو بیا کتنه (3) په عملی پلان خبری اتري
12-13 نومبر 2011	کارځای لپاره د نظرونو د موافقی په جوړښت 1مرحله	BCDCs, NS,FGA, KEI,JICA/26	تجلیو نه په کتنه مسلیل شریکول	(1) NRRC په مورد څرگندونه (2) د نظرونو د موافقی په اړه درس (3) د لومړي او دویم گروپ په تجلیو بیا کتنه (4) د مراحلو په تویم خبری اتري
27-28، نومبر 2011	کارځای لپاره د نظرونو د موافقی په جوړښت 2مرحله	NS,FGA,KEI,II CA 14(27 th) 13(28 th)	د ظرفیت د پراختیا په اړه بحث مباحثه کول	(1) NRRC په مورد څرگندونه (2) د نظرونو د موافقی د جوړښت د مولو ترجمه کول د کلیوالو درهبری شورا لپاره د انگلیسی نه په بیستو ژبه (3) د لومړي او دویم گروپ په تجلیو بیا کتنه (4) د FGA سلحوی کارونو لپاره پلان جوړول
7-15 دسمبر 2011	د نظرونو د موافقی د پراختیا لپاره په گډه غونډی جوړول	رهبری شورا او کلیوال د FGA له لوری	د ظرفیت د پراختیا په اړه بحث مباحثه کول	(1) د نظرونو د موافقی په اړه درس (2) NRRC مورد څرگندونه (3) د کلیوالو نظرونه اوریدل او د مراحلو تقویه کول (4) او د پروژي د انتخاب په باره کی درس
2011 دسمبر 26	ورگنلپوهنه کول د نظرونو موافقی د جوړښت په باره کی 3مرحله	افغلی ملومرین , FGA, JICA, KEI, 11	بحث مباحثه کول په اصلاح د مراحلو	(1) FGA په سلحوی کارونو بندی بحث مباحثه کول او د مراحلو تنظیمول (2) د FGA په قوانینو او کلیوالی پروژو په باره کی بحث مباحثه کول (3) حفظ او مراقبت داوبه خور د پروژو (4) NRRC لخوا چې کوم لارښود جوړ شوی دهغی توضیح ورکول

تاریخ	د فعالیتونو عنوان	ګڼو ګونګو/تعداد د ګڼو ګونګو	عمده اهداف	فعالیت
09 جنوری 2011	ورکشاپونه کول د نظرونو موافقې د جوړښت په باره کې 4 مرحله	افغنی مامورین، FGA, KEI, JICA 11	نظرفیت د پراختیا په مسلیلو کتنه	1) د یو اسلونکی په باره کې توضیح ورکول او دهغی نمونی ته پراختیا ورکول 2) د ټولنی ډیر مختیا په اړه درس ورکول 3) د ټولنی د پراختیا په اړه بحث مباحثه کول 4) اصلاحی پراختیا لپاره بنیادی بحث کول 5) د بحث او مباحثی په اخر کې سوال ته جواب ورکول 6) د تسهیل کوونکی له نظره کره کتنه
13 مارچ 2012	ورکشاپونه کول د نظرونو موافقې د جوړښت په باره کې 5 مرحله	نظرفیت پراختیا	د افغنی کارکوونکو او FGA لخوا انجام شوو	1) اداري پیچلتیو ی 2) طریقه او طرز 3) ملاحظه منځګرتوب 4) د فکر د څرګندونی مهارتی تمرین

2.1.7 د لومړی مرحلې کړی طرحی په باره کې خبری اتري:

د پروژې کړی پلان د پروژې ډیل ډراپور او دوخت د فعالیتونو د نتیجی په اسلس جوړشوی وو او د پروژې د تطبیق د کړنلاری په اسلس یی ډول په نظر اندازی وشوه چې د لومړی قسم PDM د ارزیابی شاخصونه هم د هغه کړی پلان په برخه کې شامل شول. د پروژې د کړی پلان محتوا د 2010 کل د نومبر په نهمه نیټه د پروژې د هماهنگی په غونډه کې چې مشري یی د ننگرهار والی کوله د ټولو اړوندو لورو لخوا تائید شوه. (د نورور ملوماتو لپاره 6.5 ضمیمه ته مراجعه وکړئ)

2.1.8 د لومړی ګروپ ازملینتی پروژو غوره کول او پلانون:

د لومړی ګروپ پروژې د 2.1.6.1 جدول د معیارونو په اسلس د OSDR ډراپور څخه د تطبیق لپاره چې عبارت دی له د کلیو الو لخوا پلي کیدونکی پروژې او د قرار دانیو لخوا پلي کیدونکی پروژې د تطبیق لپاره انتخاب شوي دي په 2.1-6 جدول کې درهبری شورا ضرورتونه او معیارونه نکر شویدی.

په 2.1-6 جدول د لومړی ګروپ ازملینتی پروژو د انتخاب معیارونه

د انتخاب شرایط
څرګند ضرورت منفی اغیز ونلری په اسانی سره پلان او طرحه شي د اړوندو ادارو نظر یوالی پری اسانه وي

په نتیجه کې کلیوالی او قرار دادی ډول او قسمو پروژو ځکه د یو بشنهاد په ډول چې د FGA په واسطه د NRRC د افغانی او څار جی همکارانو په لار بنوونه تر نیب (AFS) په شکل د منظوری لپاره د جلیکا لاری ته وړاندی او د هغوی له منظوری څخه وروسته له (AFS) څخه وروسته د پروژې د قیمت په لیری کولو سره د اړوندی لاری ته د TWG د منظوری لپاره وسپارل شو.

چې د لومړی ګروپ ازملینتی پروژو لړ لیک لاندی 2.1-7 جدول کې بنودل شوی دی

په 2.1-7 جنول د لومړي گروپ د ازماينې پروژو ايسټ په لاندې جدول کې وگورئ:

د بهسونو ولسوالۍ

د کلي نوم	شماره	د پروژې نمبر	د پروژې نوم	قسم
گردي کڅ	1	B-GK05	دگردي کڅ او نمر خيلو د سرک بيلر غوڼه	کليوالی
خوشگمب	2	B-kB01	د قعه ميرزا د ايسی د مکتب د ديوال احطی جوړول	قراردای
	3	B-kB08	د نهری شاهي د اوبو د وييلو جوړونه	کليوالی
	4	B-kB09	د پينښه د اوبو د وييلو جوړونه	کليوالی
	5	B-kB011	د نهر شاهي اول د وييلو بيلر غوڼه او د وييلو پاکول	کليوالی
ميران	6	B-M07	د وييلو پلکول	کليوالی
نمرخيل	7	B-SM01	د نمر خيلو د ايسی لپاره د ديوالی جوړول	قراردای
سرلچه	8	B-SR-08	د جوی پاتړه د منځنۍ بنوونځی لپاره ديوال احطی جوړول	قراردای
	9	BOSR-09	د علی خن د منځنۍ بنوونځی د احطی ديوال بيا جوړونه	قراردای
	10	BOSR-10	د وييلی بيلر غوڼه او د 7 دروازو لگول	کليوالی

د سره رود ولسوالۍ:

د کلي نوم	شماره	د پروژې نمبر	د پروژې نوم	نوعه
بالاباغ	1	S-BB05	د بالاباغ د ايسی سيستم جوړول	کليوالی
چهل باغ	2	S-CB15	د چهل باغ د ايسی سيستم جوړول	کليوالی
	3	S-CB17	د سيلنگ د اوبو لپاره حوض او د وييلو جوړول	کليوالی
فتح ابد	4	S-FA01	د قعه سليم د مکتب لپاره ديوال احطی جوړول	قراردای
کور سلطانپور	5	S-SPL03	د کوز سلطانپور د کوڅو جوړول	کليوالی
	6	S-SPL07	د وييلو بيلر غوڼه	کليوالی
بر سلطانپور	7	S-SPU11	د بر سلطانپور د وييلو جوړول	کليوالی
	8	S-SPU12	د بند د کلي د وييلو جوړول	کليوالی
	9	S-SPU15	د دوستو خيلو د بند جوړول	کليوالی

چې په نهليت کې د 2010 د نومبر په 09 نيټه د لومړي گروپ ټولې پروژې د ننګرهار ولايت په ولايتي همغږۍ غونډه PDC کې منظورې شوي.

2.1.9 د لومړي گروپ ازماينې پروژو پلي کول:


2.1.9.1 د کليوالو په واسطه د لومړي ازماينې پروژې تطبيق د حفظ او مراقبت د لارښود په اسلېس:

(1) تکميلوونکي ادارې

د لومړي گروپ ازماينې پروژو منظور شوي ايسټ په اسلېس، NRRC د پروژو د تطبيق لپاره د FP سره په 30 نومبر 2010 يو تړون وکړ، چې ددې تړون په اسلېس د کليوالو په واسطه د تطبيقوونکي ازماينې پروژې مربوطه لوري په لاندې 2.1-1 جدول بنودل شوي دي.

په لاندې شکل کې د کليوالو لخوا د پلي کيدونکو پروژو د زبځلو لور او رابطو ليکلې شې

شکل 1-21 د کلیوالوپه واسطه پلي کیدونکو پروژو زیځلو لوړو رابطوي انځور په لاندې توگه لیدلای شی:

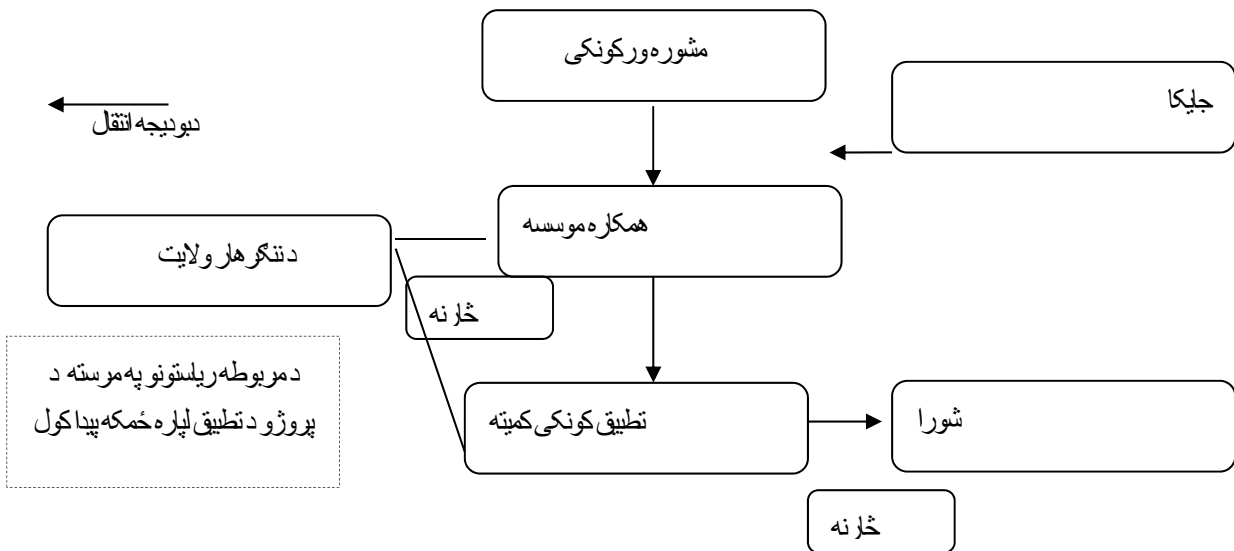

د ښه شفافیت او بشپړې حساب ورکونې په موخه پېسې د همکارې موسسې په بڼکې حساب کې ولسل شي چې NRRC ته د حساب ورکولو مسولیت په غړه لري کوم چه په 2-1-2 قرار داکي ذکر شويدي.

د کلیوالو په واسطه تطبیقونکي ازملینتي پروژې د تطبیق عمده ټکي:

- FP د ازملینتي پروژو د تطبیق مسولیت په غړه لري
- د پروژې بودیجه بیلد د FP بڼکې حساب کی سلل کېږی
- د خریاری او تدارکتو چلري بیلد د تطبیق کمیټې په واسطه د FGA او NRRC قرار داله مخی ترسره کېږي
- ټول رسیدونه بیلد ولسل شی او د ټولو رسیدونو مجموعا بیلد حقیقي مصرف وي

(2) روزنه:

د NRRC لخوا چی کوم روزنه کلیوالی ازملینتي پروژو لپاره ورکول کېږي هغه په جدول 2.1-8 کی ښودل شوی دی

په 2.1-8 جدول د لومړي گروپ ازملینتي کلیوالي پروژو کی د ورکړل شویو تریننگونو د خلاصه

مضمون	تاریخ	ځای	تریننگ ورکونکی	تریننگ کونکی
مجلسیه، د خریاری د کنټرول (د مجلسی لارښود)	7 دسمبر 2010 21 دسمبر 2010 8 فبروری 2011 22 فبروری 2010	NRRC جلال ابد دقتر، کابل دقتر	فتتا، NRRC داخلی مامورین	FGA مامورین
د مصرفو سلل د بیلونو کنټرول د مجلسی لارښود	7 دسمبر 2010 21 دسمبر 2010	NRRC جلال ابد دقتر	متخصص فانتا	FGA مامورین
کیفیت کنټرول څلرنی لارښود	هره هفته	کابل دقتر	متخصص	NRRC FGA مامورین

دی نه علاوه NRRC د FGA د افغلي مامورينو د ظرفيت اورولو په موخه د محاسبې، ملي راپور، ميلنستي کاري راپور د ملوماتو د سلنو او څارنې په اړه بيلا بيله روزنه ورکړل شوي ده.

(3) تطبيق:

د پروژو تطبيق د 2.1-9 جدول له مخې چې د څارنې لارښود کې نکر شوي تر سره کېږي.

د تطبيق، څارنې او نظارت تر ايتنگونه به اړوندو خواوو ته د پروژو تطبيق په جريان کې ورکول کېږي.

په 9.2.1 جدول اړوندو خواوو مسؤليتونه:

رول	کليوالی پروژي	قراردادی پروژي
تطبيقونکی بله	همکاره موسسه (FGA)	همکاره موسسه (FGA)
جوره	تطبيقونکی کمينه	تطبيق کمينه
پلټونکی انجنير	همکاره موسسه (FGA)	همکاره موسسه (FGA)
ماینټورنگ ارزيبی	KEI,	KEI

د کليوالو په واسطه د پروژو د تطبيق نچور په 2.1-10 جدول کې بنوډل شوی دی.

د کليوالو لخوا د پلي کيدونکو پروژو د تکميل راپور به د FGA او NRRC د کارکوونکو لخوا د NRRC متخصصينو د نظارت لاندې جوړېږي.

په 10-21 جنول د کليوالو په واسطه د لومړي گروپ ازماينښتي پروژو نچور (خلاصه)

ختم تاريخ	شروع تاريخ	د پروژې خلاصه	د پروژو قيمت (دالر)			د پروژو نوم	پروژو نمبر	موقعت	
			مجموعه	توانه	NRRC			کلی	ولسوالی
22-Aug-11	4-Jan-11	سرک جغل اندازی 12.00 km	196,818	3,831	192,987	نگردی کڅ او ثمر خیل د سرک جوړونه	B-GK05	گردی کڅ	بهسود
24-Aug-11	8-Jan-11	زراعتی ویلی 3.85 km	99,288	3,818	95,470	د نهر شای د اوبو د سستم بیا جوړونه	B-KB08	خوشگمب	بهسود
23-Aug-11	4-Jan-11	زراعتی ویلی 6.7 km	99,413	2,514	96,899	د پلنښه د کتل د اوبو د سستم بیا جوړونه	B-KB09	خوشگمب	بهسود
24-Aug-11	26-Dec-10	زراعتی ویلی 1.80 km	69,403	2,995	66,408	د نهر شاهي اول او دوهم کتل د اوبو سیستم بیا جوړونه	B-KB11	خوشگمب	بهسود
14-May-11	27-Dec-10	زراعتی ویلی 2.68 km	15,134	1,468	13,666	د میرانو ویلی پاکول	B-M07	میران	بهسود
17-May-11	29-Dec-10	زراعتی ویلی 4.10 km	16,596	759	15,837	د سراچی د ویلی او اوبه خورد 7 دروازو ویلی غونه	B-SR12	سراچی	بهسود
25-Aug-11	1-Jan-11	زراعتی ویلی 2.88 km	178,458	6,371	172,087	د بالاباغ د کتل بیل غونه	S-BB05	بالاباغ	سره رود
26-Jun-11	3-Jan-11	زراعتی ویلی 6.35 km	26,603	1,586	25,017	د چهل باغ د کتل د اوبو سیستم بیل غونه	S-CB15	چهل باغ	سره رود
26-Jun-11	3-Jan-11	زراعتی ویلی 2.44 km	20,236	646	19,590	د سیسنگ د ویلیو او حوضونو ر غونه	S-CB17	چهل باغ	سره رود
15-May-11	27-Dec-10	زراعتی ویلی 853 km	42,367	1,747	40,620	د کوز سلطان پور پیلده ر ونو جوړونه	S-SPL03	کوز سلطانپور	سره رود
29-Jun-11	3-Jan-11	زراعتی ویلی 2.31 km	52,691	1,429	51,262	د کوز سلطان پور د کتل ر غونه	S-SPL07	کوز سلطانپور	سره رود
6-Jul-11	3-Jan-11	زراعتی ویلی 2.19 km	30,007	1,598	28,409	د بر سلطانپور د زراعتی ویلیو او بندونو جوړونه	S-SPU11	بر سلطانپور	سره رود
25-Aug-11	1-Jan-11	زراعتی ویلی 3.94 km	94,099	2,944	91,155	د دند د شوراد زراعتی ویلیو جوړونه	S-SPU12	بر سلطانپور	سره رود
30-Jun-11	1-Jan-11	زراعتی ویلی 0.900 m	80,014	2,566	77,448	د دوستو خیلو د بند او ویلیو جوړونه	S-SPU15	بر سلطانپور	سره رود

2.1.9.2 دڅارنې او ساتنې د لارښود له مخې د لومړي گروپ قرار دادي پروژو تطبيق:


(1) تكميلوونكې ادارې

د لومړي گروپ د منظور شوي لايست په اسس NRRC لكه څنگه چې په 2.1.2 جدول كې ښودل شوي دي د FGA سره د پروژو د تطبيق قرار داد لاسليك كړ.

دلچې پروژې كوچنې دي نو د 2-2.1 شكل له مخې د KEI او قرار دايانو تر منځ د لومړي گروپ د قرار داد پروسه مخكې ولاړه.

قرار دايانو په واسطه پلي كينونكو پروژو زېڅلو لورو رابطوي انځور په لاندې توگه ايدلاي شي:

شكل 2-2.1 تكميلوونكې ادارې د قرار دادي پروژو لپاره (پلان)

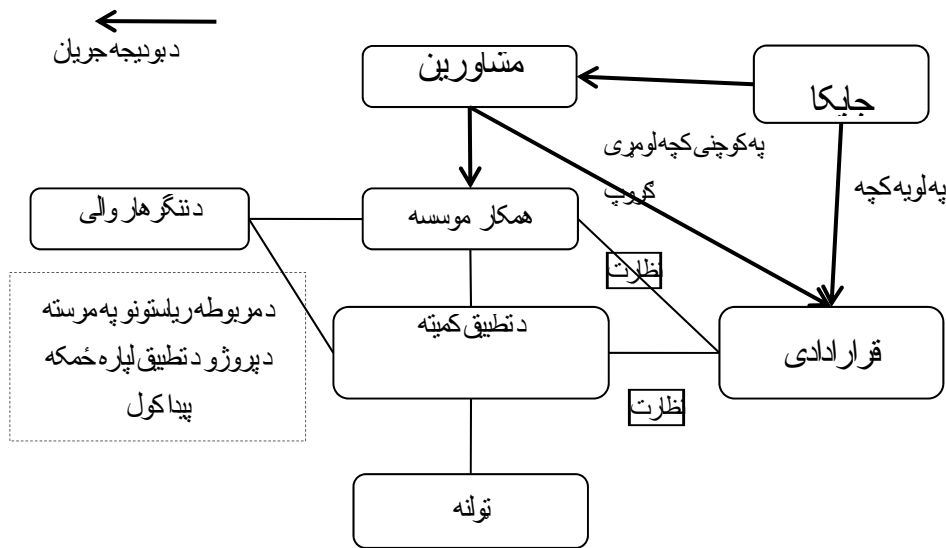

(2) ازاده سيلبي:

د جايكا ادارې د جون 2006 كل د خريداري لارښود په اسس لومړي گروپ د قرار دادي پروژو لپاره د لومړي گروپ د سيلبي كټ مټ انځور په 2.1-11 جدول كې ايدلاي شي.

په 2.1-11 جدول د لومړي گروپ ازماينې پروژو د ازادې سيلبي د مرحلو انځور

اعلانات	د جولای په 28 د 2010 په لکړ وېسليټ باندې
جدول، فهرست	د تخنیکي او ملي لټنځي اشرو ته کتنه
د دعوت طلبې نه مخکې جلسه	11 د دسمبر 2010
د بولي اسناد تسليمول	18 د دسمبر 2010
د بولي اسنادو خلاصول	19 د دسمبر 2010
د نړون لپاره بحث مباحثه کول	20 د دسمبر 2010

(3) د قرار داد محتوا:

د لومړي گروپ پروژو د قرار دايانو د لايست انځور په 2.1-12 او د قرار داد د شرايطو انځور په 2.1-13 جدولونو كې ښودل شوي دي.

په 2.1-12 جدول كې لومړي گروپ ازماينې پروژو لپاره قرار دايانو لايست

د پروژې نمبر	د پروژې نوم	د قرار دادي نوم
B-KB01	د قعه ميرزا دليسي د چار ديوالې جوړول	رضاء احمدی د سرک جوړونې او ساختمانی شرکت
B-SM01	د ثمر خيلو د لايسي د مکتب د چار ديوالې جوړونه	عبدالوفی د سرک جوړونې او د موادو د توليد شرکت
B-SR01	د جوی پلنزه د منځنۍ ښوونځي د چار ديوالې جوړونه	رضاء احمدی د سرک جوړونې او ساختمانی شرکت

د پروژې نومبر	د پروژې نوم	د قراردادي نوم
B-SR02	د علی خان د منځني بنوونځي د چهل ديوالي بيا جوړونه	رضاء احمدی د سرک جوړونې او سلختماني شرکت
B-FA01	د قعه سليم د ابتدايي بنوونځي د چهار ديوالي جوړونه	عبدالوفی د سرک جوړونې او د موادو د توليد شرکت

په 2.1-13 جنول د لومړي گروپ ازماينېتي پروژو د قرارداد د شرايط

حالات	مشمول
د جوړولو وخت	څلور مياشتې
د تضمين وخت	دوه مياشتې / 10% د پيسو ساتل
د کار اندازه	د قرارداد له مخې
د معائنې جدول	نشته مخکې معائنې 20% (به 25% پوره کولو سره 40% (په 65% پوره کولو سره 20% (په پوره)
د کار د تاخير جریمه	0.20% / په ورځ بندې
د قرارداد طريقه	کار تامل قرارداد
نور	د قرارداد د فسخ او غير مترقبه حالات

(4) روزنه:

د لومړي گروپ قراردادي په واسطه پلي کيښودنکو پروژو د تطبيق لپاره د NRRC لخوا د ورکړل شوو تريننگونو خلاصه:

په 2.1-14 جنول د لومړي گروپ د امتحاني قراردادي پروژې د روزنې خلاصه

د لومړي مواد	تاريخ	ځای	روزنه ورکونکي	روزنه اخستونکي
عمومي موضوعات / څارنې لارښود	06 جولای، 2011	سیرینا د قتر	پوشيشانودا	د NRRC افغاني کارکونکي
نه لېسې راپور / د څارنې لارښود	18 جولای، 2011	NRRC جلال اباد د قتر	پوشيشانودا	FGA ساحوي انجنيران
عمومي موضوعات / څارنې لارښود	20 سپتمبر 2011	سیرینا د قتر	NRRC FGA مامورين	د NRRC افغاني مامورينو او د ننګرهار ولايتي ادارې کارکونکي
د قرارداد بحث مباحثه / د تطبيق لارښود	13 سپتمبر 2011	سیرینا د قتر	پوشيشانودا	د NRRC افغاني مامورينو او د ننګرهار ولايتي ادارې کارکونکي
د قرارداد بحث مباحثه / د تطبيق لارښود	سپتمبر 13-2011	سیرینا د قتر	پوشيشانودا	د NRRC افغاني مامورينو او د ننګرهار ولايتي ادارې کارکونکي
د زمکې د کالکولې نېسټ / د څارنې لارښود	11 اکتوبر 2011	سیرینا د قتر	پوشيشانودا	د NRRC او FGA افغاني کارمندان
عمومي موضوعات / څارنې لارښود	17 دسمبر 2011	سیرینا د قتر	پوشيشانودا	د NRRC افغاني کارکونکي

(5) تطبيق:

د پروژو د تطبيق د 2.1-9 لېسټ له مخې صورت نيسي او د تطبيق په برخه کې د اړوندو خواو مسؤليتونه د څارنې په لارښود کې ذکر شوي.

د پروژو د تطبيق په جريان کې به اړوندو خواوو ته د تطبيق، څارنې او نظرات په برخه کې تريننگونه ورکړل شي.

او په 2.1-15 جنول کې د ازماينېتي قراردادي پروژو د تطبيق خلاصه بنودل شوي دم.

د کليوالو لخوا د پلي کيښودنکو پروژو د تکميل راپور به د FGA او NRRC د کارکونکو لخوا د NRRC متخصصينو د نظرات لاندې

جوړېږي.

پہ 15-2.1 جنول لومری گروپ کی دقرار دانیلو پہ واسطہ د تطبیقہ ونکو از مینستی پروژو اتلینز

ختم تاریخ	شروع تاریخ	دیروژی خلاصہ	دیروژی قیمت (بالر)			دیروژی نوم	دیروژی نمبر	موقیعت	
			مجموعہ	شورا	NRRC			کلی	ولسوالی
14-Jul-11	20-Dec-10	218 مترہ جہار دیوالی دیوال	15,801	-	15,801	دقعه میرزا دمکتب د چہار دیوالی جورول	B-KB01	خوشگمب	بہسود
22-Aug-11	29-Dec-10	519 مترہ جہار دیوالی دیوال	43,464	-	43,464	دثمر خیلو دایسی د چہار دیوالی جورول	B-SM01	ثمر خیل	بہسود
14-Jul-11	26-Dec-10	109 مترہ جہار دیوالی دیوال	9,117	-	9,117	دجوی پتزلہ دمکتب د چہار دیوالی جورول	B-SR01	سرچہ	بہسود
14-Jul-11	26-Dec-10	د 206 مترہ جہار دیوالی دیوال	16,797	-	16,797	دعلی خن دمکتب د چہار دیوالی جورول	B-SR02	سرچہ	بہسود
19-Sep-11	4-Jan-11	د 425 مترہ جہار دیوالی دیوال	31,853	-	31,853	دقعه سلیم مکتب چہار دیوالی جورول	S-FA01	قح ابد	سرہ رود

(6) ډول او دوهم گروپ ازملینتې پروژو نظرت:

څرنګه چې خارجي ماهرينو د 2011 کل د فبروري د میاشتي راپړدی خوا د جلال ایدنه لینه نه شوه کولی. نو د جلال اید کل کونکې به کابل ته دعوت کیدل ترڅو د دوی سره د مباحثو او څیړلو د لاری د لاری نه د پروژو نظرت وکړی. او همدارنګه د کیفیت د څړولو روزنه چې د 2011 کل د فبروري په میاشت کې سرته ورسیده چې تفصیل یې په لاندې ډول دی

د NRRC په اداري کچه بحث

وخت: هفته کی یو ځل

ځای: سرینا دقتر

ګډون کونکي: د جلال اید دقتر مسؤل او کلیدي کل کونکي

موضوع: د کار د پرمختګ راپور، عکسونه، د اسنادو برابرول (د نهلی راپور جوړول، د داوطلبی اسناد جوړول او داسې نور...)

د قرار داد موافق د څارني په باره کی ملومت

د نظرت تعقیبول د تملس له مخی

د پروژي د مصونیت په اړه ملومت

د امنیتي وضعی په رابطه د معلومتو پخلی

د پرمختګ د ظرفیت کتنه

د NRRC تخنیکي غونډه

وخت: هفته کی یو ځل (په هفته کی دوه ځل دوهم گروپ پروژو لپاره)

ځای: سرینا دقتر

ګډون کونکي: د NRRC مسوولین او مدیر

موضوع: د عکسونو د لاری د کار جریز او کیفیت مطالعه کول

د پورتنیو غونډو نه علاوه هفتور، میاشتی او ملی راپورونو د کتنی په واسطه هم د پروژو نظرت او څارنه ترسرت کېږي.

2.1.10 د لومړي گروپ ازملینتې پروژو په څارنه او سلته کی مرسته

2.1.10.1 د څارني او سلتي د لارښود برابرول:

د سلتي او څارني د کمیټو رامنځته کول او د سلتي او څارني د لارښود برابرول د عملیاتي لارښود VI برخه ده، چې د سلتي او څارني د طرز العمل د برابرولو لپاره یوه بڼه منع او لارښود هم کیدای شي.

2.1.11 نیمه نهایی لار بنود برابرو

2.1.11.1 د تطبیق لار بنود:

د NRRC د امتحانی پروژو د اسانه پلي کولو په خاطر د تطبیق لار بنود ورغول شو کوم چی د امتحانی پروژو د فعالیتونو لپاره یو رهنمود دی لکه د مختلفو نظرونو موافقه، د امتحانی پروژو انتخاب او طرحه، د قراردادی پروژو د لوطی، او د توالی په واسطه د پلي کونکو پروژو د حفظ او مراقبت او محاسبه. څرنګه چی طرحه شوی وه چی د قراردادی او د توالی په واسطه د پلي کونکو پروژو لپاره جلا جلا لار بنودونه ورغول شی مګر دا چی د دواړه د پلي کولو فعالیتونه شریک دی نو پدی خاطر په یو عملی لار بنود سره راټول کړل. څرنګه چی NSP د افغانستان د توالی په رابطه بڼه معلومت او تجربی لاس ته راوړی وی نو دا ذکر شوی عملی لار بنود د ملی بیوسټون د عملی لار بنود په نظر کی نیولو سره ورغول شو.

دا چی د تطبیق عملی لار بنود د امتحانی پروژو د پلي کیو وړاندي تکمیل شوی وای. خو څرنګه چی دا ول گروپ د پروژو پلي کیل زیت ضرورت وه نو پدی خاطر د تطبیق د عملی لار بنود مسوده د تطبیق سره یوځای په امتحانی شکل وکارول شوه چی وروسته د عملی تمرینونو په نتیجه کی نوموړی لار بنود تمید شو چی بڼه یی په لاندی ډول ده.

- توالی په واسطه د پلي کونکو پروژو لپاره، د بلوری کیفیت ترتیب، مهل ویش او د لګښت شفاییت د NSP د مشکلاتو د اصلاح کولو عوامل بلل کیل.

- قراردادی پروژو لپاره، د قراردادی سسټیم تشریح، څرنګه چی د توالی وګړی د قراردادی په واسطه د پروژو د پلي کولو په رابطه کافی معلومت نه لری نو پدی خاطر د هری مربوطه پلي دندی او مسوولیتونه په ښکله ډول روښانه شوی ترڅو د توالی وګړی بڼه وپوهی

د NRRC د امتحانی پروژو د اسانه پلي کولو په خاطر د تطبیق لار بنود ورغول شوی مګر په راتلونکی کی د نورو سلختمی پروژو د استعمال لپاره بیا کتلو او کره کولو ته ضرورت لری

د تطبیق د لار بنود د محتویات په 16-2.1 جدول کی

په 16-2.1 جدول د تطبیق د لار بنود محتویات

سرایک	محتویات
لمړی برخه: پیژندنه	د NRRC د پروژو عمده ټکي، دندی او مسوولیتونه، د امتحانی پروژو د تطبیق جریز او اجتماعی مطالعه
دوهمه برخه: د همکاري مؤسسي انتخاب	د همکاري مؤسسي د انتخاب کړن لاره، د قرارداد شکل، جوړښت او نوعی
درېمه برخه: د امتحانی پروژو طرحه	د معلومتو راټولول، د نظرونو د موافقی د پروسه سلختل، د امتحانی پروژو انتخاب، د منظوری اخستل
څلورمه برخه: د قراردادی پروژو د لوطی	قراردادی سسټیم، د لوطی ارزایی، د قرارداد ګټونکی ته خبر ورکول
پنځمه برخه: د توالی په واسطه د پلي کونکو پروژو محاسبه	د پروژو د بودیجی انتقال، د بودیجی اداره، د محاسبی مراحل، د محاسبی او خریداری فورمی
شپږمه برخه: امتحانی پروژو تطبیق او مراقبت	د مراقبت اداره کول او پلان ګزاري، مراقبت بودیجه او لوازم، د هری سلختمی پروژو د مراقبت کړن لاره

2.1.11.2 دځل لارښود

دځل لارښود د امتحاني پروژو د اسټه پلي کولو د مرستې په خاطر رغول شوی. پدې لارښود کې د اړونده ټولنې، د کيفيت څارنه، د مهل وېش څارنه، د امنيت څارنه، او د پيسو څارل په واصله ټول روښانه شوی. چې بڼه يې په لاندې ټول سره ده څرنگه چې د قوادلې او د ټولني په واسطه د پلي کونکو پروژو فعاليتونه شريک دي نو پدې خاطر دي رهنمود د نور اټوله امتحاني پروژې د پوښښ لاندې نيولی.

دځلني څلور سترې نقطې چې د کاري کړنلارې پورې تړاو لري په اسله ټول تشرېح شوی، کيفيت څارلو سلمان ددې وخت او معيار. د کيفيت د څارلو عمده لارې عبارت دي د سلمې ارزونه د بڼه کټکريټ اچونې لپاره، د ځمکې د تخته کولو په خاطر د غلظت ارزونه او په لارښود کې د بڼه شوي تعمير د بنسټ په خاطر د ساحې برداشت کتل، د زياتو نمونو معرفي او د گراف په واسطه د پلان شوي کار کنترول، طريقي معرفي شوي. دځلني اړوندو لازياتو ملوماتو لپاره لاندې جدول ته مراجعه وکړی.

په 2.1-17 جدول دځلني د لارښود محتويات

محتويات	عنوان	برخه
پس منظر، دځلني د لارښو پس منظر او موخي	عمومي	1- برخه
د از مېنټي پروژو د تطبيق پر مهل د اړوندو خواؤ مسؤليتونه	مسؤليتونه	2- برخه
د کيفيت د کنترول عمده نقطه شرطونه او فور مونه 1- موقت کارونه 2- احطې ديوالونه 3- د تهاب کار 4- د قير کولو کار 5- د کټکريټ کار 6- سلختملي کار	د کيفيت کنترول	3- برخه
احجام، گراپونو انځور په واسطه کنترول	د مهل وېش کنترول	4- برخه
هغه، اسلې لاري چاري، د عاجل تملسونو جل جوړول	مسؤليت او خونديتوب	5- برخه
د مياشتې د کاري پر مخگ او دنظرت راپور نموني	د کاري پر مخگ مياشتې راپور	6- برخه
د پروژې د تکميل راپور	د از مېنټي پروژې د بشپړيدو راپور	7- برخه
د پای گټي محتويات	د بېروژې وروستې اېښه	8- برخه
د بوديجي د انتقال مهل وېش	د پروژې د بوديجي انتقال	9- برخه

2.1.12 د دويم گروپ از مېنټي پروژو غوره کول او پلانول:

د نظرونو د موافقي د جوړښت تر عنوان لاندې شماری نمبر 2.1.6.1 جدول کې

د دويم گروپ د پروژو د انتخاب، د تطبيق نوعه او د نظرونو د موافقي د اصولو او د پروژې د انتخاب د شرايطو په اسلس انتخاب شوي.

د دويم گروپ د پروژو د انتخاب شرطونه په لاندې جدول کې کتلاي شي

په 2.1-18 جدول کې دويم گروپ د پروژو د انتخاب معيارونه

د پروژو د انتخاب شرطونه
- چې په اسلې سره پرې موافقه وشي
- بيزاين بي سله وي
- حفظ او مراقبت يې په اسله کېدای شي
- د سلختمان نوعي لکه سرکونو، بڼوونځي، گلپښو او نور

هغه پروژې چې د نويو ځمکو وقف او يا د نظرونو موافقه وړ بلنې ستونزمنه وي د پروژو د لېست څخه وېشل کېږي.

او په نتیجه کې کلیوالی او قراردادی دواړو قسمو پروژو خلکه د یو بشنهاد په ډول چې د FGA په واسطه د NRRC د افغلي او خارجي همکارانو په لارښوونه تر نیب (AF) په شکل د منظوری لپاره د جلیکا لاری ته وړاندې او د هغوی له منظوری څخه وروسته له (AF) څخه د پروژې د قیمت په لپړې کولو سره د اړوندې لاری ته د TWG د منظوری لپاره وسپارل شو چې د هغوی لخوا منظور شو.

په 19.2.1 جنول د دوهم گروپ انتخاب شوو ملینې پروژو لیست

(بېسودولسوالی)

کلی نوم	شماره	پروژې نمبر	پروژې نوم	نوع
هډه لخنزاده	1	B-HA01	د هډې د ایسې ته توسعه	قرارداد په شکل
	2	B-HA01	هډې کلینک ته توسعه	قرارداد په شکل ※
گردي کڅ	3	B-GK01_02	گردي کڅ منځنی بنوونځی توسعه	قرارداد په شکل
خوشگمبډ	4	B-KB02_03	قعه میرزا ایسې توسعه	قرارداد په شکل
میران	5	B-M01	دمیرانو دابتدایې بنوونځی لپاره نوی تعمیر جوړونه	قرارداد په شکل
	6	B-M03	سرک فیر کول	قرارداد په شکل
ثمر خیل	7	B-SM03	دثمرخیلو دکمپ نیمه کاره بنوونځی رگونه	قرارداد په شکل ※
	8	B-SR03	د علی خان د هلکتو منځنی بنوونځی توسعه	قرارداد په شکل
سراچي	9	B-SR05	په نغور کې د نوی ابتدایې بنوونځی جوړول	قرارداد په شکل
	10	B-SR01_02	د ۱۵ ویلی د منځنی بنوونځی چل دیوالی رگول	قرارداد په شکل ※

(سره رودولسوالی)

کلی نوم	شماره	پروژې نمبر	پروژې نوم	نوعه
بالاباغ	1	S-BB01_02	د بالاباغ د کلینیک توسعه	قرارداد په شکل ※
چېر باغ	2	S-CB01_02	د چېر باغ د ایسې توسعه	قرارداد په شکل
	3	S-CB07	سرک فیر کول	قرارداد په شکل
فتح اباد	4	S-FA02	د فتح اباد کلینک رگونه	قرارداد په شکل ※
	5	S-FA07	په سرک جغل لچونه	قرارداد په شکل
کوز سلطان پور	6	S-SPL10_11	د کوز سلطان پور د نجونو د ایسې توسعه	قرارداد په شکل
بر سلطان پور	7	S-SPU01	د بر سلطان پور د منځنی بنوونځی توسعه	قرارداد په شکل
	8	S-SPU08	د بر سلطان پور د پیلده رونو جوړونه	قرارداد په شکل

*پوری لمتحلی پروژې کومی چه خلله تعلق شوی

دغه لیست په ۹ د اپریل ۲۰۱۱ کی دننگر هلو لایتي اداری لخوا منظور شو، خو تصمیم و نیول شو چی NRRC د پی دی سی (ولایتي پرمختیالی غونډه) تر غونډې تر منظوری پورې منتظر اوسی تر څو د ولایتي اداری منظوری یقینی شي.

د PDC د منظوری مراحل په لاندې ډول دي:

- 04 می ۲۰۱۱ PDC فسخه کیل
- 25 می ۲۰۱۱ PDC فسخه کیل
- 01 جون ۲۰۱۱ ولایتي پرمختیالی غونډه ترسره شوه خو د پروژو ورکړل شوی وی لیست منظور نه شو.
- 05 جون ۲۰۱۱ د جلیکا لخوا نه یو مکتوب دوهم گروپ د پروژو لیست د PDC نه دنه منظوری

دغلت په خاطر ولایتي اداره ته تسليم شو

15 جون 2011 د دوهم گروپ پروژو د قرار دلايلو دانتخاب په مناسبت د ننگرهار ولایتي ادارې يوه
ليک د جليکافغانستان دقررت ته تسليم کړه

29 جون 2011 ولایتي پرمختیایي غونډه ترسره شوه خو د پروژو ورکړل شوی وی لیست منظور
نه شو

07 جولای 2011 د جليکامرکزي ادارې، د NRRC د مسؤل نودا او د ننگرهار ولایتي ادارې په استازیتوب د سکوري ريس بناغلي احمد
شاهسادات سره له خوا يوه غونډه دایره شوه او په لاندې ټکو دريولو او لخوا موافقه وشوه:

- NRRC او تخنيکی اوسکوري ريلست ادارې به سره په میاشت کې دوه کرته
- غونډه کوی
- بناغلي سادات به د جليکا کابل دقررت سره په میاشت کې يوځل غونډه ولري
- د پروژو د داطلي به د جليکا د قتون له مخې تر سره کيږي.
- ننگرهار ولایتي اداره به د قرار دلايلو په اړه که کومه نيوکه ولري د NRRC سره شريکوي.
- جليکا به د ولایتي ادارې درسمي منظوری طرز العمل تعقیوي.
- NRRC به د پروژو نه شريک نظرت ترسره کړی

03 اگست 2011 بناغلي سادات د 07 جولای 2011 دجلسی خلاصه امضاء کړه

08 اگست 2011 PDC د دوهم گروپ پروژو لیست منظور کړو

د لومړي او دويم فيز د ملي کل د وقي له امله تصميم ونيول شو چې د دويم گروپ څلور کوچنی پروژې (S-FA02/S-BB0102/B-SR0102/B-HA01) د دويم گروپ په دويم فيز کې عملي شي. او د دويم گروپ لڅه قرار دلايلو څخه دې شرکتونه شرايت ليست شي ددې تر څنگ د B-SM03 پروژو هفسخه کيږو تصميم هم ونيول شو ځکه چې د يوې بلي لڅبو لخوا تر دې دمخه پلي شوي وه، پدې اړه د ننگرهار ولایتي ادارې ته د دسمبر په 2011 کې رسمی ټول خبر شو.

2.1.13 د دويم گروپ از میننتي پروژو پلي کول

2.1.13.1 د څارني او سلتي د لار بنود په اسلس دکليوالو په واسطه د عملی کيدونکو پروژو پلي کول:

(1) تکميلوونکي ادارې

د جليکا څخه د دويم گروپ د امتحانی پروژو د لیست منظوری په اسلس د NRRC د 2011 د اپریل په يوولسم دهمکری موسسی سره دکليوالو لخوا پلي کيدونکو پروژو د تطبيق لپاره قرار دانت ترسره کړو کوم چه به 2.1-1 جدول کې ذکر شوي چې د پروژو د تطبيق چاری دې سی د منظوری څخه ورسته شروع شی.

(2) روزنه:

دکليوالی لخوا د تطبيق کيدونکي پروژو د تطبيق تريننگ په 2.1-8 جدول کې بنودل شوي دي

(3) تطبيق:

د پروژو تطبیق د 2.1-9 ایست له مخی صورت نیسی او تطبیق په برخه کی د اړوندو خواو مسؤلیتونه د ځانی په لار بندو کی نکر شوی.
د کلیو الوخو تطبیق کیونکی امتحنی پروژو خلاصه په 2.1-20 جدول کی بنودل شویده. د پروژو نهلی راپور د FGA او NRRC د مامورینو لخوا
د څار جی متخصصنو د نظارت لاندی جوړ شویدی.

په 20-21 جنول د ننتوتی په واسطه د عملی کیدونکو امتحالی پروژو د دهم گروپ خلاصه


تکمیلیدو نیتیه	شروع نیتیه	پروژی خلاصه	قرداد مقدار			پروژی نوم	پروژی نمبر	موقیعت	
			مجموعه	شورا	JICA/NRRC			کلی	ولسوالی
13/3/2011	11/9/2011	4,1 ^{km} سرک جغل اچونه	283,664	5,888	277,776	سرک جغل اچونه	S-FA07	فتح اباد	سره رود
8/3/2011	7/9/2011	1,7 ^{km} پلي لاری جوړول	77,926	2,862	75,064	برسلطن پور پلي لارو رگونه	S-SPU08	برسلطن پور	سره رود

2.1.13.2 دځل او کار د لارښود له مخې د دویم ګروپ قرار دادي پروژو پلي کول:


(1) د تطبيق جريڼ

د امتحاني پروژي د دوهم ګروپ د منظور شوي پروژو وليست له مخې NRRC او FP تر منځ د پروژ د پلي کولو قرار دانتز سره شوو 2.1-1 جدول کې د FP سره د قرار د خالصه نکر شوي په لويه کچه قرار دانونه د ۱، ۲، ۳ بڼه له مخې د جليکا او قرار دادي تر منځ مستقيم تر سره کيدلو خودجولای 2011 قرار دانتغیرو کولو لوتول قرار دانونه د 4-2.1 بڼه له مخې د مشورينو او قرار دادي لوتو تر منځ تر سره کېږي. د قرار دادي از ملينتي پروژو لپاره پلان شوي بڼه

شکل 3-2.1 بشپړ اداري تشکيل د کليوالی پروژو لپاره پلان

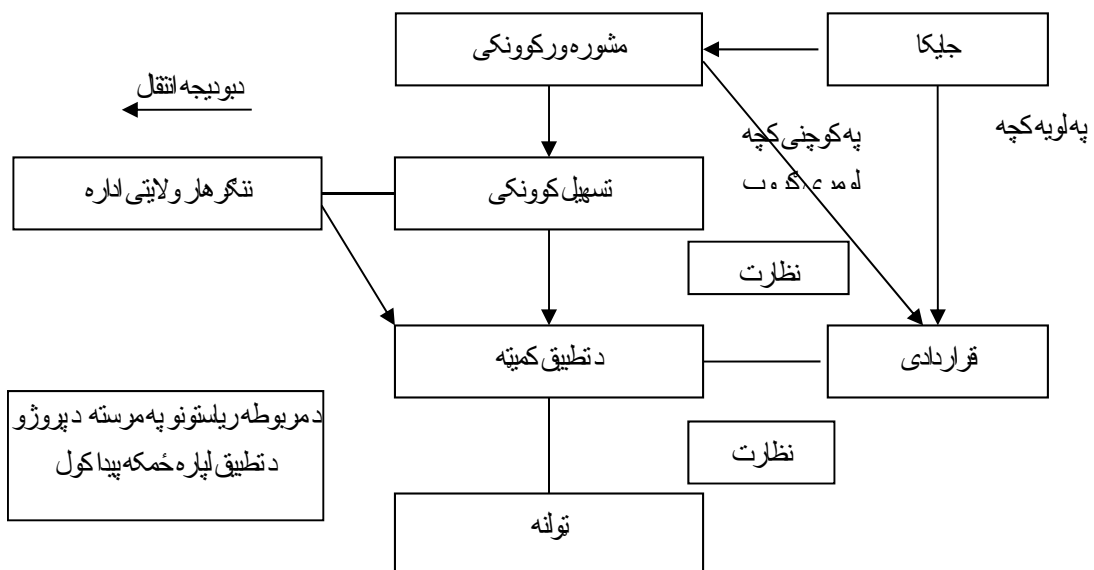

شکل 4-2.1 د قرار دادي از ملينتي پروژو لپاره عملي بڼه

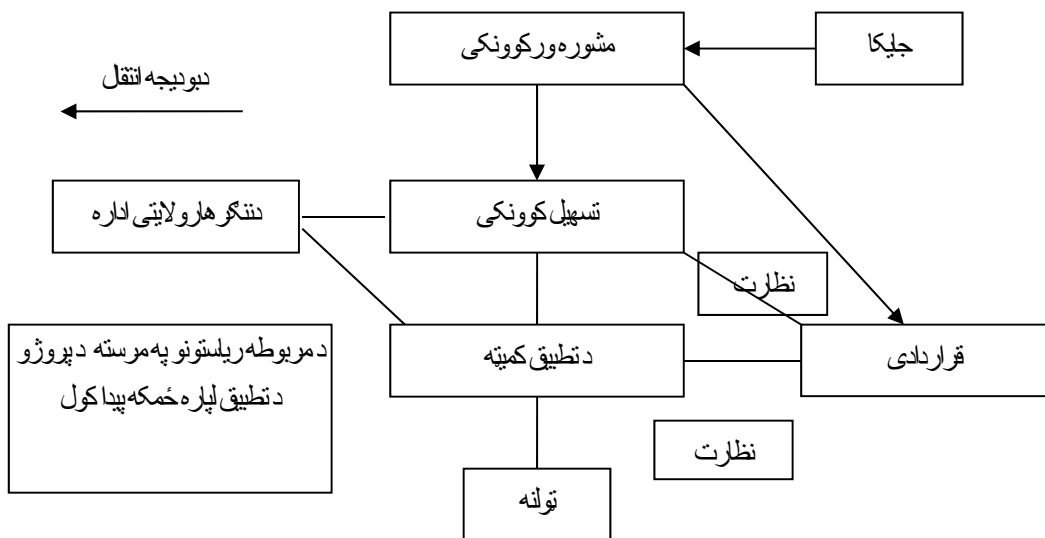

(2) داوطلبی

قراردادین قرار دادی پروژو اپله داوطلبی دپروسی له لاری د جلیکاد خریداری د لار بنود مطلق کوم چی په جون 2006 کی لیکل شوی
انتخابیږی. دامتحلی پروژی د دوهم گروپ قرار دادی داوطلبی کړن لاره په 21-2.1 جدول کی بنودل کیږی

په 21-2.1 جدول کی دوهم گروپ دامتحلی پروژو داوطلبی خلاصه

اعلان	28 جولای 2010 او 21 مارچ 2011 لاکبر په ویب سلیت کی
غورچڼ	دملی او تخنیکي اړخ له مخی نکلته
داوطلبی نه مخکی جلسه	16 اگست 2011
داوطلبی داسناد تسلیم وول	04 سپتمبر 2011 ~ 25 سپتمبر 2011
سپړنه	13 سپتمبر 2011 ~ 26 سپتمبر 2011
په قرار دامباحثه	تر سپتمبر اخره 2011
قرار دانتیجه	05 اکتوبر 2011 او 19 اکتوبر 2011

(3) قرار دامحتویات

دامتحلی پروژو د دوهم گروپ قرار دادینو ایست په 22-2.1 جدول کی او قرار دادینو شرایط په 23-2.1 جدول کی بنودل کیږی

په 22-2.1 جدول دویم گروپ دامتحلی پروژو قرار دادینو ایست

لپروژی شمیره	لپروژی نوم	قرار دادی نوم
B-HA01	دهدی دلیسی توسعه	محبوت ساختمنی شرکت (ام سی سی)
B-GK01_02	دگری کڅ دمنځنی بنوونځی توسعه	داحمدی گروپ ساختمنی لوجستکی خدمت
B-KB02_03	دقعه میرزا دلیسی توسعه	دوحیدو هاج ساختمنی، موادو تولید او سرک جوړونی شرکت (دبلیو دبلیو سی سی)
B-M01	دمیرانو دابتاییه بنوونځی اپله دنوی تعمیر جوړونه	دقلت ساختمنی شرکت (کیو سی سی)
B-M03	دمیرانو په سرک قبر اچونه	دخورکار ساختمنی، ساختمنی موادو او سرک جوړونی شرکت (کی سی سی)
B-SR03	دعلی خان دهلکو دلیسی توسعه	لامین ساختمنی شرکت (ای سی سی)
B-SR05	دنگوا ابتاییه بنوونځی اپله دنوی تعمیر جوړونه	دمنصف ساختمنی شرکت (ام سی سی)
S-CB01_02	دچهار باغ دلیسی توسعه	داحمدی سرک او ساختمنی شرکت (ار ای سی سی)
S-CB07	دچهار باغ په سرک قبر اچونه	ار یون ساختمنی شرکت (ای سی سی)
S-SPL10_11	دکوز سلطان پور دنجونو دلیسی توسعه	د عبدالغفور فیصل ساختمنی شرکت
S-SPU01	دبر سلطان پور دمنځنی بنوونځی توسعه	نوی سادات ساختمنی شرکت

د اکتوبر د میاشتی په پنځمه نیټه د NRRC لخوا د کوز سلطان پور فرعی پروژی (S-SPL10-11) د جوړیدلو اپله د زاهد صافی ساختمنی شرکت (ZSCC) سره تړون لاسلیک کړ، خو نوموړی ساختمنی کمپنی د همدی میاشتی په 17 نیټه له قرار داد څخه منصرفه شوه. نو تر دې وروسته NRRC د عبدالغفور فیصل ساختمنی شرکت سره چې د گتونکو په دویم چانس کې وه تفاهم وکړ او د 2011 م کل د اکتوبر په 19 نیټه یې ورسره د نوموړی فرعی پروژی تړون لاسلیک کړ. د تفاهم په جریان کې NRRC او قرار دادی تر منځ د لومړي پړاو عمده کړی برخي تعیین او قرار داد په لومړي پړاو کې ځای پر ځای شوي.

په 23-2.1 جدول دویم گروپ از مینستی پروژو قرار داد شرایط

شرایط	محتویات
دکل موده	29 فوری 2011
دتنظیم موده	د قرار داد شوی مقدار 10% تر څو ورو میاشتی
عمده برخي	د قرار داد مطلق

محتویات	شرایط
بی له پیش پرداخت خخه	
د 25% کمر تکمیل خخه وروسته 20% پیسی ورکول	
65% کمر تکمیل خخه وروسته 40% پیسی ورکول	
20% پیسی کله چی مکمل ټول کار خلاص شو	
	د پیسو دور کولو مهل ویش
په ورځ/0.2%	د خنډ پر مهل جریمه
ټول په ټوله	قرار داد میتود
د قرار داد د فسخ او غیر مترقبه حالات	نور

(4) بنونی یازده کړی:

د دوهم گروپ قرار دادی په واسطه پلي کیدونکو ازملینتی پروژو تر بینگونه 14-2.1 جنول کی بنودل شوی دی او د نظارت کونکو لخوا وخت په وخت دغه تر بینگونه ورکړل شوي.

(5) تطبیق:

د ځل د لارینود په اسلس د قرار دادینو په واسطه پلي کیدونکو پروژو تطبیق تر سره شو. د تطبیق په جریڼ کی د ځل د نظارت مهل تونه مربوطه لورو ته انتقال شوي چې خلاصه یی د قرار دادینو په واسطه پلي کیدونکو ازملینتی پروژو دویم گروپ په 24-2.1 نمبر جنول کی لیدلای شی لونه لپی راپور هم د FGA او NRRC لیکل کونکی لخوا دخل جی متخصصینو د نظارت لاندی ترتیب شوو.

په 24.21 جنول نلوهه گروپ نقراردادی امتحلی پروژو خلاصه

د پروژی د تسلمی نیټه	د شروع نیټه	د پروژی خلاصه	د پروژی قیمت په (امریکایی ډالر)			د پروژی خلاصه	د پروژی نمبر	موقیت	
			مجموعه	دوهمه مرحله	لومړی مرحله			کلی	ولسوالی
29 فروری 2012	13 اکتوبر 2011	16 صنفی	228,571	88,360	140,211	دهدی د بنونخی توسعه	B-HA01	هده اخذاده	بهسود
	په دوهمه مرحله کی تکمیلیری	د کلینیک ترمیم	56,622	56,622	-	دهدی د کلنیک توسعه	B-HA02	هده اخذاده	بهسود
27-Feb-12	29-Oct-11	8 صنفی	181,824	90,586	91,238	د گری کخ بنونخی توسعه	B-GK01_02	گردی کخ	بهسود
22-Feb-12	13-Oct-11	16 صنفی	280,366	98,015	182,351	د قلعه میرزا د بنونخی توسعه	B-KB02_03	خوشگمبد	بهسود
22-Feb-12	27-Oct-11	8 صنفی	175,548	76,228	99,320	دمیران ابتدایی بنونخی جوړونه	B-M01	میران	بهسود
11-Mar-12	27-Oct-11	DBST 2.1km	229,688	-	229,688	سرک قیرکول	B-M03	میران	بهسود
	فسخه شوو	6 صنفی	48,974	48,974	-	د ثمر خیلود بنونخی بیارغونه	B-SM03	ثمر خیل	بهسود
29-Feb-12	13-Oct-11	16 صنفی	292,932	159,591	133,341	د علی خان دبنونخی توسعه	B-SR03	سراچه	بهسود
29-Feb-12	13-Oct-11	۱۶ صنفی	285,109	134,689	150,420	په نغلو کی د نوی بنونخی جوړول	B-SR05	سراچه	بهسود
	په دوهمه مرحله کی تکمیلیری	105 متره احاطی دیوال	13,346	13,346	-	د جوی پانزاده بنونخی احاطی دیوال	B-SR01-02	سراچه	بهسود
	په دوهمه مرحله کی تکمیلیری	20 صنفی	31,608	31,608	-	د بالا باغ کلنیک توسعه	S-BB01_02	بالا باغ	سره رود
29-Feb-12	13-Oct-11	16 صنفی	368,741	199,989	168,752	د چهارباغ د بنونخی توسعه	S-CB01_02	چهار باغ	سره رود
29-Feb-12	15-Oct-11	DBST ۱,۲km	189,277	-	189,277	سرک قیرکول	S-CB07	چهار باغ	سره رود
	په دوهمه مرحله کی تکمیلیری	د کلینیک ترمیم	40,336	40,336	-	د فتح اباد د کلنیک توسعه	S-FA02	فتح اباد	سره رود
29-Feb-12	19-Nov-11	8 صنفی	215,876	86,233	129,643	د کوز سلطان پورد بنونخی توسعه	S-SPL10_11	کوز سلطانپور	سره رود
29-Feb-12	24-Oct-11	20 صنفی	294,260	158,754	135,506	د یر سلطان پور د بنونخی توسعه	S-SPU01	یر سلطان پور	سره رود

2.1.14 په بهسونو او سره رود ولسواليو کې د پرمختللي اړتيلو سروي کول:

د پرمختيايي اړتيلو سروي اسلسي هدف په سره رود او بهسونو ولسواليو کې د NRRC د پروژې نورو ساحو ته دراتلونکي توسعي لپاره عينا د اجتماعي سروي په څېر پلان شوي وه. خو څرنگه چې د امنيتي حالاتو د شرايطو په اسلې د NRRC پروژې نورو ساحو ته توسعه نه ايجلوي، نو پدې اسلې د سروي بڼه ددې پرځای چې د کليوالو سره د مستقيم تماس له لارې تر سره شي تغير شوه او زيات مالومات د موجوده مالو سربيره د ولايتي ادارې په وينا، د ولسوالانو، اړوندو ريلستونو، او نړيوالو موسسو څخه راټول شول.

چې دغه سروي د 2011م کل د مې په مياشت کې پيل او د 2011م کل د دسمبر په مياشت کې يې JICA ته نيمه نهلي راپور تقديم شو. چې سربيره په راپور د کليو انځورونه، نيز بڼلي ساختمانونه او جدولونه د سروي د راپور تکميلونکي دي. داراپور د محدودو منابعو د مالوماتو په اسلې جوړ شوی، خو دا د ولايت او ولسواليو د پرمختيايي پلان په اسلې او هغه څه چې د مربوطه ريلستونو لخوا اوريدل شوي متکي دي. نو بيلدې پوه شو چې دغه پراختيايي ضرورياتو پلان د بهسونو او سره رود ولسواليو لپاره کومک کوونکی دی. په هر حل دا پرمختيايي ضرور تونه چې په دې راپور کې راټول شوي دي نه په تخنيکي توگه يقيني شوي چې هم موفيدت، موثريت، او پلان د دولت د پاليسۍ سره سمون په نظر کې ندي نيول شوی. نو بيلد د کلنيد شويو پروژو حقيقي تطبيق څخه د مخه لار بيله مطالعه او څيړنه يې بيلد تر سره شي.

2.1.15 د پروژې د لومړي پړاو د پرمختگ د راپور جوړول:

د پروژې د لومړي پړاو د فعاليتونو راپور جون 2011 نه تر ملچ 2012 ته پيه شو.

2.2 دويم پړاو

2.2.1 د دويم پړاو کلي طرحه په اړوند د نظر ونو تابلې:

د دويم پړاو کلي طرحې د تطبيق طريقه او هغه فعاليتونه چې بيلد تر سره شي تشریح کوي.

د NRRC پروژې خارجي متخصصينو بناغلی سادات ددې د تشریح او منظوری لپاره کابل ته دعوت او دکلي طرحې تر تشریح د نظرونو تر تابلې وروسته يې منظور کړ.

2.2.2 همکلی موسيسی سره تړون

د JICA د 2006 کل د تدارکاتو د قانون د لارښود سره سم همکله موسسه د لومړي پړاو لپاره تعين شوي وه نو قرارداد مود 2.2-1 جدول په شکل ترتيب کړو

په 2.2-1 جنول همکاري موسیسي سره د نړون لنډیز

د نړون نمبر	د نړون محتويات	د نړون موده	د نړون نېټه
FPC #04	لايحه وظيفه په لاندې ډول دی: - د امنيتي وضعې څيړل - د امتحاني پروژو انتخاب او پلان کناري (درېم گروپ د کليوالو په واسطه پلي کوونکو پروژي) - د جی ای د پروژو انتخاب او طرحه	26 اپریل 2012 ~ 29 مارچ 2013	26 اپریل 2012
FPC #05	د دوهم گروپ امتحاني پروژو د تطبیق په خاطر د FPC05 نړون مشتمیل دی: - دوهم گروپ د 09 قراردادي امتحاني پروژو نظارت - دوهم گروپ د 04 وړو پټی شو قراردادي امتحاني پروژو طرحه، تفصیل او نظارت،	26 اپریل 2012 ~ 29 مارچ 2013	26 اپریل 2012
FPC #06	د FPC06 نړون د منظوري په اسلېس د درېم گروپ د کليوالو په واسطه د پلي کوونکو پروژو طرحه، نظارت، او تطبیق.	05 جولای 2012 ~ 29 مارچ 2013	5 جولای 2012

2.2.3 دوهم گروپ قراردادي از مینستي پروژو تطبیق (د لومړي پړاو په نوم)

د لول گروپ کليوالو په واسطه پلي کوونکي ټولي پروژي او دوه قراردادي پروژي د 11 قراردادي پروژو له جملې څخه په لومړي پړاو کې تکمیل شوي. د 9 قراردادي پروژو تطبیق په دوهم پړاو پوري جریڼ درلوده. پټی 4 وړي قراردادي پروژي په دوهم پړاو کې تطبیق شوي دي.

(1) تکمیلوونکي اداري

دوهم گروپ لپاره د JICA د قرارداد له نوي کولو له مخې NRRC د همکاري موسیسي سره دوهم گروپ د تطبیق په دوام تړون ترسره کړو او تفصیلی ډیزاین او څارنه د څلورو کوچنیو امتحاني پروژو په 26 داپریل 2012 کې کوم چه په 1-2.2 جنول کې بنودل شوي دي تکمیلوونکي اداري په 4-2.1 شکل کې بنودل شوي دي

(2) د لوطلي

د دوهم گروپ د څلورو پټی شو قراردادي پروژو د قراردادي انتخاب د 2006 د جون په میاشت کې د جلیکا د تدارو کتو د جوړ شوي رهنمود سره سم شوي وي. چې حقیقي د لوطلي مراحل يې په (2.2-2) جنول کې بنودل شوي.

د دوهم گروپ د څلورو پټی شو قراردادي پروژو د لوطلي مراحل

په 2.2-2 جنول کې د لوطلي مراحل دویم گروپ پټی قراردادي په واسطه تطبیق کېدونکي امتحاني پروژي

د لوطلي لپاره د نوي ولسوالي دوه امتحاني پروژي په يو ډلگي کې يوځای شوي، يوه پروژو د مناسب د لوطلي لپاره کفایت نکوي	تر نېونه
د لاندې ملدي په اسلېس پټی شو	څيړتيا
هغه قراردادي چې دوهم گروپ په امتحاني پروژو کې يې ښه کفایت سره پروژي ترسره کړي وي انتخاب شول	غوړچن
د متخيب شو کمپنيو د کاري تجربو څخه چې دوی لولي په لنډو لیک کې ورڅخه صرف نظر شوو	د بولي نه مخکې مجلس
17 جولای 2012	د لوطلي
18 نه تر 21 جولای 2012 پوري	د لوطلي پر قرارداد مباحثه
22 جولای 2012	قرارداد

(3) د قرارداد محتویات

د دوهم گروپ په امتحلی پروژو لپاره د قراردادینو لړ ایک په 3-2.2 او د قرارداد حالت په 4-2.2 جدول کی بنودل شوی ده

په 3-2.2 جدول دوهم گروپ امتحلی پروژو لپاره د قراردادینو لړ ایک

د قراردادینو نوم	د پروژو نوم	بلگی
قاعت سلختمنی شرکت	دهزی لخنز لاه دکلیک توسعه	B-HA02
	دجوی پنز لاد د متوسطی د اطحی جوړول	B-SR01_02
دمنصف سلختمنی شرکت	دیالاباغ دکلیک توسعه	S-BB01_02
	د قح لاد د BHC ترمیم	S-FA02

په 4-2.2 جدول دوهم گروپ د امتحلی پروژو د قرارداد حالت

محتویات	حالت
شپړ میاشتی	د جوړینو موده
نوه میاشتی / 10% سلته	د ضمانت موده
پشکی نه ورکول 50% (د 55% کل د بشپړ پیروسته) 50% کل د بشپړ پیروسته	د تلبه کړنلاره
0.2% په ورخی	د تلخیر جریمه
کل تمام قرارداد	د قرارداد طریقہ
د غیر مترقبه حالت بدخته میو حالت	نور

(4) ترینگونه

په روزمره کارونو کی روزنی په بریننا ایک د افهام او تفهیم او په کابل کی د نوبتی غونډو د لاری تر سره کیدی، چی په کی د نظرات لاری چلی، د وخت تمید او همدنگه د اضافه کړی په رابطه قراردادی او FGA ته بنودنی کیلی

(5) تطبیق

تطبیق د 9-2.1 جدول په اساس چی د هری مربوطه بلی دندی د نظرات په لارینو د کی نکر شوی تر سره کیده. د کل په جریب کی مربوطه ادارو ته د نظرات، مراقبت او د تطبیق روزنی ورکول کیلی. قراردادی امتحلی پروژو د تطبیق خلاصه په 5-2.2 جدول کی بنودل شوی. د امتحلی پروژو د بشپړ پیورپور د FGA او د این ارا سی د کل مندانو په واسطه د این ارا سی د خراجی ماہرینو د نظرات لاندی تکمیل کړ. په مسوده کی بلون د تطبیق په دوران کی په لاندی ډول سره بنودل شوی

(a) د طرحی تغیر - 1 (اضافه کړی د څه حجرونی په وخت کی)

د خورو د غیر متوقع طبقتو او شرایطو په اساس کله چه د څه ژوروالی 40 مترو ته ورسیده د توقع خلاف د څه او په د څنک قبل نه وی نویدی اساس څه تر 100 مترو پوری ژوره شوه د څه د ژوروالی په اساس د پیپ نوعیت او اندازه هم تغیر شوه چه د اجمو د نهایی معلومیدو څخه ورسره ورته قرارداد تغیر شوو

(b) د طرحی تغیر - 2 (د زینی په برخه کی اضافی تغیرات)

دلچی دینوونی او روزنی وزارت په اتمه صنفی یو پوریزه تعمیر کی زینه په نظر کی نیول شوی وه مگر د زینی د بام دیوینین لپاره په اجمو کی کوم مقدار په نظر کی نه وه نیول شوی نویدی اساس چی د معارف محترم ریاست د زینی د بام دیوینین لپاره درخواست وکړو نو په طرحه کی د تغیراتو قبلو لول حکم ورته ورکړل شو چه د اجمو د نهایی معلومیدو څخه ورسره ورته قرارداد تغیر شوو او د کل حجم د زینیو په اساس مربوطه فرعی پروژی کړی وخت نیمه میاشت نور هم تمید شوو.

په 5-22 جنول لښوهم گروپ قراردادى امتحلى پروژو خلاصه

د پروژى د تکميل کيدونکي	د پروژو د نيمگړتياو د پوره کيدو موده	د پروژى د تسلمى نېټه	د شروع نېټه	د پروژى خلاصه	د پروژى قيمت په (USD)				د پروژى خلاصه	د پرژى نمبر	موقيت	
					مجموعه	دوهمه مرحله		لومړى مرحله			کلى	ولسوالى
						اخيرى	اصلى					
		30-Nov-12	1-May-11	16صنفي	228571.00	-	76735.00	151836	دهدى د بنونځى توسعه	B-HA01	هده اخنژاده	بېسود
		31-Jul-13	23-Jul-12	د کلينيك ترميم	56622.00		56622.00	-	د هدى د کلينيك توسعه	B-HA02	هده اخنژاده	بېسود
		15-Oct-12	1-May-11	8صنفي	185411.00	94825.00	90586.00	91238.00	د گري کڅ بنونځى توسعه	B-GK01-02	گردي کڅ	بېسود
		30-Nov-12	1-May-11	16صنفي	280366.00	-	98015.00	182351.00	د قلعه ميرزا د بنونځى توسعه	B-KB02-03	خوشگميد	بېسود
		14-Nov-12	1-May-11	8صنفي	179442.00	80122.00	76228.00	99320.00	دميران ابتداى بنونځى جوړونه	B-M01	ميران	بېسود
5-Aug-12	8-Jul-12	11-Mar-12	-	DBST 2.1km	229688.00	-		229688.00	سړک دى بى ايس نى کول	B-M03	ميران	بېسود
				لغوه شوى	48974.00	-	48974.00		د ثمر خيلود بنونځى رگونه	B-SM03	ثمر خيل	بېسود
		30-Nov-12	1-May-11	16صنفي	292932.00	-	138347.00	154585.00	د على خان دبنونځى توسعه	B-SR03	سراچه	بېسود
		31-Jun-13	2-May-11	16صنفي	29094.00	140937.00	122451.00	150006.00	په نغلو کى د نوى بنونځى جوړول	B-SR05	سراچه	بېسود
		31-Jun-13	23-Jul-12	متره داخاطى ديوال 105	13346.00	-	13346.00	-	د جوى پانزاده بنونځى احاطى ديوال	B-SR01-02	سراچه	بېسود
		30-Nov-12	23-Jul-12	20صنفي	31608.00	-	31608.00	-	د با لا باغ کلينيك توسعه	S-BB01-02	بالا باغ	سره وړود
		30-Nov-12	1-May-11	16صنفي	368741.00	-	161885.00	206856.00	د چارباغ د بنونځى توسعه	S-CB01-02	چهار باغ	سره وړود
31-Jul-12	8-Jul-12	29-Feb-12	-	DBST 1.2km	189277.00	-	-	189277.00	د سړک دى بى سټى کول	S-CB07	چهار باغ	سره وړود
		31-Jun-13	23-Jul-11	د کلينيك ترميم	40336.00	-	40336.00	-	د فتح ا باد د کلينيك توسعه	S-FA02	فتح اباد	سره وړود
		30-Nov-12	1-May-11	8صنفي	219698.00	90055.00	86233.00	129643.00	د کوز سلطان پورد بنونځى توسعه	S-SPL10-11	کوز سلطانپور	سره وړود
		30-Nov-12	1-May-11	20صنفي	29426.00		145133.00	149127.00	د بر سلطان پور د بنونځى توسعه	S-Spu01	بر سلطان پور	سره وړود

2.2.4 دامتحلی پروژو د لمړی او دوهم گروپ لپاره د حفظ او مراقبت سره مرسته

د NRRC د افغاني دکارکوونکو په واسطه د سرک او اوبه خور سیستم د تسهیلاتو د ساتنې او څارنې په اړه ضروري لارښوونې او ورکشاپونه د حفظ او مراقبت کمیټو ته په کلیو کې ورکړل شوي چې ددې ورکشاپونو په واسطه په نهیټ کې د ساتنې او څارنې عملي تگلاره هم جوړه شوه.

د ساتنې او څارنې لپاره د ورکشاپونو لیست

په 6.2.2 جنول د حفظ او مراقبت دورکشاپونه لیست

No	نیټه	نوع	مضمون	بنوونکی
1	2012/9/11	سرک	کلیوال	5 کلیوال
2	2012/9/12	سرک	حفظ او مراقبت	5 کلیوال
3	2012/9/13	سرک	حفظ او مراقبت	5 کلیوال
4	2012/9/13	اوبه خور سیستم	حفظ او مراقبت	7 کلیوال
5	2012/9/18	اوبه خور سیستم	حفظ او مراقبت	7 کلیوال
6	2012/9/25	سرک	د عمل کولو پلان	2 کلیوال
7	2012/9/26	سرک	د عمل کولو پلان	2 کلیوال
8	2012/9/26	اوبه خور سیستم	د عمل کولو پلان	1 کلیوال
9	2012/10/2	اوبه خور سیستم	د عمل کولو پلان	5 کلیوال
10	2012/10/3	اوبه خور سیستم	د عمل کولو پلان	8 کلیوال

د تعمیراتو د برخې د حفظ او مراقبت لارښوونډلې پوره تشریح سره DoE PGON, DoPH, او FGA ته په اپریل میاشت کې وړاندې شو.

2.2.5 دریم گروپ دامتحلی پروژو انتخاب او پلانون

د دریم گروپ یو لږ د کلیوالو په واسطه پلي کېدونکو دامتحلی پروژو ته څلگرې شوی دی، او یو لږ هغه پیرې ضروري پروژې انتخاب شوي چې تطبیق، د شخړو او اختلاف د حل د مخنیوي لپاره اړین وي. د دریم گروپ ازملینتې پروژو انتخاب او طرحه د لاندې ذکر شویو معیارونو پر بنیاد ترسره شوي.

په 7-2.2 جنول د کلیوالو په واسطه پلي کېدونکي دریم گروپ ازملینتې پروژو د انتخاب معیارونه

(1) د لومړي چلن معیارونه
- په لویه کچه توافق یا یووالی -
- کلیوالو ته منوازینه گټور تیا -
(2) دوهم چلن د حفاظت معیارونه
- د پروژې کل او بودیجه باید د 2013 کل تر ملچ میاشتې پورې تکمیل او مصرف شي.
- دا دامتحلی پروژې باید د جپلي متخصصینو بی له مستقیم څر څخه تطبیق شي
- د پیرته را ستندوونکو لپاره زیات مقیدیت ولري

د انتخاب شویو ازملینتې پروژو محتویات د غوښتنلیکونو په بڼه خلاصه او JICA ته د منظوري لپاره وړاندې شو.

د JICA تر نظارت لاندې ازملینتې پروژې د 2012 کل د جون د میاشتې په 18 نیټه د TWG او د 2012 کل د جون په 27 نیټه د PDC څخه منظوري شوي.

په 8.2.2 جنول دریم گروپ انتخاب شویو امتحالی پروژو لیست

ولسوالی	دکلی نوم	NO	د پروژي نمبر	د پروژي نوم	د پروژي نوع
بهسود	گردی کڅ	1	B-GK07	د سیند د غړی محافظتی دیوال جوړول	کلیوالی پروژي
		2	B-GK09	د څینلود او بود څاکنو جوړول	کلیوالی پروژي
		3	B-SM14	د شمر خیلو دکلی د ایلیری د سیستم ر غونه	کلیوالی پروژي
سره رود	چهل باغ	4	S-CB08	د پلي لارو او حوضونو دکول	کلیوالی پروژي
		5	S-CB13	د لوخی د ایلیری سیستم ر غونه	کلیوالی پروژي
		6	S-CB18	په چهل باغ کی د څاکنو جوړول	کلیوالی پروژي
	7	S-FA14	په فتح ابد کی د څاکنو جوړول	کلیوالی پروژي	
	8	S-SPL04	کوز سلطان پور کی د نوی سرک جوړول	کلیوالی پروژي	

2.2.6 د کلیوالو په واسطه پلي کیدونکو دریم گروپ ازملینتی پروژي

(1) تکمیلونکی اداري (لوري)

د دریم گروپ د امتحالی پروژو لیست د جلیکا او PDC د منظوری څخه ورسته NRRC د همکارۍ موسیسی سره د دریم گروپ د پروژو د تطبیق لپاره په 5 جولای 2012 کی قرارداد تر سره کړو کوم چه په 1-2.2.2 جنول کی بنودل شوی دی د سیستم د بهنروالی په خاطر تکمیلونکی لوری کوم چه په 1-2.2.2 کی ذکر شوی دی تشکیل شو.

(2) تریینگ پاروزنه

د روزمره کار په دوران کی تریینگ او روزنه کلیوالو ته ورکړل شوی ده د لازیتو ملوماتو لپاره د دې راپور 2.2.3.3 برخه وگورئ.

(3) تطبیق

د 2012 کل د جولای د میاشتی د پنځم تاریخ د قرارداد سره د دریم گروپ ازملینتی پروژي د FGA موسیسی لخواه پلي کړي لکه څرنگه چې د څلر د لار بنود په 9-2.1 نمبر جنول کی بنودل شوي.

د ازملینتی پروژو د تکمیل راپور به د FGA او NRRC د افغني کل کونکو لخواه د جلیکي متخصصینو تر څلر لاندې جوړېږي.

په 2.2 9 جنول ندریم گروپ امتحلی پروژو خلاصه

د پروژي د تسلمې نېټه	د شروع نېټه	د پروژي خلاصه	د پروژي قيمت په (USD)			د پروژي نوم	د پروژي نمبر	موقيت	
			مجموعه	کليوال	NRRC			کلي	ولسوالي
10-Jan-13	10-Sep-12	350 متره ديوال	128,119	3,078	125,041	د سيند د غړي محفظتي ديوال	B-GK07	گردي کڅ	بهسود
10-Jan-13	13-Sep-12	42 څاگلي	168,866	575	168,291	د څنبلود او بود څاگنو جوړول	B-GK09	گردي کڅ	بهسود
7-Jan-13	14-Sep-12	355 متره کنلر غونه	51,338	1,496	49,482	د شم خيلو د کلي د ايلري د سيستم غونه	B-SM14	شم خيل	بهسود
28-Jan-13	06-Sep-12	2.1km بيلدرونه پنځه حوضونو ډکول او 190 متره استنلدي ديوال	159,442	4,270	155,172	د پلي لارو او حوضونو ډکول	S-CB08	چهار باغ	سره رود
28-Jan-13	09-Sep-12	765 متره کنلر غونه	43,527	1,718	41,809	د لوخي د ايلري سيستم غونه	S-CB13	چهار باغ	سره رود
9-Jan-13	16-Sep-12	22 څاگنو جوړول	86,174	301	85,872	په چهار باغ کي د څاگنو جوړول	S-CB18	چهار باغ	سره رود
14-Jan-13	12-Sep-12	20 څاگنو جوړول	91,140	274	90,866	په فتح اباد کي د څاگانو جوړول	S-FA14	فتح اباد	سره رود
7-Jan-13	03-Sep-12	390 متره نوي سرک او 338 متره استنلدي ديوال	94,520	1,793	92,727	کوز سلطان پور کي د نوي سرک جوړول	S-SPL04	کوز سلطانپور	سره رود

2.2.7 دریم گروپ امتحلی پروژو حفظ او مراقبت سره مرسته کول-

- د سرک او ایلی د پروژو ورکشپ دریم گروپ از ملینتی پروژو لپاره د تطبیق وړ دی د زیاتو ملوماتو لپاره 2.2.4 شملي ته مراجعه وکړئ.
- د ځانگو د حفظ او مراقبت لپاره یو تعداد کسانو ته تر ټینګ ورکړل شوی چې د هر کلی څخه یو یو تن د حفظ او مراقبت لپاره مسؤلین ټکل شوي او د هرې څاه د تر میم لپاره بیا دوه تنه د هغوی لخوا د تر ټینګ څخه وروسته ټکل شوي دي.

2.2.8 د GA د پروژې انتخاب او طرحه "د NRRC نور فعالیتونه"

د از ملینتی پروژو د تطبیق تر څنګ د لومړي پړاو د پروژو د تجزیو په اسلېس د GA د پروژې انتخاب او طرحه د NRRC د فعالیتونو د جملې څخه دي.

چې نور ملومات یې د افغانستان اسلامي جمهوریت د تنګر هر ولایت د کلیوالي زیر بنلی پروژو د بیارغونې د ابتلایې سروې په نهلی رپور کې لیدلای شئ.

2.2.9 د لارښودونو تقسیم او کره کول

2.2.9.1 د ځل د لارښود کره کول:

د امتحلی پروژو د تطبیق او تجزی په اسلېس د لومړي پړاو د پروژو د ځل لارښود خصوصاً د (IDLG) د کار کونکو د تر ټینګ په برخې کره کول، د کلیوالي په واسطه تطبیق وړونکو پروژو د ځل لارښود د قرار دانیو په واسطه تطبیق وړونکو پروژو د ځل د لارښود څخه جلا کړای شو.
کره شوي نقلیې په لاندې ډول دي:

(1) عمومی:

- د تطبیق لپاره نوی ساختل پشهاد شو.
- د کل د اجزاو محدودول په بیرو عمده او مهم جز کې.
- داکره شوی لارښود کولای شي چې د ځل لپاره د یو څلرګر سند په توګه وکارول شي.
- یو لږ لیکل شوي عمده برخې څخه د کلي لارښود په توګه کار اخستلای شي.

(2) قراردادی برخه:

به 10-2.2 جنول د کليوالو په واسطه د تطبيقوونکو پروژو د ځل د لارښود جوړښت.

عنوان	لومړی توک	کره شوی توک
1قهره: عمومیت	دنظرات د لارښود هدف او پس منظر	د ټکل شویو کاري برخو محدودول
2قهره: دنده او مسولیتونه	دامتخلی پروژو په تطبیق کې دندیکه لور و دندی	د نوی پلان جوړول انجنیران بیلد مشوریت وکړي نه همکاره موسسه
3قهره: د کیفیت کنترول	کیفیت د کنترول عمومی برخي. د کیفیت کنترول عمده نقط شرایط او قسمونه: (1) موقت کارونه (2) احطی دیوالونه (3) کیندن کاري او بکول (4) فیر ریزی کارونه (5) کنکریټ کاري (6) تعمیر کارونه	<ul style="list-style-type: none"> غیر دکلر د عمده او مهمو برخو څخه سله کول د کیفیت کنترول مهمو موادو تشریح کول (مخلوطول، حقیقی اندازه، اوبه ورکول او CBR او PI تستونه
4قهره: د تقسیم اوقت کنترول	BOQ، گراف، د عکسونو کنترول	سله کول
5قهره: مصونیت	د میاشتی کار د پرمختگ نظرات د راپور په شکل	په نمونه کې دي بیلد بیړنی پیښی شبکه علاوه شی
6قهره: میاشتی کاري راپور	د میاشتی کار د پرمختگ نظرات د راپور په شکل	نمونه یې کره شوی ده
7قهره: امتخلی پروژي د تکمیلو راپور	دامتخلی پروژي د تکمیلو د راپور په بڼه	نمونه یې کره شوی ده
8قهره: اخیری کته	د اخیری کتی محتویات یا قانع کونکی وی	حذف شوي
9قهره: د پروژي د پیسو جریان	د بودیجی دور کړی مهل ویش	حذف شوي

(3) د کلیوالو په واسطه پلي کیوونکي نوعه:

به 11-2.2 جنول د کليوالو په واسطه پلي کیوونکي نوعي د نظرات د جوړښت لارښود

تزه بک شوی گڼه	لومړی توک	کره شوی توک
1قهره: عمومیت	د پس منظر منول د پس منظر پلانول	تعیین شوی کار او (محدویت)
2قهره: دنده او مسولیتونه	د ځل د لارښود موخي د امتخلی پروژو د تطبیق په برخه کې	د نوی پلان جوړول انجنیران بیلد مشوریت وکړي نه همکاره موسسه
3قهره: د کیفیت کنترول	کیفیت د کنترول عمومی برخي. د کیفیت کنترول عمده نقط شرایط او قسمونه: (1) موقت کارونه (2) احطی دیوالونه (3) کیندن کاري او بکول (4) فیر ریزی کارونه (5) کنکریټ کاري (6) تعمیر کارونه	<ul style="list-style-type: none"> غیر دکلر د عمده او مهمو برخو څخه سله کول چې کلیوال په اسلی وریاندې پوه شي
4قهره: د تقسیم اوقت کنترول	گراف، عکسونو کنترول BOQ	حذف شوي
5قهره: مصونول	د میاشتی کار د پرمختگ نظرات د راپور په شکل	حذف شوي
6قهره: میاشتی پرمختگ کاري راپور	د میاشتی کار د پرمختگ نظرات د راپور په شکل	نمونه کره شوي
7قهره: د امتخلی پروژي د تکمیلو راپور	دامتخلی پروژي د تکمیلو د راپور په بڼه	نمونه یې کره شوی ده
8قهره: اخیری کته	د اخیری کتی محتویات	حذف شوي
9قهره: د پروژي د پیسو جریان	د بودیجی دور کړی مهل ویش	حذف شوي

2.2.9.2 د تطبیق د لارښود کره کول:

د تطبیق کوم لارښود چې د فرعي پروژو د تطبیق لپاره په لومړي پړاو کې جوړ شوی وو د ازملینتي فرعي پروژو د تطبیق څخه په لاس راغلو تجربو په واسطه مرحلوار ډول نظر ثانی او کره کړل شو، چې تفصیلی مالومات یې د لومړي پړاو په جوړ شوي تطبیقي لارښود کې کتلا شوی، ځکه چې دغه لارښود د NRRC پروژو د بڼه او اسل تطبیق په منظور جوړ شوی و.

په هر تر تيب نوی کره شوی لار بنود تر پخوا علم فهمه او جمع دی ځکه چې ددغه لار بنود محتویاتو څخه په راتلونکي کې د کليوالي زیربني پروژو څخه د يوې منبع او لار بنود په توگه گټه واخستل شي.

دغه لار بنود په اينده کې يو رهنما او د ټولني نورو پروژو لپاره يو نمونه ده.

په 2.2-12 جدول د تطبيق د لار بنود جوړښت

محتويات	څپرکي (فصل)
پس منظر، اجتماعي جوړښت د پروژو ټولونه د اجتماعي انديښنو بررسي، د پروژي د ترتيب او تطبيق لپاره امله گي	1- پېژنگلوی (سربخه)
پس منظر، د انتخاب مرحله د تسهيل برابرونکي همکار (ايف پي)	2- تسهيلات برابرونکي يا (حمليوي همکار)
د همکاري موسسي عمومي مسيلو لار بنود/ تعينول او اساسات/ د کلي درهبري شورا بنده او مسوليتونه	3- د ساختمان د تشکيل او د نظر موافقه د نظرونو د يو والي جوړښت
د پروژي د انتخاب مرحلې توجه يا ملاحظت، د انتخاب (شرایط).	4- د پروژو انتخاب
سروي پلانول، منظوري، تفصيلي طرحه (بیزاین) د تطبيق لپاره ترتيب جوړول.	5- د پروژو طرحه (بیزاین)
د قرار داد ټول، د قرار دادی انتخاب د نرخ ورکول مراحل.	6- د قرار دادی پروژو داوطلبی
تهیه مرحله د تمویل کولو، ملی او محاسبه مور د بودیجې انتقال د بودیجې اجراء، تهیه او خریداري.	7- د کيلو او په واسطه تطبيقونو کې پروژو ملي مسيل او حساب
هدف، بڼه، آماره، طرحه ريزی (بودیجه)	8- څارنه او سلنه.

2.2.9.3 درهنما لار بنودونو تشریح او تقسیمول

لار بنودونه ټول مربوطه لورو ته له پوره تشریح وروسته تقسیم شوي، د کيلو او لپاره د سلتي او څارني لار بنود په پښتو ژبه تر جمه او دور کښلونو له لارې تر پوره تشریح وروسته ورکړل شو تر څو د جوړو شويو پروژو د سلتي او څارني په برخه کې ورڅخه گټه واخلي.

په 2.2-13 جدول د لار بنودونو د تقسیمولو لیست

تطبيق	د قرار دادینو په واسطه پلي کیدونکو پروژو څارنه	د کيلو او په واسطه پلي کیدونکو پروژو څارنه	
	20-02-2013		د ننگرهار ولايتي اداره
	19-02-2013		انگنلاف دهلت
	21-02-2013		پوهني ريلست
	18-02-2013		علمي روغتيا ريلست
	21-02-2013		(FGA)
ضرور ندی	ضرور ندی	23~28-02-2013	ټولنه

2.2.10 د امتحني پروژو ارزيبی

د هرې امتحني پروژي د ارزونې لپاره اعلي نمبري 3 او لڼا نمبره 1 په نظر کې نيول شوي ده. او د ارزونې معيارونه يې عبارت دي له مهمل ویش سره سم پلي توب، پورتوب، کيفيت، د حکومت د پالیسي سره سمون، دقت، موثريت او موثريت، په محيط تاثیر او د پلښت چانس چې ددې ارزيبی ځکه د NRRC د متخصصينو د پلي اخوا تهيې او د ننگرهار ولايتي ادارې او مربوطه رياستونو ته د هغوی د نظر اخستلو په منظور ورکړل شو چې د ارزيبی نهلی نتیجه د هغوی د نظرونو سره په 14-2.2 جدول کې بنودل شويده

2.2.11 د قرار دایلو په واسطه تطبیق شویو نویم گروپ از ملینتی پروژو دورتنی یا تضمین څخه وروستی لیدنه:

په جوړه شوي پروژو کې د جوړیدو تضمین نوري د ختمیدو وروسته دورتنی یا ضمانت موده پوره کېږي او NRRRC, PGoN او FGA د مربوطه ریسټونو سره (معرف صحت علمه، او نکلېو او بیار غونډی ریسټ) سره د پروژې څخه نهیلې لیننه کوی که د پروژې د تضمین په موده کوم نواقص رامنځته شوی وی نو د نهیلې لیست د پروژې نه د لیننی په اسلس قرار دای ته ورکول کېږي چې د اصلاح او او جوړیدو تر اطمینان وروسته د قرار دای مسؤلیت د خلاصیدو سند او پټی 10% فیصده پیسې قرار دای ته ورکول کېږي او که کوم نواقص یی نه درلودل نو نو قرار دای ته د مسؤلیت د خلاصیدو سند او پټی 10% پیسې ورته ورکول کېږی.

د زیلو ملوماتو لپاره 2.2-5 جدول ته مراجعه وکړی.

2.2.12 د آخری راپور جوړول.

د نهیلې راپور د لومړی او نویم پیر او د فعالیتونو د راجمع کولو دي کوم چې له مخکې نه تهبه شوي دي.

2.3 د قرار داد په دوران کې ټول تر سره شوي فعالیتونه

2.3.1 په متناوم شکل د امنیتي حالاتو سروی

د امنیتي شرایطو، واقعاتو، شخړو او اجتماعي مسایلو په اړه مالومات د ننګرهار په کچه د FGA او انټر نیټ څخه په دوام دار شکل راټول او تر نیټ او په جلیلي ژبه له پوره کیدا وروسته JICA ته تسلیم شوي.

2.3.2 د معلوماتو شریکول مجلسونه د پروژې د همغږی غونډه کی.

د امتحالی پروژو د پرمختګ د مالوماتو د شریکولو مجلسونه د مربوطه ادارو سره د NRRRC د افغلی کل کورنکو لخوا تر سره شوي. ځکه چې د NRRRC د جلیلي کل منداتو سفرونه 2011 م کل د ملچ د میلنټي څخه وروسته ممنوعه اعلان شوي. نو د همدغه علت په اسلس د پروژې د همغږی غونډې یو اځي دوه ځل شوي، چې تفصیلی یی په 2.3-1m نمبر جدول کې ګتلاي شی.

په 1-2.3 جدول د پروژې د همغږی غونډې تفصیلاتو جدول

نومره	اوله	تاریخ	موقیعت	ګتون وال
12 فبروری 2013	09 نومبر 2010		سرینا هوټل	د ننګرهار ولایتی لاره
محلی ارګونو رییس سادات، ولسوال دولسوالیو څخه ولسوالان، مربوطه وزارتونه، مهاجرینو، انکشاف د هات، معرف صحت علمه بیونی سیلر	د ننګرهار والی، د ننګرهار ولایت معلون، ولسوالان، محلی ارګونو ادارې څخه محترم سادات، او مربوطه ریسټونو رییس صاحبان: (معرف صحت علمه، کنل ریسټ، مهاجرینو ریسټ، ایپاری ریسټ ادارې استازی او UNHCR	همکاران		
محترم ملیټی، د وروستی ارزیبی ټیم څخه (محترمه میزکی او محترم بوسلدا او محترم هاشیمتو	محترم پوشینا	جلیکا		
• د پروژو د لاسته راوړنی راپور • د منځنی ارزیبی د لاسته راوړلو د منظوری راپور	• کلری پلان منظوری • دول گروپ د امتحالی پروژو د لیست منظوری • د پروژو د پرمختګ راپور	هدف (مقصد)		

3. د پروژو ډی کولو پر مهال اورینل، زده کړه او تنګونی

3.1 په تنګر هر ولایت کې د شخړو مخنیوي او امنیتي حالاتو مطالعه کول:

امنیتي وضعه په افغانستان کې ثابت نلري، نو تنګر هر ولایت په امنیتي لحاظ یو نامنه او خطرناک ولایت دي، ځکه دولت مخالفین پدې ولایت کې فعالیت کوي. نو پدې اسلحې سپارښتنه کېږي چې امنیت په اړه ټول ممکنه تدابیر لکه د مطبوعي وضعې خپرول د امنیتي حالاتو په اړوند د ملوملو راتولول او داسې نور.

(1) د مختلفو ساحو نه د ملوملو راتولول

دا معلومات یوځای د امنیتي وضعې په باره کې نه بلکه د تنګر هر د اساسي معلومات، د ټولني موجوده، اقتصادي، سیاسي، سلختمنی وضع، د مهاجرونو حالت، د تنګر هر، کابل او پاکستان روابط، بهرنیو ځواکونو فعالیت، د شخړو عوامل او د مطبوعي زورواکونو په اړوند راتول شوی

(2) د ملوملو د راتولو طریقې

دا معلومات په عمومي او علمي شکل راتول شوی دی، ترڅو خلک د پروژې په اړه بلورې شې د شخصي او فضولو پوښتونو صرف نظر شوی. خلص او ځنګرې معلومات د علمو خلکو نه خوندي ساتل شوی. ددی نه علاوه د پروژې د فعالیتونو د خوندي ساتلو په خاطر امنیتي حالات په ورځني، هفتوار، میاشتني او په بهرني خلت کې په برني شکل جمع شوی

(3) د پروژې د همکارانو سره د ملوملو شریکول

په تنګر هر ولایت کې امنیتي حالات، د شخړو مخنیوي، د ولایتي چارواکو معلومات، د کلیو مطالعه، د نورو تمویلونکو او پروژو، د مهاجرو او بی ځایه شو حالاتو او داسې نور په نظر کې نیولو سره د پروژو فعالیتونو ته پاملرنه شوی.

په ساحه کې د پروژې د فعالیتونو د خوندي ساتلو لپاره د پروژې کارکوونکي نکر شوی پاملرنې مدنظر ونسی

د 2011 کل جون څخه ورسته چې د پروژې د خراجي کار مندانو جلال ابلانته په سفر محدودیت وضع شوو د پروژې په اړوند د FGA او NRRC داخلي کار مندانو مصونیت په منظور د تنګر هر ولایت په موخه شوی دوه ولسوالیو کې اجتماعي او امنیتي ملوملو راتولو څپړلو او تر ټیولو څخه ورسته د امنیتي خطر او د کمښت په خاطر د هدایتو په شکل د پروژې د داخلي کار مندانو او FGA ته هدایت کیده.

(4) په ساحه کې د امنیتي حالاتو اندازه گیری

ساحي ته د تللو په خاطر د جیکاد د دفتر اجازه ضروري وه، ددی نه علاوه د ورځني د امنیتي حالاتو د ملومولو نه وروسته د گرزنده ستونزو سر یوځای د کلی نه لیننه کیده. ساحي ته د تللو لپاره معمولاً د ورځني لس بجي ځکه ددی نه وختي د پلچکونو لاندې د شپي د خوانه د نصب شوی ملینونو ویره او د تیري د څپړیو نه د مخه د دفتر ته راستنیدو، ځکه چې د مېنډم د تیري د څپړیو وروسته دولت د مخالفینو د ویره احساسید. د مفاهمي او خبرو اترو لپاره گرزنده او سللايېټ تلفونو څخه استفاده کیده. د ضرورت په اسلحې هغه کلی چې د هغه نه د خراجي کارکوونکو کتنه ضروري وه د امنیتي وضعې د ملومولو نه وروسته د کلیو او سره یوځای د نږدې نه لیننه کوله.

د مارچ 2011 نه وروسته FGA او داخلي کارکوونو په انتخاب شوی کلیو کې د پروژې فعالیتونه تطبیقول. د چاپاټیو اړونده وگړو دوی ته سپارښتنه وکړه چې گرجا پیره حالاتو ته ځای په پاملرنه وکړي، د نظمي لښکرو او د بار اړونکو موټرونو سره نږدې د سفر کولو او همدارنگه په ساحه د گوشه او ځنټه گرجا څپلو نه چې د اختطاف باعث گزري خوداري وشي.

(5) مطبوعي وضعې ته پاملرنه:

د امکان تر حده بليد د ولایتي اداري او خلکو تر منځ په خبرو اترو او ارتباط تمرکزک، تر پوښښ لاندې کلیو کې د ستونزو او منازعتو پیداکول او درک کول او همدارنگه بليد د ازملینتي پروژو په انتخاب او تطبیق کې د کلیو او نظرونو او بحثونه په پوره پاملرنه کول.

(6) د کلیو او اړونده ادارو سره همپاڼي:

د امتحانی پروژو د تطبیق په جریان کې د میثشتیو امنیتي مجلسونو له لارې د اعتماد او همکارۍ اعتماد فضا را منځ ته کړه. ټولنی د ډایمن او خوندي مالحو طرفدار او د خپلواکۍ احساس یې کوونکی لپاره چې د امتحانی پروژو د انتخاب او تطبیق په سلسله کې د شخړو او د منفی اغیزو مخنیوی وشي چېکا NRRC د ولایتی چارواکو او اړونده ادارو سره معلومات شریک کړل. کله چې به مشکلات پېښیدل نو حکومتی چارواکو به یې د NRRC سره په حلولو کې مرسته کوله.

(7) په اضطراری حالت کې رابطه:

د اضطراری حالت په صورت کې د توکیو او کابل تر منځ ارتباط او د قراردادی پروژو د اضطراری حالت په صورت کې د جلیکا، کی ای آی توکیو، FGA، NRRC او قراردادیو سره د معلوماتو په شریکولو تئید شوی وه

3.2 په یوولسو کلیو کې ټولنیزه سروی:

(1) د پوښتیوونکو انتخاب

ددی په خاطر چې معلومات درست او صحیح راټول شي، په هره شورا کې درې کسان چې عبرت له د شورا ریس، د ځلی اوسیدونکو څخه هغه سپینږی چې د ډیر وخت راهسې په ټولنه کې ژوند کوي او دریم د مهاجر و د کورنیو مشر انتخاب شول. څرنګه چې د شورا دریس معلومات د نورو په نسبت درست وه نو په اجتماعي پلټنو همد معلومات په کل و اچول شو.

(a) د CDC مشر

(b) یو نفر د فامیل مشر څوک چې د اوریدی مودی راهسې په همدی کلی اوسیدوی

(c) یو د فامیل مشر چې تازه راګرځیدلی وی د مهاجرت نه

دغه سیستم ته ویل کېږی یو درې اړخیزه عمومی منسب سیستم په هر صورت د نیتی درستی د CDC لخوا نه بهتر دی لپاره چې د ټولنیزې پلټنې نیتیه هم بیلید د CDC لخوا نه وینودل شي همدارنگه که چېرته د مرکي معلومات بلوری نه وی نو د ضروری ده چې مرکه محوده شي

(2) د درستیو کچه:

د پروژې د جلیکې کارکوونکو زیت تاکید او نکلیو څخه بل بل د ملوماتو راټول ول هغه عوامل وو چې راټول شوي ارقام او ملومات زیت دقیق کړي لکه د نفوس شمیر او مساحت. د مرکه کیوونکو څخه د تکراري پوښتنو د شکلیت سره سره د محلي حالاتو د مطالعې د مقصد په نظر کې نیولو سره خصوصاً د افغاستن په څیر یو هیواد کې د استونزمنه ده چې ډیر دقیق ملومات راټول کړو، نو دا ضروري ده چې حقیقت ته په نږدی کیلو معیار ونه پیدا شي.

(3) د پلټنې اسباب یا سمل

د ملوماتو راټولول د کلي ټولنیز جوړښت تر پوښن لاندې نیسي که څه هم دغه ټولنیز جوړښت په CDC شورا کې دننه هم وي لکه: قبیله، فرعي کلی او د نوق اختلاف، که څه هم د موثر بیت فکتورونه او تحلیلي افدې د BCDCs دي که څه هم د ملوماتو انتقال د شورا اکتو دننه په وخت او قیمت تر سره کېږي.

3.3 د ساختن چارو مطالعه او یقیني کول:

(1) د جمعی معلوماتو منبع:

د جمعی معلوماتو د منبع تصدیق د سروی کیفیت تقویه کوي.

(2) ښه سابقه لرونکو قرار دلایلو لیست

چې دښه سلېقه لوونکو قرار دادونو لپاره په زېږونو کې وپلټل شي په هر حل کې په لېست کې د جمع شويو قرار دادونو سلېقه هم ښه نه وي. خو د لاسفېت او سلمې سيلې په خاطر د علم رسنيو له لارې د قرار دادونو د درجه بندۍ لپاره اعلان ت ضروري دي تيره ورتيا هم ډير ضروري ده ځکه کوم معلومت چې سرکونو لخوا شراکتونو په ورکړ شوي اسنادو کې وي ټول په ټوله صحيح نه وي .

(3) انجنيرونو سره مستقيمي خبرې:

انجنيرونو سره مستقيمه مرکه ددې لپاره تر سره شي تر څو د هغوی ضرفيت، کيفيت دکنترول او څارنې په برخه کې تاييد او يقيني شي. د هغوی سره د مرکې په نتيجه کې د خراجي مرسته کونکو ادارو او بين المللي ادارو په منځ کې کوم يو يې د کيفيت په کنترول او څارنه کې ښه پوه لري. ځکه چې زيات انجنيرون په انگرېزي خبرې کولای شي دغه لاسته راوړنې نکړی چوکټ دامتحنې پروژو د تطبيق، څار او روزنې په برخه کې مدنظر نيول او داستعمل وړدی دغه لاسته راوړنې کړی چوکټ دامتحنې پروژو د تطبيق، څار او روزنې په برخه کې مدنظر نيول او داستعمل وړدی

(4) د حقيقي قرار داد اسناد:

د حقيقي قرار داد اسناد بايد شريک شي، د افغانستان لپاره بايد قرار داد ډير سله ډول څخه کړ واخستل شي. او د جمع قرار دادونو اسناد ډير کم پيدا کيږي دېلى خوا د قرار دادونو اسناد په په انگليسي د عمده شرايطو او مسيلو په شمول تپيه شوی دی نو پدې اسلس بايد ياداور شي چې که دمطی قرار دادونو سره قرار داد په انگليسي ژبه وشي.

(5) د سلختمن دسلي څخه ايښه:

د سلختمن له سله څخه ددقر له خوا په علي سطحه د کيفيت دکنترول او څارنه موجه نده، ځکه چې د سلختمونو دغه په شخصي سکتور پورې اړه لري نو پدې اسلس د کيفيت دکنترول او څارنې کچه د سلختمن دسلسو څخه ډير لږه تر سترگو کيږي دڅار په برخه کې ضروري اولازمی ظرفيت لوړوالی يقيني کړل شوی دی .

3.4 د کلي په کچه د نظر د يووالي جوړښت را منځته کول:

(1) ددې لپاره چې د هرې CDC نظرونه د کلي په سطحه منعکس شي نو NRRC دغه شرايط وړاندې کړي، چې لږ تر لږه د هرې CDC څخه بايد يو استازي په BCDC کې موجود وي.

(2) نو پدې اسلس د نورم له مخې NRRC له هرې CDC څخه دوه استازي د نوموړي CDC د غړو په انتخاب سره د BCDC نه معرفي کړي دي.

(3) او کله چې هغوی خپل استازي BCDC ته ور وپيژندل نو دا د يو سند په ډول وليکل شول که څه هم ددغو مرحلو دطی کولو اسناد نه مو جوړ ديت يوه خلا ده. نو پدې اسلس داسنلو جوړولو او سلوروزنه د نظر يووالی او قوی کولو په ورکښل کې د NRRC او همکارۍ موسيسی اجتماعي کار منداتو ته ورکړل شوو چې په توجه کې ددوهم پړاو ډيروژي دتعيين او پلان په وخت کې د مجلس د فيصلو او مباحثو مسووده تر نتيب او په ډيره اسلی سره شريکه او يقيني کړی شوه.

(4) که څه هم دغه اسناد کيداشي چې د مختلفو خواو د مشخص کيدو د لپاره د معيلونو په شکل وکړول شي لکه: د ظرفيت کچه او د نورو ادارو سره تړاو. دا ملومات کولای شي د راتلونکو مسيلو په حل کې مرسته وکړي. او په اينده کې د هغوی د ظرفيت کچه لوړه کړي. د BCDC له جوړولو څخه وروسته د BCDC غړو د خپلو فعاليتونو په مقابل کې د NRRC څخه د امتياز غوښتنه وکړه. د NRRC خراجي همکارانو لخوا ورته په ځواب کې ددې ادارې طبيعي جوړښت په اړه ملومات ورکړل شول او د NRRC د افغلي همکارانو او FGA څخه غوښتنه وشوه چې خلک پدې وپوهوي چې مونږ غواړو چې تاسو بايد يې له خراجي مرستو او مرسته کونکو څخه په خپلو پښو وډيرئ.

(5) د کليو او حکومت د بنو اړيکو د را منځته کولو رول د BCDC په را منځته کولو کې شته دا چې په افغانستان کې د ولسواليو شورا گانو د جوړيدلو پلان شته دی خو تر اوسه ندي عملي شوي نو د NRRC لخوا د BCDC جوړښت ډير موهم دي چې BCDC د اداري مسيلو نه علاوه د کليو د امنيت او د کليو اړيکي د دولت او خبريه ټولنو سره پراخه کړي.

3.5 دزملینتې پروژو غوره کول او پلانون:

(1) دگټې اخستونکو تر منځ مسلوات

په حکومت کې د شته ستونزو په اسلېس لازم وگڼل شوه چې ددغه ستونزو د حل په خاطر د گټه اخستونکو ستونزې د لاندې دلایلو په اسلېس یو حل بیا یقیني کړو.

- په ځینو ساحو کې د ملي پیستون لخوا CDC ندې جوړې شوي
- ځینې په هیڅ کوم کلي کې ندې شلمې
- د په نښه کليو نا څرگند حدودات.

نو د پورته ستونزو د حل په منظور د ذکر شویو پټې خلکو سره هم مرکې تر سره شوي.

(2) د ځمکې وپول:

که چېرې د یو بنوونځي ودانې نوې جوړېږي نو د ځمکې وقف کولو ته اړتیا لري په هر حل د ځمکې وقف په اسلېس سره نه تر سره کېږي ځکه چې په دې ساحو کې د ځمکو ارزښت ډیر لوړ دی په زیاتو حالاتو کې د ځمکې وقف ممکن نه وي خو بیا هم د میرانو کلي خلکو د کلیو او څخه پیسې راتولې کړې چې ځمکه تر لاسه کړي خو دا بیلد و منو چې د ځمکې برابرو ل داسې پروژو لپاره یو معضله ده بیلد ځان توجه ورته وشی چه مشکل سبب جوړ نشی.

(3) د کپوالو کمپ:

د حکومت د پلیسې له مخې دولت د کمپ په ساحه کې د کپوالو د بنوونځي لپاره د نوي سلختمن منظوري ور نکړه

د محلی حکومت په وینا کمپ یو موقی هستوگنځای دی او دا بیلد په راتلونکې کې وران شي. بامتحلی پروژې مقصد او تاثیر که څه هم مهم دی لیکن حکومت پلیسې هم بیلد تعقیب شی نو پدې اسلېس نظرونو یوالی په یوه پروژه باندې بیلد حکومت او کلیو لور تر منځ په ډیره شریکه فضلی حل اوفصل شی

3.6 دزملینتې پروژې پلي کول

3.6.1 د کلیو لوالو په واسطه پلي کېدونکو پروژو پلي کول:

(1) محلسوي لار بنود:

د کلیوالي هر اړخیزه پروژې (IRDP) لخوا پلي شوی د لازیت شفاییت په خاطر ور څخه د NRRC په پروژو کې گټه واخستل شوه

(2) ډیروژي د تگلاری په تطبیق خلکو موافقه

د کلیوالو په واسطه پلي کېدونکو پروژو لپاره د ملي پیوستون د پروژو د تطبیق طریقه د خلکو په ذهنونو کې پوره دننه شوې د ملي پیوستون پروگرام د CDC څخه غوښتنه کوي چې د پروژې د بودیجې د انتقال لپاره د CDC په نوم یو بلکي حساب پرانیزي. په داسې حل کې چې دا پروژو د FP څخه د بودیجې د سلتي غوښتنه کوي پداسې حل کې چې مونږ دا سستم څو ځله پخوا له دې چې پروژو پیل شي تشریح کړی دی، خو تر اوسه هم زیات خلک مونږ ته ددې سستم په اړه شکلیتونه کوي، مونږ یې منو. مونږ بیلد دغه نوی سستم بلر کلیوالو ته تشریح کړو تر څو ټول خلک پوه شي.

(3) د کیفیت د کنترول په اړه بنوونې:

په لومړی گروپ پروژو کې د کیفیت کنترول په برخه کې د تطبیق کمیټې ته د NRRC او FGA لخوا لار بنوونې شوي که څه هم د پیچلو پروژو لپاره د کیفیت د کنترول عملي لار بنوونو ته ضرورت لیدل کېږي. د مغفور پروژو د تعیین او انتخاب څخه تر مخه بیلد دکلفی روزنی دور کړی امکنت بقی شی

(1) خريداري طريقه:

د جليکا د خريداري او قرار دادو نو د قنون په اسلس د سيلی اسناد بليد د سيلی کونکو په مخه کې خلاص شي که څه هم د سيلی دويم گټوونکي نوم او قيمت بليد څرگند شي. خو په حقيقت کې دغه کار د نيت قيمت گټوونکي قرار داي ته د دي چانس ورکوي چې دده د قيمت څخه پورته دويم گټوونکي قرار داي سره د سلس په صورت کې له قرار داد څخه استعفا او د کار څخه د هغه په گټه تير شي، نو د داسې مسيلو د مخنيوي په خاطر ملي تضمين بليد واخستل شي او د گټوونکي قرار داي قيمت او نوم بليد پټ وساتل شي که څه هم په داسې حل کې چې د ملي تضمين اخستل تر او سه په افغانتان کې مروج ندي.

(2) د BCDC دخپلول:

دا چې B-SR05 پروژو ته د طالبانو لخوا يو اخطار پاته ورسپه سر بيره پر دې چې د محلي حکومت په واسطه امنيت قري کړي نو د BCDC غړو د نږدې کليو له مشرانو سره ملومت شريک کړل او قرار داي يې پدې قنار کړ چې د پروژې کار ته د نوي په همکاري دوام ورکړي.

نو د ملوماتو د شريکولو په اهميت باندې د حکومت او کليو او سره د دغه مثال په ورکولو سره بڼه پو هيدلاي شو که څه هم کليوالی شورا BCDC د قرار داي پروژو په تطبيق او عملی کولو کې په ډير دخپل ندي خوراچې د کليوالی شورا د امنيت ساتلو او ځنی نور اجتماعي مشکلاتو په حل او فصل کې عمده رول لري نو بليد دهغوی سره هر وخت د معلوماتو د شريکولو او همکاري سيستم موجود دی

(3) د پروژې د موقعت بلوري كول:

د پروژې نيم د بنوونځي هغه سکیچ چې په هغې کې د بنوونځي ځای پر ځای کول بنودل شوي وو د تطبيق څخه مخکې د پوهني رياست څخه تايدي تر لاسه کړيو، خو کله چې قرار داي د کار د پيل په مرحله کې د پروژې ځای پر ځای کول د پوهني رياست څخه تاييدول، خو د پوهني رياست ډير ځله د پروژې د ځای او دويم ځلي طرحه کول ضروري گڼل. کله چې دغه تاييد تر لاسه شي نو پروژې د ځای حقيقي ايښه د پوهني لخوا ضروري ده .

(4) د قرار دايو ظرفيت:

دا ملومه شوه چې د قرار دايو کلي ظرفيت په افغانتان کې د سيلی په وخت کې د تسليم شويو اسنادو سره سمون نلري او دا هم د لومړي فيز په جريان حکي جوته شوه چې د نوي ظرفيت د شرکت کار پورې اړه نلري، بلکه د هغې کلي ظرفيت د هغې په ريس پورې اړه لري.

تول قرار دايين کولای شي چې بې له پيشکي پيسو څخه کار شروع کړي خو تاييد بليد په خپل وخت وشي.

چې په خپل وخت تاييد د قرار داد اعتماد جوړونه او د فعاليتونو په بله کې استتيلوي برابر وي دا هم جوته شوه چې د پروژې تطبيق بې له پيشکي پيسو څخه کوم مشکل ندي.

(5) د لويو څکلنو جوړونه:

څه بليد د هغه د ژوروالي او د هغه د نږدې څه د لويو د کيفيت په اسلس طرحه شي، زياتي څه گټي د ډيزاين موافق جوړېږي. که څه هم يوه څه چې د B-SR05 پروژه کې دخپل طرحه شوي ژوروالي په پوره کينو سره خوري او به ورنکړي؛ د توقو خلاف ځکه چې ملگيني لويو او د خوري ډيري ضعيفي طبقې سره مخلمخ شو.

د ډيزاين تغير او نور ضروري لوازم بليد د کار د پيل څخه مخکې په نظر کې ونيول شي.

(6) د قرار داد په منځ کې وقفه:

د چلپن د ملي کل د تغير په اسلس ځينې وخت د قرار داد په منځ کې له وقي څخه ناچلري وي، چې دا د پلان شوي کار د جوړښت په دوران کې د پلان شوي کار د بشپړولو او د تلوان د اړولو په برخه کې د ستونزو سبب گري.

نو د قرار داد له وقي څخه بليد په راتلونکي قرار دادونو کې مخنيوي وشي.

(7) د نقشې تغيروول:

داسې تنظيمونه چې د هغې په واسطه په لنډ وخت کې د خورې لاندې طبقې نسم والي (خراب کيفيت) ياد نظر بلون له امله ژر تر ژره د پلان سره سم د نقشې بلون رامنځته شي.

(8) د قروي څارنې له مخې د کيفيت او وخت بلورې کول:

د قروي څارنې له مخې د کيفيت او وخت بلورې راپور ترسره شوی او د راپور په توگه اړونو لارو ته ورسيد. دا د پوهيدو وړ ده چې قروي څارنه د قرار دادي او کليوالو له لوري پلي کيدوونکو پروژو ته توان ورکوي ترڅو کيفيت او مهلوبش په افغانستان کې يو شان وسلل شي.

3.7 د سلتي او څارنې په برخه کې مرسته کول:

د سلتي او څارنې غنوی ټولنه او ددوی د مراقبت طرز په لارښود کې د څارنې اوسلتي کميټيو او سيستم ته راجع دی. په هغه صورت کې چې د حفظ او مراقبت غنوی مقياس نه وي نو د نوي لگښت د مخنوی په خاطر د حفظ اهو مراقبت لارښود ترتيب او د محيطي اوبيا دهغه وسليلو يا سلما لاتو څخه استقله کول کوم چې په اسلي سره پيدا کېږي. د سرک د څارنې اوسلتي په خاطر ورکشپ کليوالو ته ورکړی شو ځکه د ننګر هل چارو کې او انکشاف دهلت د سرکونو د حفظ او مراقبت لپاره کافي بوديجه نه لري، څرنگه چې کليوال هم کافي بوديجه نلري دا هم شکمنه ده چې دوی د سرکونو مراقبت په منلبيه طريقه ترسره کړي. ددی اميدوار يو چې د ننګر هل چارو کې او انکشاف دهلت په راتلونکي کې د سرکونو د حفظ او مراقبت بل په خپلو اورو ولځي.

3.8 په بهسونو او سره رود ولسواليو کې د بېر مختلبي اړتياؤ سروی کول:

د دواړو ولسواليو په نښه شوی 11 کليو نفوس 80% په سروی کې شامل شوو او دنور وگليو د 3~2 ابتدايي معلومت په نظر کې ونيول شوو بيا په دواړو ولسواليو کې 227 محلي شور اگلي کومې چې ده ملي بيوستون لخوا جوري شويدي چې د دغو جملې څخه 67 محلي شور اگلي دان ارارسي دهغه لاندې کليو کې د يونين لاندې دی ځکه نو دهغه لاندې کلي د بېر مختگ د ضرورت د سروی لپاره انتخاب شوو چې د دواړو ولسواليو 2/3 تشکيلوي. او دان ممکن ده چې د اجتماعي سروی طرز العمل مطابق دی سروی ترسره شي.

، دا چې دانمه نشته چې پروژ به نورو سلحو ته وغزول شي نو پدې اسلس د سروی لايحه چې د کليوالو سره مستقيماً د تملس پر اسلس وه نظر نئي او تبديل شوه، او معلومت د اړوند ادارو او د مولو د جمع اوري له نويې منبع څخه راټول شول. سپيره پردي، که څه هم دا اسلسي ملوماتو راټولولو سروی د کليو په کچه د کليوالي اسلسي اړتيلو د جوړښت په اړتباطوه، خود علمه برخه اخستې د سروی طريقه پدې کې عملي نشوه. نو ددی لپاره چې په اينده کې د داسې پروژو د تطبيق لپاره د تخنيکي تفصيلي ملوماتو راټولو سره، سره د تواني علمه برخي اخستې طريقه بليد په نظر کې ونيول شي.

د په نښه شويو کليو د تعداد د تخمين فرق د افغانستان د محلي حکومتاري د کمزوري له امله دی. د کلي مشخص تعريف په واضع ډول معلوم ندي، نه دا چې بواخي د بېر مختگ د ضرورتونو د سروی په خاطر بلکې په ټولو برخو کې، په هر حل يوولس په نښه شوي کلي د امتحاني شکل د هغوی د حدوداتو له مخې معلوم شوي.

ددی لپاره چې د کلي باټولني بو مشخص تعريف واضح شي نو پدې اسلس پشنه لودو چې په راتلونکي پروژه کې د په نښه شوي سلحي پر لفظ تصميم ونيول شي.

د پروژې په ابتدا کې دلری نه څارنه ددی په خاطر په نظر کې نیول شوی وه چه زیاتې پروژې د تطبیق لپاره پلان شوی وی او د پروژو ولسی تیتي وی او څارځی متخصصینو ته د بعضو سلحو د امنیتي مشکلاتو په وجه د تلواجزه نه وه دلری نه د نظرات په پروسه کې د IRDP د تجرب له څخه استفاده شوی وه چه لاندنی کرنی د پروژې په پیل کې عملی شوی دی

(1) افغانی همکاران یی د بینه امله کړلو چه د اداره کولو یو داسی بنسټ جوړ کړی چه دهغی په واسطه د افغانی همکارانو د تسهیل کولو د موسسه او دواتی همکارانو د شروع نه تر پیلې پوری سلمه هماهنگی رامنځته کړی

(2) افغانی همکارانو ته د کیفیت د کنترول روزنه ورکړل شوه چه د نوموړو روزنی تمرکز چه د ګول تیګی د نصبول د کنکریټ مخلوط او د مسلای جوړول او د جغل کیفیت د تنازه کنکریټ د اوبو ورکولو میتود چه بیا ورسته افغانی همکارانو د همکارۍ موسیسی او قرار د ادیټو ته د کیفیت د څارنی روزنه په سلحه کې ورکړل شوه

(3) د IRDP د تجرب یو په اسلس د قرار د ادیټو درست نظرات او د میاشتی راپورنو تهیه او ترتیب ترسره شول چه د راپورنه په ګرندی ډول څارځی متخصصینو ته د لارښوونو او هدایتو ورکولو په خاطر تسلیم شول

(4) افغانی همکارانو او همکارۍ موسیسی ته د اتوصیه شوی وه چه کچیرته د پروژې په جریڼ کې کوم مشکلات د کنکریټ یا مصونیت په رابطه پیداشی یا کومه بهتروالی رامنځته شی نو څارځی متخصصین دی په جریڼ کې و اچول شی

(5) د قرار د ادیټو سره د بینه رابطه د ټینګولو په خاطر دی په خپل وخت د کنکریټ په اندازه دهغی د پیسو ورکول او همداراز د اضافی کار په مقابل کې د اضافی کار اجوره ورکول تر څو قرار د ادیټو په اسلی سره خپل کارونه ترسره کړی

(6) د څارنی لړی لکه د کیفیت او پرمختګ څارنه د تصویر اخستل او میاشتی راپور تهیه کول د مسوول اشخاصو څخه د پروژې پرمختګ معلومول خپل وخت باندی د قرار د ادیټو د پیسو د تادیه د قرار د ادیټو پوهلوی چه مونږ د څارځی متخصصینو د څارنی لاندی کار کوو

(7) د بنوونی او روزنی ریلست د څارونکو سره په ګډه څارنه ددی لامل شوو چه د پروژې پرمختګ او کیفیت د نښخه لورو سره شریک کړی د 2011 د فبروری د میاشتی څارځی متخصصینو د تللو څخه ورسته د کیفیت څارنی په برخه کې لاندی ملای و اضافه شوی

(1) په مسلسل ډول د کیفیت د څارنی روزنه په کابل کې ورکړل شوه

(2) د میاشتی راپور تر څنګ هفتوار راپور هم اضافه شوو چه د بهترو نظرونو په اسلس د پروژې د کیفیت د لاندی نه والی باعث شوو

(3) د پروژې عکسونه د کابل دفتر ته ورل کیدل او د څارځی متخصصینو لخوا به د کمپیوټر په واسطه عکسونه کتل کیدل او د کنکریټ د لاندی نه والی په خاطر به هدایت ورکول تر څو د پروژې کیفیت د لوس اور لاندی له پاره بهترو شی. او داسی سیستم رامنځته شوو چه دهغی له مخی د پروژې د بیره عکسونه کتل کیدل شی.

4. د پروژې هدف تر لاسه کول

4.1 د لومړي کاري جریڼ د نظرات هیئت:

چلیکابو هیئت د 2012 کل د فبروری له 5 می تر 8 نیټی د NRRC د پرمختګونو نظرات په هدف لپرلی وو. په افغانستان کې د اوسیدو پرمهال پریسی خوندي د تنګو هار ولایتی ادارې سره درلودلې، د پروژې پرمختګ څخه د پروژې د اینه د لارښوونو په خاطر د نظرات او د نظرونو تبادلې وکړه.

4.1.1 کاري پر مخکښ او د پروژې نور فعالیتونه

لاسته راوړنې	نتیجه
د ننګرهار ولایت په سره رود او بهسونو ولسوالیو کې راټول شوي پرومختیلي اړتیاوې.	1. د ننګرهار ولایت په سره رود او بهسونو ولسوالیو کې د موجوده حالتو او پرومختیلي اړتیاوې راټولولې.
د PGoN او BCDCs په واسطه د 36 ازماينتي پروژو لپاره د پلان جوړول.	2. د محلي شرکتونو سره په ګډه د ازماينتي پروژو غوره کول او د تطبیق پلان جوړول.
د داسې یو سیستم جوړول چې کلیوالي خلک د زیربینلي ساختماني چارو د تکمیلولو مهلت قوی	3. داسې سیستم ته پراختیا ورکول چې ځای هستوګن پدې وټوانډېري چې لومړني زیربینلي پروژې په خپله تطبیق کړي.
د داسې یو سیستم تقویه کول چې محلی قرار دانیانو په واسطه د زیربینلي ساختماني پروژو وچلری سر ته ورسېږی	4. داسې سیستم ته پراختیا ورکول چې ځای هستوګن پدې وټوانډېري چې لومړني زیربینلي پروژې په کلیوالي سطحه د قرار دانیانو په واسطه تطبیق کړي.
ځلی کلیو او د نترمیم او فعل سلتي سیستم جوړول	5. د نترمیم او فعل سلتي سیستم ته په کلیوالي کچه پر مخکښ ورکول.

له بله پلوه دواړه خواو د قبوله کړه چې لاندی چاری د پروژو د مقصدو لاس ته راوړلو لپاره ضروری دی.

- سی یو میکانیزم ایجاد چې هغه د امتحانی پروژو لپاره د کلیو او لخوا د استعمال وړوی.
- د عملی کیونکو لارو چارو د پښه لولو په اسلس حفظ او نگهداشت میکانیزم قوی کول.

دنا

4.1.2 د پروژې د نتیجې خپرول:

لکه څنګه چې پروژې پېشرفت بڼه او منسب وونو پدې اسلس دواړو لوری (د افغانستان حکومت او د جاپان دولت) عینی تطبیقی نمونه، راټلونکی نغدی مرستی په بڼه (GA) د پروژې د تطبیق لپاره کوم 2008م کل د لکتوبر میاشت غوښتل شوی د امکان تر حده پښه لولو دی.

4.2 دویم بکلی پر مخکښ نظرات هیئت:

د JICA یو هیئت د 26 سپتمبر څخه تر 1 د اکتوبر پورې د NRRC د کاري چوکیت په اړه د بحث لپاره د افغانستان د حکومتي ادارې سره په رابطه کې شو. دواړه لوري پدې موافق شول چې وروستی اصلي میاشت له 2015 د جولای څخه د 2013 جولای ته تغیر شوه. د 2012 په جون میاشت کې د لومړنیو څیړنو له مخې د نغدي مرستی لپاره د دې پروژې کاري وخت درې کلونو ته راانډ شو. په پای کې دواړه لوري په دې موافق شول چې وروستی ارزینلی د 2013 م کل په جنوری کې د پروژې د ابر یلیتوب د بیړی مني سره د جلیکا د ارزینلی د لار بنود سره سم تر سره شول.

4.3 وروستی ارزینلی:

د جلیکایو هیئت د وروستی ارزینلي په موخه د 2013 م کل له 10 فروری څخه تر 14 فروری پورې افغانستان ته راو لېږه چې ددی ارزینلی هدف د لوونو څو دا هیئت د پروژې د هدف لاس ته راوړنې کچه معلومه کړی او دهغه معلومتو او تجربو او د رسونو څخه په استفادی بی پروژې د تکمیل سپل بنسټه وکړی.

4.3.1 د ارزینلی نتیجه:

د پروژو ارزینلی د لاندې پنځه مشخصو په درلودلو سره چې په (1-4.3) جدول کې ښودل شوي دي.

د ارزینلی نتیجه:

په 4.3-1 جنول نارزېلی نتیجه

مشخصت	نتیجه	دلیل
پر خلیتوب	علی	1- د افغانستان د پالیسی سره سم پر خلیتوب. 2- د اړوند گروپ د اړتیاو سره سم پر خلیتوب. 3- د جیلان د مرستو د پالیسی سم پر خلیتوب. 4- د همکارژ ادارې، UNHCR ستراتیژۍ سره سم پر خلیتوب.
اغیز منتوب	علی	1- د پروژو سرته رسولو هدف یاد وړ کول دي
گنورتیا	متوسط	1- د اچې د پروژې موده له 5 کلونو 3 کلونو ته را لنډه شوه بنای د پروژې د نتیجې په تر لاسه کولو ډیر هڅه اغیزه ونلري. 2- په افغانستان کې د نا امنی له امله د جیلانې متخصصینو پاتې کیدل محدود شول چې تر یو وخت د متخصصین بر طرفه کیدل. 3- د IDLG د همکارانو تعداد د پروژې په نخلت کې محدود وو.
اغیزۍ	ښه	1- هلته یو ښه هیله شته چې ټول هدف به تر سره شي که چېرې PGO ن خپله دنده په ښه توگه پلان کړي تر څو د ولایت له لوري په کلیوالي کچه د سلختمې پر مخکښ یوه نمونه خپره شي. 2- د کلیوالو ته واک ورکول او دمحلې توانو پر مخکښ. 3- د نورو کوچنیو کلیوالي پروژو په پرتله د دې کیفیت لوړ وو. دا د جیلان ودانول وو.
نوام داری	ښه	1- دولت له لوري د کولو او ځلې هسټوگټو لپاره د ښه چلېر یل برابرو د دوی په پالیسی کې د لومړنیو یونو څخه دې په سیسې لحاظ به د پروژې دوامدار توب ډیر وخت لپاره یقیني شي. 2- د پروژې د مشخصاتو له مخې د BCDC جوړولو میکانیزم د کلیو د اتفاق او یوځای کولو لپاره و کلریو تر څو د کلیوالو د پر مخکښ په برخه کې اسانتیاوې را منځته شي او اسلې سلته به په کلیوالي کچه بلوري شي. 3- په عمومي توگه د پلي شویو از ماینټي پروژو د سلتي لپاره کومه ملي سر چینه وجود نلري. د از ماینټي پروژو له لومړي پور څخه د پروژو په اړه د اړوندو ادارو سره خبرې او مشورې شوي وې د سلتي او ځلني لپاره یو څه ځنګرې پیسې ولري چې پدې سره به د پروژو د سلتي او ځلني چلې بریلی او خوندي وي.

4.3.2 درس، زده کړه او سپل بنټی:

دا لاندې سپل بنټي، زده کړه او لارښوونې د ارزېلی ډلې له لوري ترتیب شوي دي.

سپل بنټي:
1- د پلي پلان شویو کارونو تکمیل - پروژې بیلد ډیره توجه د ښه وکړي چې د پروژې له تکمیل دمخه بیلد ټولې روانې امتحانې پروژې بشپړې کړي. - لارښوونه بیلد ژر تر ژره نهایی شي. - پروژې بیلد یقیني کړي چې د سلتي او ځلني د لارښود له مخې کلیوال جوړو شوی پروژو و حفظ او مراقبت تر سره کوي. 2- ډیر کوشش بیلدوشی چې د پروژې په واسطه جوړ شوی پر مختیلي لارښوونه بیلد ددی پروژې څخه ورسته هم په سم ډول د اسقلدی وروگرځي.
درسونه او زده کړی:
1- د بکټیینه کلیوالی زیربنايي پروژو لپاره متوام او قوی ځل او نظارت ضروری دی.

5. د عمومی هدف لاسته راوړنو سپارښتنې:

د ننګرهار په ولایت کې د دې پروژې د تعین شوو ساحو چارچپیره د عیناً پروژې د عمومی هدف د لاسته راوړلو لپاره د یو ضروری دی نویدی خاطر دلاندې پروژې د دې پروژې په تعقیب چې کله د تطبیق لپاره سپارښتنه کوو.

سپارښتنې

1. د محلی انجمنو (غیر دولتي موسسو) څخه استفاده کول یا کار اخستل د دې پروژې لپاره یو بین المللی موسسه استخدام شوی چې دغه لوی کار د نوي مخلص کیدونکو کاري او ايجو مطابق پور کړی داچې د بین المللی موسساتو د محدود دی نولازم ده چې د محلی غیر دولتي موسساتو څخه هم باید په راتلونکې پروژې کې د قیمت کموالي او د غیر دولتي موسسو د رښتو تقوی په منظور کار واخلستل شی.
2. د داخلی متخصصنو څخه استفاده بیکلر اخستل د انجمنو د قانون او نور لوی ايجو په اساس د FGA د یو ايجو په صفت به ونشي کولای چې د قرار د ادیو په واسطه پلي کیدونکې پروژې د کار څر نه تر سره کړی نویدی اساس باید داخلی متخصصین او مشورین باید د څارنې لپاره وگمارل شي ځکه چې د دې پروژې د تطبیق په جریان کې د هغوی ظرفیت هم ولیدل شي.
3. د محلی قرار د ادیو د کمال ی تعیین پدې پروژې کې د محدود قرار د ادیو ظرفیت سزای شوی خو په هر حل د نور محلی قرار د ادیو د نامعلوم ظرفیت په اساس روزنه ورکول ورتنه ضروری دی.
4. د محلی ادارو د ځایول: د محلی ادارو د نظرونو د ځایول څخه د پروژې په هر برخه کې کار اخستل شوی لکه د پروژې انتخاب، منظوری، داوطلبی د مرحلې څخه کتنه، د ساختمنی کار څخه نظارت، نهلی پلټنه د افتتاح او تسلیم د هی مراسم او داسی نور په هر صورت د محلی ادارو د عملی کار کې د برخی اخستلو په معنی نه دی د ادیو پس منظور دی او په افغانستان کې د اجتماعی پر مختیلي کارونو د لپاره تر اوسه لاسوول ارگن مشخص ندي. د محلی حکومت داری ایجد او سلختل شید پهناتیر کناری وی مگر دابه د خونبې ځای وی چه د کلیوالی پر مختیلي چارو لپاره د محلی ادارو په مرسته که ممکن وی یو سیستم جوړ شی.
5. په ننګرهار ولایت کې د NRRC تر یو بنسین لاندی سلاحو کې امنیتي حالت په نسبی شکل د یاد وردی مگر نوری ولسوالی دیری نالمنه دی نو دابه د یو ضرور الفاظو پشنه لوو چی د امنیتي معلومتو شریکولو یو غوره سیستم دی د محلی حکومت او کلیو لوتر منځ جوړ شی. د متوام دی ضروری اقدامات او توجه باید د نور ولسوالیو د فعالیتونو د مصونیت په خاطر وشی.

6. مل (ضمیمه)

6.1 د پروژې د طرحې او ډیزاین لومړۍ بڼه (مسوده)

د پروژې طرح او ډیزاین لومړۍ بڼه (مسوده)

د پروژې نوم: د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ټولنیزې پرمختیا، بیاراستنو شویو مهاجرینو او ځایي هستوګنولپاره پروژه

د هدف لاندې ځایونه: په افغانستان کې د ننګرهار ولایت بهسود ولسوالۍ 6 کلی (هده آخندزاده، گردی کڅ، خوشگنبد، میران، ثمرخیل، سراچه) او سره رود ولسوالۍ 5 کلی (بالا باغ، چلر باغ، قح آبد، کوز سلطان پور او برسلطان پور)

د پروژې وخت: جون 2010 څخه تر اګست 2013 (39 میاشت)

نیدخل ګروپونه: د هدف لاندې کلیو اوسیدونکي، غیر دولتي موسسې، محلي قراردادې

مهمې فرضيې	د تصویب سبب	د تادیور شاخصونه	خلاصه
	د ټولني نه اوريل د معارف او صحت علمي ريليت نه اوريل د سلحه نه گته	1- د کرنې حاصلاتو کې زياتوالی 2- د ښوونځي مرکز ته د تګ لګوخت کې کمی 3- د ښوونځي او کليېکو ظرفيت اورول	عمومي هدف: 1- د دنگرهار په ولايت کې د بيار لسته شویو او ځایي هستوګنو د ژوند کې د موثر تطبيق په وسيله اورول او همدارنگه د لسلي زيږينو وپه وسيله د ټولني په کې ونه
• د له ټيټې وضعيت ټنگه پي ډول خراب نه شي • په بعضي حالاتو کې د هوا يو شان پلي کيل • همکل موسسه او همکل ان چي د پروژي د تطبيق لپاره ټينګ ورکول کېږي د خپلې دندې څخه استفا ورنگري	- د تطبيق ژورنل - له دنگرهار ولايت ولي، همکلې موسسې، ټولني او قراندکوونکو څخه اوريل	1- د پرمختيا نه موخه جوړول 2- د همکل موسسې ظرفيت د پروژو په ټنگه او تطبيق کې ونه ورکول 3- د قراندکيو ظرفيت د پروژو په لجر کې ونه کول 4- د بيار لسته شویو او ځایي هستوګنو لپاره موثله پروژو تطبيق	د پروژې مقصد 1- د محيظن بېت په هکله د لسلي زيږينو تطبيق لپاره په ټوله کې کېږي پر مخگ په دوه ولسواليو کې د بيار لسته شویو د ژوند پرمختيا په مقصد.
• د ټولني ټول اوسيدونکي همکل وي • قراندلي او فرعي قراندلي د پروژو لارښوونه او د قراندکيو مراعت کول • مرستندوي موسسه او باقراندلي د پروژي د تطبيق په جريل کېږي دندې څخه استفا ورنگري • همکل له دندې څخه استفا ورنگري	1-1 د ټولني سروی راپور. 1-2 د حضورونو د راپور 1-3 د بيليس 2-1 د رهبري شور لجر بڼه استند 2-2 غوښتن ليک 2-3 د تطبيق بيلان 3-1 د همکل موسسې د قراندکيو 3-2 د حفظ او مراقبت منول 3-3 د ځلني منول 3-4 د مياشتني راپور 4-1 د قراندلي استند 4-2 د استلي منول 4-3 د مياشتني راپور 4-4 د حفظ او مراقبت منول 5-1 د ځلني منول 5-2 د مياشتني راپور	1-1 د بېسود او سره رود ولسواليو پرمختيا لپاره ټولې معلومات جمع شوي دي 2-1 د محلي ټولو په گون له مياشتني پروژو ټکل شوي دي. 2-2 د محلي ټولو په گون له مياشتني پروژو د تطبيق بيلان جوړ شوي دي. 3-1 د ټولني پرمختيا لپاره مياشتني پروژي د تطبيق لپاره مرستندوي موسسې ټکل شوي دي. 3-2 د عاليو منول جوړ شوي دي 3-3 د نظرات منول جوړ شوي دي 3-4 د ټولني پرمختيا لپاره مياشتني پروژي د ټولني او مرستندوي موسسې په وسيله تطبيق شوي دي 4-1 د قراندلي په وسيله د پروژي د تطبيق لپاره فراندليو ټکل شوي دي 4-2 د عاليو منول جوړ شوي دي 4-3 د نظرات منول جوړ شوي دي 4-4 له مياشتني پروژو د همکلې موسسې او ټولني لخوا پلي شوي 5-1 عملي او نظري منول جوړ شوي 5-2 عملي او نظري کيټي جوري شوي 5-3 عملي او نظري فعليت بشپړ شوي	محصولات 1- د بېسود او سره رود فعلی حلت او پرمختيا لپاره ټولې معلومات راټولول 2- له مياشتني پروژو نه ټکل او د محلي قراندلي په همکلې د تطبيق بيلان جوړول 3- يو لسلي سيستم جوړول چې د لسلي زيږينو او پرمختيا د تطبيق لپاره د ټولني په کېږي او د ټولني اوسيدونکي په وسيله تطبيق ور وي 4- يو لسلي سيستم جوړول چې د لسلي زيږينو او پرمختيا د تطبيق لپاره د ټولني په کېږي او د ټولني د محلي قراندلي په وسيله تطبيق ور وي 5- د بېلگي زيږينو لپاره د ټولني په کېږي استلي او ځلني سيستم جوړول
• همکل موسسه او قراندلي د پروژي په تطبيق کې گون وگري • کومه اجيزان او کلرکونکي چې د پروژي لپاره ټينګ ورکول کېږي استفا ورنگري • د حاکماتو د تخصصي ټولني د دفتر لپاره ځای لاندې وي	د افغانستان اسلامي جمهوريت په ننګرهار ولايت کېږي غري: سرتم/ټولني مختگ 1 قراندکيو/تارکات ادار وکونکي 1 سلختملي نظرات وکونکي 1 گډه پرمختيا/ټولني پريسي 2	مصرفي پيسې او بشري نيرو	فعليتونه 1-1 د هدف لاندې ولسواليو فطري حلت لکه (نوس، دکرنيو شمېره، قرونه، دنده، علمه زيږونه، پوهنه، روغتيايي خدمتونه) د موجوده استند او سروی راټولول 1-2 د ټولني حکومت لرونکي لکه د هدف لاندې ټوله او نوري تمویل کونکي موسسې څخه د هدف لاندې ولسواليو لرونکي دزيږينې پرمختيا بيلان په هکله معلومات راټولول او د پرمختيا لپاره ټولني په ټينګه کول. 1-3 د هدف لاندې ولسواليو د پرمختيا حلت او ټولني لپاره د بيليس جوړول او هغه پکي خوندي کول 1-4 د محلي قراندلي معلومات راټولول او هغه لپاره د بيليس جوړول او پکي لچول

مهملی فرضی	د تصویب سبب	د تلیور شاخصونه	خلاصه
	د کل سملونه لومړی او تسهیلات د مطی فعالیتونو مصرف د همکار لومړی نوری غیر متوقعه مصرف نور...	مهتس 1 د شاهراه لجنیز 1 د لیلر لجنیز 1 د سیند لجنیز 1 د ژ ملیتی پروژو لاره کونکی 2 د کل سملونه لومړی او تسهیلات د مطی فعالیتونو بیه فرعی قرارداد د هشتی اوسنی حالت معلومات لولول، د پرمختللی ژ تیوی، دخبرو اړو سیستم جیروول، د پروژو تکله او تطبیق نوری غیر متوقعه مصرف	<p>2-1 ټولنیز سروی ترسره کول د عمومی څرنګوالي، د پرمختللی شور لګو جیروول، د بیا رلسته شوو د ژوند حالت او دلسی نور معلومات لولولو په خاطر</p> <p>2-2 د مشورت، میکلیز منځ ته لورل د ژ ملیتی پروژې تطبیق لپاره په هر کلی کبی د پرمختللی شور لګو تر منځ</p> <p>2-3 د ژ ملیتی پروژې ټکل او د تطبیق میتود لپاره لرونو لګونو څخه مشوره لږمیل (د ټولنی او یاد قراردادنی په واسطه)</p> <p>2-4 د ژ ملیتی پروژې د تطبیق عمومی پلان او ترتیبو څخه حمایت کول</p> <p>3-1 د عملیاتی منول لکه (د پروژې تکله، د تطبیق جرینت، د نظارت پلان، د مونیتورنگ سیستم، ملی لاره) د ټولنیز پرمختللی ژ ملیتی پروژو د ملی پیوستون د لارښود پر بنسټ جیروول.</p> <p>3-2 د نظارت منول د غیر معق سلختملی زیونو لکه (د ګڼو سرکونه جیروول، د بنوونځی تسهیلات، لیلر کالونو چی د ټولنی اوسیدونکی په واسطه جیروول کیری جیروول</p> <p>3-3 د نظارت او مونیتورنگ منول پر بنسټ د ټولنی پرمختللی لپاره ژ ملیتی پروژې تطبیق کول.</p> <p>3-4 د ژ ملیتی پروژو د تطبیق څخه زده کړی، پوهه، او مونلی خلاصه کول او همدارنګه د زیونې پروژو د فعالیت او نظارت منول دویز لوستل او هغه نهلی کول</p> <p>3-5 د ټولنی پرمختللی زیونې منول لرونو لګونو سره شریکه کول</p> <p>4-1 د عملیاتی منول لکه (د قراردادنی ټکل، د لوطلی، قرارداد، نظارت، تحقیق، تسلیمی، ملی لاره) د ژ ملیتی پروژې د تطبیق لپاره د قراردادنی په واسطه جیروول.</p> <p>4-2 د ژ ملیتی پروژو د تطبیق لپاره د نظارت منول جیروول د قراردادنی په واسطه</p> <p>4-3 د نظارت او عملیاتی منول پر بنسټ د ژ ملیتی پروژو تطبیق کول د قراردادنی په واسطه</p> <p>4-4 د ژ ملیتی پروژو د تطبیق څخه زده کړی، پوهه، او مونلی خلاصه کول او همدارنګه د زیونې پروژو د فعالیت او سلنی منول دویز لوستل او هغه نهلی کول.</p> <p>4-5 د ټولنی پرمختللی منول لرونو لګونو سره شریکه کول</p> <p>5-1 د ټولنیز غونډه جیروول او د فعالیت او سلنی لپاره پلان جیروول.</p> <p>5-2 د فعالیت او سلنی وضعیت چی د ټولنی اوسیدونکی په واسطه ترسره کیری نظارت کول او د ضرورت په حالت مرسته کول.</p>
لومړنیز شرطونه • د سلطت، فصل، او امنیت حالت په قغشتمن کبی مستحکم وی • د قغشتمن ملکیت ترسول لاندی نه وی			

فعالیت	کاری پس منظر	2010												2011												2012			ترتیبی									
		7			8			9			10			11			12			1			2			3												
		4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	9	16	23	30	13	20	27	17	24	31	1	8	15	22		29	5	12	19	26	9	16	23	30
0	همکاری موسمی تاکنل	اعلان																																				
		تدابیری پرویزول																																				
		مالی پرویزول																																				
		قرارداد																																				
1	په سره رود او بهسونو ولسوالیو کی ډیرمختک نظر ورتولایو سروری	همکاری موسمی لپاره کاری																																				
1.1	په ډگرشویو ولسوالیو کی له موجوده حالاتو څخه دانسانو ایزول	همکاری موسمی لپاره کاری																																				
		بلان جوړول																																				
1.2	ډنگر هلو لایت مقام او پرویزی لرونده ریمانسونو څخه تر پوښ لاندی کولایو، درالوونکی پلان تقویه کولو په منظور اساسی کوچنی ساختمانونه	همکاری موسمی لپاره کاری																																				
		معلوماتو ایزول او سروری																																				
1.3	په ډگرشویو ولسوالیو کی له موجوده حالاتو څخه درالوونک شویو اسانوبنکانه ایزول	اسانوبنکایول																																				
		معلوماتو ایزول او سروری																																				
1.4	له محلی قراردادیانو څخه معلومات اخستل او هغه تر نیول	ایزول																																				
		معلوماتو ایزول او سروری																																				
2	ډرامایشی پروزی تکلی او پلان جوړول	همکاری موسمی لپاره کاری																																				
2.1	د یووسو کلو په کرته شویو شورا کانو کی ټولنیزې سروری له مخی خاصی هسوکو لومبارونو لرونده حالاتو عومومی نتیجه کاری	همکاری موسمی لپاره کاری																																				
		پوښتن او جوړول																																				
		معلوماتو ایزول او سروری																																				
		نظریاتی او فیزیکی ایزول																																				
2.2	ډرامایشی پروزی پلي کولایو په هر کلی کی موجوده شورا کانو څخه ډیسی ډیسی بوزده (رهنوی شورا) جوړول	همکاری موسمی لپاره کاری																																				
		بلان جوړول																																				
		مشکلاتو تحلیلول																																				
		معلوماتو ایزول او سروری																																				
2.3	ډرامایشی پروزی تکلی (قراردادی، ایزول او واسطه) او تطبیق لپاره یی له اړوندو کلو څخه موافقه لوبک تر لاسه کول	همکاری موسمی لپاره کاری																																				
		بلان جوړول																																				
		ایشای لیست تر نیول																																				
		دوه لیست تر نیول																																				
2.4	ډرامایشی پروزی ایزول پلي کولایو له فهایی ملاتړ کول	همکاری موسمی لپاره کاری																																				
		بلان جوړول																																				
		ایشای لیست تر نیول																																				
		دوه لیست تر نیول																																				

فعالیتونه	کاری پس منظر	2012												2013																																																			
		4			5			6			7			8			9			10			11			12			1		2		3			4			5			6																							
		1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16
1	په سره رود اوپوسودکی دېر مخنیوی اړتیاووسړی		Achieved																																																														
2	دامتجانې پروژو انتخاب اویاشول																																																																
2.3	دامتجانې پروژو تطبیق لپاره دگلې اوتوله په سطحه نظریو دموافقه جوړښت رامنځته کول	دھنکاري موسیسي سره قراردادونه سره کول	حقیقي پلان																																																														
		دامتجانې پروژو انتخاب	حقیقي پلان																																																														
		تنگر هار و لایتي ادارې اوجاچکا څخه سلطوري اخستل	حقیقي پلان																																																														
2.4	ننوا دامتجانې پروژو تطبیق پلان جوړول اوسلاو کول	حقیقي پلان	په پلان حمایت																																																														
3	دکلیو الوپه واسطه تطبیق کېدونکو پروژو تطبیق																																																																
3.3	دحفظ اومراقبت اړخاني دلاړ بندو په اساس دکلیو الو په واسطه تطبیق کېدونکو پروژو تطبیق	دھنکاري موسیسي سره قراردادونه سره کول	حقیقي پلان																																																														
		تطبیق	حقیقي پلان																																																														
		دامتجانې پروژو تطبیق لپاره دگلې اوتوله په سطحه نظریو دموافقه جوړښت رامنځته کول	حقیقي پلان																																																														
3.4	دامتجانې پروژو تطبیق لپاره دگلې اوتوله په سطحه نظریو دموافقه جوړښت رامنځته کول	داسمه را اغلو معلوماتو تجزیو خلاصه کول	حقیقي پلان																																																														
		دزماښتی ساختمانی پروژو دپیلې کولو څخه تر لاسه شویو ، علمي اومشاهدتي تجزیو په پایله کې دکلیو الو اړخاني دلاړ بندو نویه کتنه دکلیو الو په واسطه پیلې کېدونکی نوعه لپاره دلاړ بندونو نهایی کول	حقیقي پلان																																																														
		اړخاني دلاړ بندو نهایی کول	حقیقي پلان																																																														
3.5	دومسه مرحله دمریوطه لوړو سره دکلیو الو ساختمانی پرمختیا په خاطر دلاړ بندونو شریکول	دلاړ بندونو توزیع	حقیقي پلان																																																														
		روزنه	حقیقي پلان																																																														
		دقراردادی پروژو تطبیق																																																															
4	دقراردادی پروژو تطبیق																																																																
4.3	دقراردادی په واسطه دپروژو تطبیق دحفظ اومراقبت اړخاني دمول له مخی	دھنکاري موسیسي سره قراردادونه سره کول	حقیقي پلان																																																														
		دواړو لپاره قرارداد	حقیقي پلان																																																														
		تطبیق	حقیقي پلان																																																														
4.4	دامتجانې پروژو تطبیق لپاره دگلې اوتوله په سطحه نظریو دموافقه جوړښت رامنځته کول	داسمه را اغلو معلوماتو تجزیو خلاصه کول	حقیقي پلان																																																														
		دزماښتی ساختمانی پروژو دپیلې کولو څخه تر لاسه شویو ، علمي اومشاهدتي تجزیو په پایله کې دکلیو الو اړخاني دلاړ بندو نویه کتنه دکلیو الو په واسطه پیلې کېدونکی نوعه لپاره دلاړ بندونو نهایی کول	حقیقي پلان																																																														
		اړخاني دلاړ بندو نهایی کول	حقیقي پلان																																																														
4.5	دمریوطه لوړو سره دقراردادی په واسطه دساختمانی چارو دپیلې والی په خاطر دلاړ بندونو شریکول	دلاړ بندونو توزیع	حقیقي پلان																																																														
		روزنه	حقیقي پلان																																																														
		دحفظ اومراقبت جوړښت رامنځته کول																																																															
5.1	دکلیو الو دکلیو الو داسمه را اغلو معلوماتو تجزیو خلاصه کول	دحفظ اومراقبت کمیټی جوړول	حقیقي پلان																																																														
		دحفظ اومراقبت پلان برابول	حقیقي پلان																																																														
		حفظ اومراقبت	حقیقي پلان																																																														
5.2	دحالاتو دازمایی اوتظارت په مسورت کې دپروژو دحفظ اومراقبت په خاطر که اړینه وی دکلیو الو ملاتړ تر لاسه کول	تظارت	حقیقي پلان																																																														
		ازمایی	حقیقي پلان																																																														
		غونډه داورپیل/پروژو دهمغی دکمیټی PCC	حقیقي پلان																																																														
6.0	غونډه داورپیل/پروژو دهمغی دکمیټی PCC																																																																

Position / Task	Name	Rank	Before	1st Year (June 2010~March 2012)												2nd Year												3rd Year												1st year	2nd year	3rd year	Total
				Phase-1 (June 2010~March 2012)												Phase-2 (April 2012~August 2013)																											
				2010						2011						2012						2013																					
				6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
Team Leader / Community Development	Yoshihisa Noda	2	Before	[Gantt chart for Team Leader / Community Development - Before]																																				8.00	4.50	6.00	18.50
			After	[Gantt chart for Team Leader / Community Development - After]																																				10.50	11.00	0.00	21.50
Contract / Procurement Management	Masako Suzuki	3	Before	[Gantt chart for Contract / Procurement Management - Before]																																				7.50	4.50	6.00	18.00
			After	[Gantt chart for Contract / Procurement Management - After]																																				10.00	11.00	0.00	21.00
Construction Supervision	Takao Mitsubishi	3	Before	[Gantt chart for Construction Supervision - Before]																																				5.50	4.50	3.00	13.00
			After	[Gantt chart for Construction Supervision - After]																																				1.20	4.50	0.00	5.70
Participatory Development/Social Study (I)	Kazuko Yamamoto	3	Before	[Gantt chart for Participatory Development/Social Study (I) - Before]																																				5.00	3.00	2.00	10.00
			After	[Gantt chart for Participatory Development/Social Study (I) - After]																																				2.93	0.00	0.00	2.93
Participatory Development/Social Study (II)	Shimako Narahara / Katsuhisa Ota	4	Before	[Gantt chart for Participatory Development/Social Study (II) - Before]																																				5.50	3.00	2.00	10.50
			After	[Gantt chart for Participatory Development/Social Study (II) - After]																																				7.23	7.50	0.00	14.73
Architecture Plan / Design	Hiroyuki Iguchi	3	Before	[Gantt chart for Architecture Plan / Design - Before]																																				6.00	3.00	1.40	10.40
			After	[Gantt chart for Architecture Plan / Design - After]																																				3.03	2.40	0.00	5.43
Road Plan / Design	Katsuya Ishikawa	4	Before	[Gantt chart for Road Plan / Design - Before]																																				6.00	3.00	1.50	10.50
			After	[Gantt chart for Road Plan / Design - After]																																				8.50	6.00	0.00	14.50
Irrigation Plan / Design	Pushpa Chitrakar	3	Before	[Gantt chart for Irrigation Plan / Design - Before]																																				5.60	2.80	1.40	9.80
			After	[Gantt chart for Irrigation Plan / Design - After]																																				7.00	6.00	0.00	13.00
River Plan / Design	Kiyoharu Miyazaki	3	Before	[Gantt chart for River Plan / Design - Before]																																				2.50	3.00	1.40	6.90
			After	[Gantt chart for River Plan / Design - After]																																				1.03	0.00	0.00	1.03
Pilot Project Management (I)	Akie Umeno	5	Before	[Gantt chart for Pilot Project Management (I) - Before]																																				6.50	3.00	1.50	11.00
			After	[Gantt chart for Pilot Project Management (I) - After]																																				6.27	0.00	0.00	6.27
Pilot Project Management (II)	Bhoj Raj Pantha	5	Before	[Gantt chart for Pilot Project Management (II) - Before]																																				4.50	4.50	2.80	11.80
			After	[Gantt chart for Pilot Project Management (II) - After]																																				3.50	4.50	0.00	8.00
Total of work in Afghanistan			Before	[Summary Gantt for Afghanistan - Before]																																				62.60	38.80	29.00	130.40
			After	[Summary Gantt for Afghanistan - After]																																				61.19	52.90	0.00	114.09
Team Leader / Community Development	Yoshihisa Noda	2	Before	[Gantt chart for Team Leader / Community Development - Before]																																				0.20	-	-	0.20
			After	[Gantt chart for Team Leader / Community Development - After]																																				2.47	-	-	2.47
Contract / Procurement Management	Masako Suzuki	3	Before	[Gantt chart for Contract / Procurement Management - Before]																																				0.20	-	-	0.20
			After	[Gantt chart for Contract / Procurement Management - After]																																				3.40	-	-	3.40
Construction Supervision	Takao Mitsubishi	3	Before	[Gantt chart for Construction Supervision - Before]																																				0.20	-	-	0.20
			After	[Gantt chart for Construction Supervision - After]																																				1.50	-	-	1.50
Participatory Development/Social Study (I)	Kazuko Yamamoto	3	Addition	[Gantt chart for Participatory Development/Social Study (I) - Addition]																																				1.07	-	-	1.07
			After	[Gantt chart for Participatory Development/Social Study (I) - After]																																				1.67	-	-	1.67
Participatory Development/Social Study (II)	Shimako Narahara / Katsuhisa Ota	4	Addition	[Gantt chart for Participatory Development/Social Study (II) - Addition]																																				1.67	-	-	1.67
			After	[Gantt chart for Participatory Development/Social Study (II) - After]																																				2.97	-	-	2.97
Architecture Plan / Design	Hiroyuki Iguchi	3	Addition	[Gantt chart for Architecture Plan / Design - Addition]																																				1.00	-	-	1.00
			After	[Gantt chart for Architecture Plan / Design - After]																																				0.23	-	-	0.23
Road Plan / Design	Katsuya Ishikawa	4	Addition	[Gantt chart for Road Plan / Design - Addition]																																				1.00	-	-	1.00
			After	[Gantt chart for Road Plan / Design - After]																																				2.60	-	-	2.60
Pilot Project Management (I)	Akie Umeno	5	Addition	[Gantt chart for Pilot Project Management (I) - Addition]																																				0.60	-	-	0.60
			After	[Gantt chart for Pilot Project Management (I) - After]																																				16.91	-	-	16.91
Pilot Project Management (II)	Bhoj Raj Pantha	5	Addition	[Gantt chart for Pilot Project Management (II) - Addition]																																				0.60	-	-	0.60
			After	[Gantt chart for Pilot Project Management (II) - After]																																				16.91	-	-	16.91
Total of work in Japan			Before	[Summary Gantt for Japan - Before]																																				62.60	0.60	38.80	102.00
			After	[Summary Gantt for Japan - After]																																				61.19	16.91	52.90	131.00
Report	Submission	3	Before	[Gantt chart for Report Submission - Before]																																				62.60	0.60	38.80	102.00
			After	[Gantt chart for Report Submission - After]																																				61.19	16.91	52.90	131.00
Total of work in Afghanistan			Before	[Summary Gantt for Afghanistan - Before]																																				62.60	0.60	38.80	102.00
			After	[Summary Gantt for Afghanistan - After]																																				61.19	16.91	52.90	131.00

Position / Task	Name	Company	Rank	Phase-2												AF	JP	AF	JP	
				2012						2013										
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3					4
Team Leader/ Community Development	Yoshihisa NODA	KE I	2	Before	18(0.6)	9(0.3)				30(1.0)		30(1.0)		30(1.0)				3.9	3.9	
				After	8/23-8/26 15(0.5)		7/23-8/3 12(0.4)		9/23-10/10 24(0.8)		11/14-12/16 34(1.1)		1/2-2/25 36(1.2)		4/1-4/9 9(0.3)	5/18-5/26 9(0.3) Rank3			4.6	4.6
Deputy Team leader/ Contract/Procurement Management/Tender Document	Masako SUZUKI	KE I	3	Before	24(0.8)	24(0.8)	21(0.7)	21(0.7)		30(1.0)		30(1.0)		30(1.0)				6.0	6.0	
				After	8/12-8/14 24(0.8)		7/14-9/20 64(2.3)		10/14-11/6 24(0.8)		11/8-31 24(0.8)		2/9-3/4 24(0.8)		5/15-5/26 12(0.4)				5.9	5.9
Participatory Community Development	Katsuhisa OTA	KE I	4	Before	5/7-5/21 15(0.5)													0.5	0.5	
				After	6/1-6/18 12(0.4)															0.4
Environmental and Social Considerations / Civil Engineer (2)	Kiyoshi MURAI	KE I	4	Before				45(1.5)		30(1.0)		30(1.0)						3.5	3.5	
				After						10/3-11/9 34(1.0)		11/18-1/16 30(1.0)								2.0
Civil Engineer (1)	Tomohiko NAKAMURA	KE I	3	Before		9/11-6/25 15(0.5)				30(1.0)								1.5	1.5	
				After						9/14-10/15 30(1.0)										1.0
Architect	Hiroyuki IGUCHI	KE I (Matsuda Consultant s)	3	Before	4/24-5/7 15(0.5)			21(0.7)	24(0.8)			15(0.5)						2.5	2.5	
				After	3/12-5/25 14(0.47)		7/14-7/25 12(0.4)		10/3-10/23 21(0.7)		1/17-2/14 23(0.93)		4/1-4/9 9(0.3)						2.8	2.8
Procurement/Cost Estimate/Site Investigation	Hiroshi WATANABE	KE I	3	Before		6/5-6/25 21(0.7)												0.7	0.7	
				After	6/5-6/25 21(0.7)		8/8-8/19 12(0.4)													1.1
																	Before	18.6	18.6	
																	After	17.8	17.8	
Team Leader/ Community Development	Yoshihisa NODA	KE I	2	Before		6/11-6/22 12(0.4)		15(0.5)	9(0.3)									1.2	1.2	
				After		6/11-6/22 12(0.4)				10/23-31 9(0.3)		12/17-31 9(0.3)	1/7-12 6(0.2)	3/25-30 6(0.2)						1.4
Deputy Team leader/ Contract/Procurement Management/Tender Document	Masako SUZUKI	KE I	3	Before		12(0.4)												0.4	0.4	
				After		6/11-6/22 12(0.4)														0.4
Participatory Community Development	Katsuhisa OTA	KE I	4	Before		12(0.4)												0.4	0.4	
				After	5/21-6/1 12(0.4)		6/18-20 3(0.1)													0.5
Environmental and Social Considerations / Civil Engineer (2)	***	KE I	4	Before						30(1.0)		30(1.0)						2.0	2.0	
				After		6/11-7/28 45(0.5)		10/1-4/17-20 8(0.27)		11/30-12/17 28(0.93)		1/17-31 15(0.5)							3.2	3.2
Civil Engineer (1)	***	KE I	3	Before				39(1.3)		30(1.0)		30(1.0)						3.3	3.3	
				After		6/11-7/31 53(1.7)				10/27-12/18 53(2.0)		12/19-27 9(0.3) Rank4							4.1	4.1
Architect	***	KE I	3	Before		6/1-6/30 30(1.0)												1.0	1.0	
				After																
Procurement/Cost Estimate/Site Investigation	***	KE I	3	Before		3(0.1)	36(1.2)				30(1.0)							2.3	2.3	
				After	6/1-3 3(0.1)	4/26-8/6 42(1.4)	8/20-28 9(0.3)					1/10-24 15(0.5)							2.3	2.3
Tender Document (II)	Pushpa Chitrakar	KEI (EHS)	3	Before		15(0.5)					30(1.0)							1.5	1.5	
				After	5/14-5/23 10(0.33)									6/7-2/10 35(1.17)					1.5	1.5
																	Before	12.1	12.1	
																	After	14.4	14.4	
Report (NRRC)	Submission	<input type="checkbox"/> Inception <input type="checkbox"/> Work Plan <input type="checkbox"/> Cost estimation <input type="checkbox"/> Draft Final Report <input type="checkbox"/> Final Report <input type="checkbox"/> Final Report																		
Report (NRRC (GA))		<input type="checkbox"/> Inception <input type="checkbox"/> Result of site survey <input type="checkbox"/> Summary survey <input type="checkbox"/> Final report <input type="checkbox"/> Tender document																		
																	18.6	12.1	18.6	12.1
																	17.8	14.4	17.8	14.4
																	30.7	30.7		
																	32.2	32.2		

**MINUTES OF MEETING
BETWEEN
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY
AND
THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF NANGARHAR
IN ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN
ON
THE COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT FOR RETURNEES AND
RECEIVING COMMUNITIES IN NANGARHAR PROVINCE
IN THE ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN**

Japan International Cooperation Agency (hereinafter referred to as "JICA") has commenced "The Community Development Project for Returnees and Receiving Communities in Nangarhar Province" (hereinafter referred to as "NRRC") in collaboration with Provincial Government of Nangarhar (hereinafter referred to as "PGoN") from July 2010. At the occasion of First Project Coordination Committee (hereinafter referred as "PCC"), JICA and PGoN has a series of discussion for effective and smooth implementation of this project.

As a result of the discussion, PGoN and JICA agreed to the matters referred in the documents attached hereto.

Jalalabad, November 9, 2010


Gul Agha Sherzai
Governor
Provincial Government of Nangarhar


Kazuhiro Yoshida
Assistant Resident Representative
JICA Afghanistan Office

THE ATTACHED DOCUMENT

I. WORK PLAN

Both sides had series of discussion and have agreed with the Work Plan for the Project as shown in ANNEX I. Work Plan is to be flexibly revised by the discussion and agreement between Provincial Government of Nangarhar (hereinafter referred to as "PGoN") and JICA in the form of Minutes of Meeting, reference to Record of Discussion.

II. PILOT PROJECTS FOR GROUP-1

After technical examination and discussions with each community and authority concerned, 19 pilot projects have been selected for Group-1 as shown in ANNEX II. Both sides have agreed with the selection and approved implementation of these pilot projects. PGoN shall bear responsibilities of operation and maintenance after completion of these pilot projects.

ANNEX I Work Plan

ANNEX II List of Pilot Projects for Group-1

MINUTES OF MEETING
BETWEEN
THE JAPANESE TERMINAL EVALUATION TEAM
AND
THE AUTHORITIES CONCERNED OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN
ON
JAPANESE TECHNICAL COOPERATION FOR
THE COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT FOR RETURNEES AND RECEIVING
COMMUNITIES IN NANGARHAR PROVINCE
IN
THE ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN

The Japanese Terminal Evaluation Team (hereinafter referred to as "the Team") organized by Japan International Cooperation Agency (hereinafter referred to as "JICA"), headed by Ms. Katsura Miyazaki, Deputy Director General, and Group Director for Peace Building and Urban and Regional Development, Economic Infrastructure Department, JICA visited the Islamic Republic of Afghanistan from 10th February to 14th February, 2013 for the purpose of conducting evaluation concerning the Community Development Project for Returnees and Receiving Communities in Nangarhar Province (hereinafter referred to as "the Project").

During its stay in the Islamic Republic of Afghanistan, the Team executed evaluation of the project based on the Record of Discussions, signed on 23rd March 2010, between the Resident Representative of JICA Afghanistan Office and authorities concerned (hereinafter referred to as "R/Ds").

The Team held discussions with the officials concerned of the Afghanistan side with regard to the achievement. As a result of discussions, both parties mutually agreed to recommend the matters referred to in the document attached hereto to their respective authorities concerned.

Kabul, February 12
. 2013


Ms. Katsura Miyazaki
Leader
Terminal Evaluation Team
Japan International Cooperation Agency


Mr. Gul Agha Sherzai
Governor,
Provincial Government of Nangarhar
