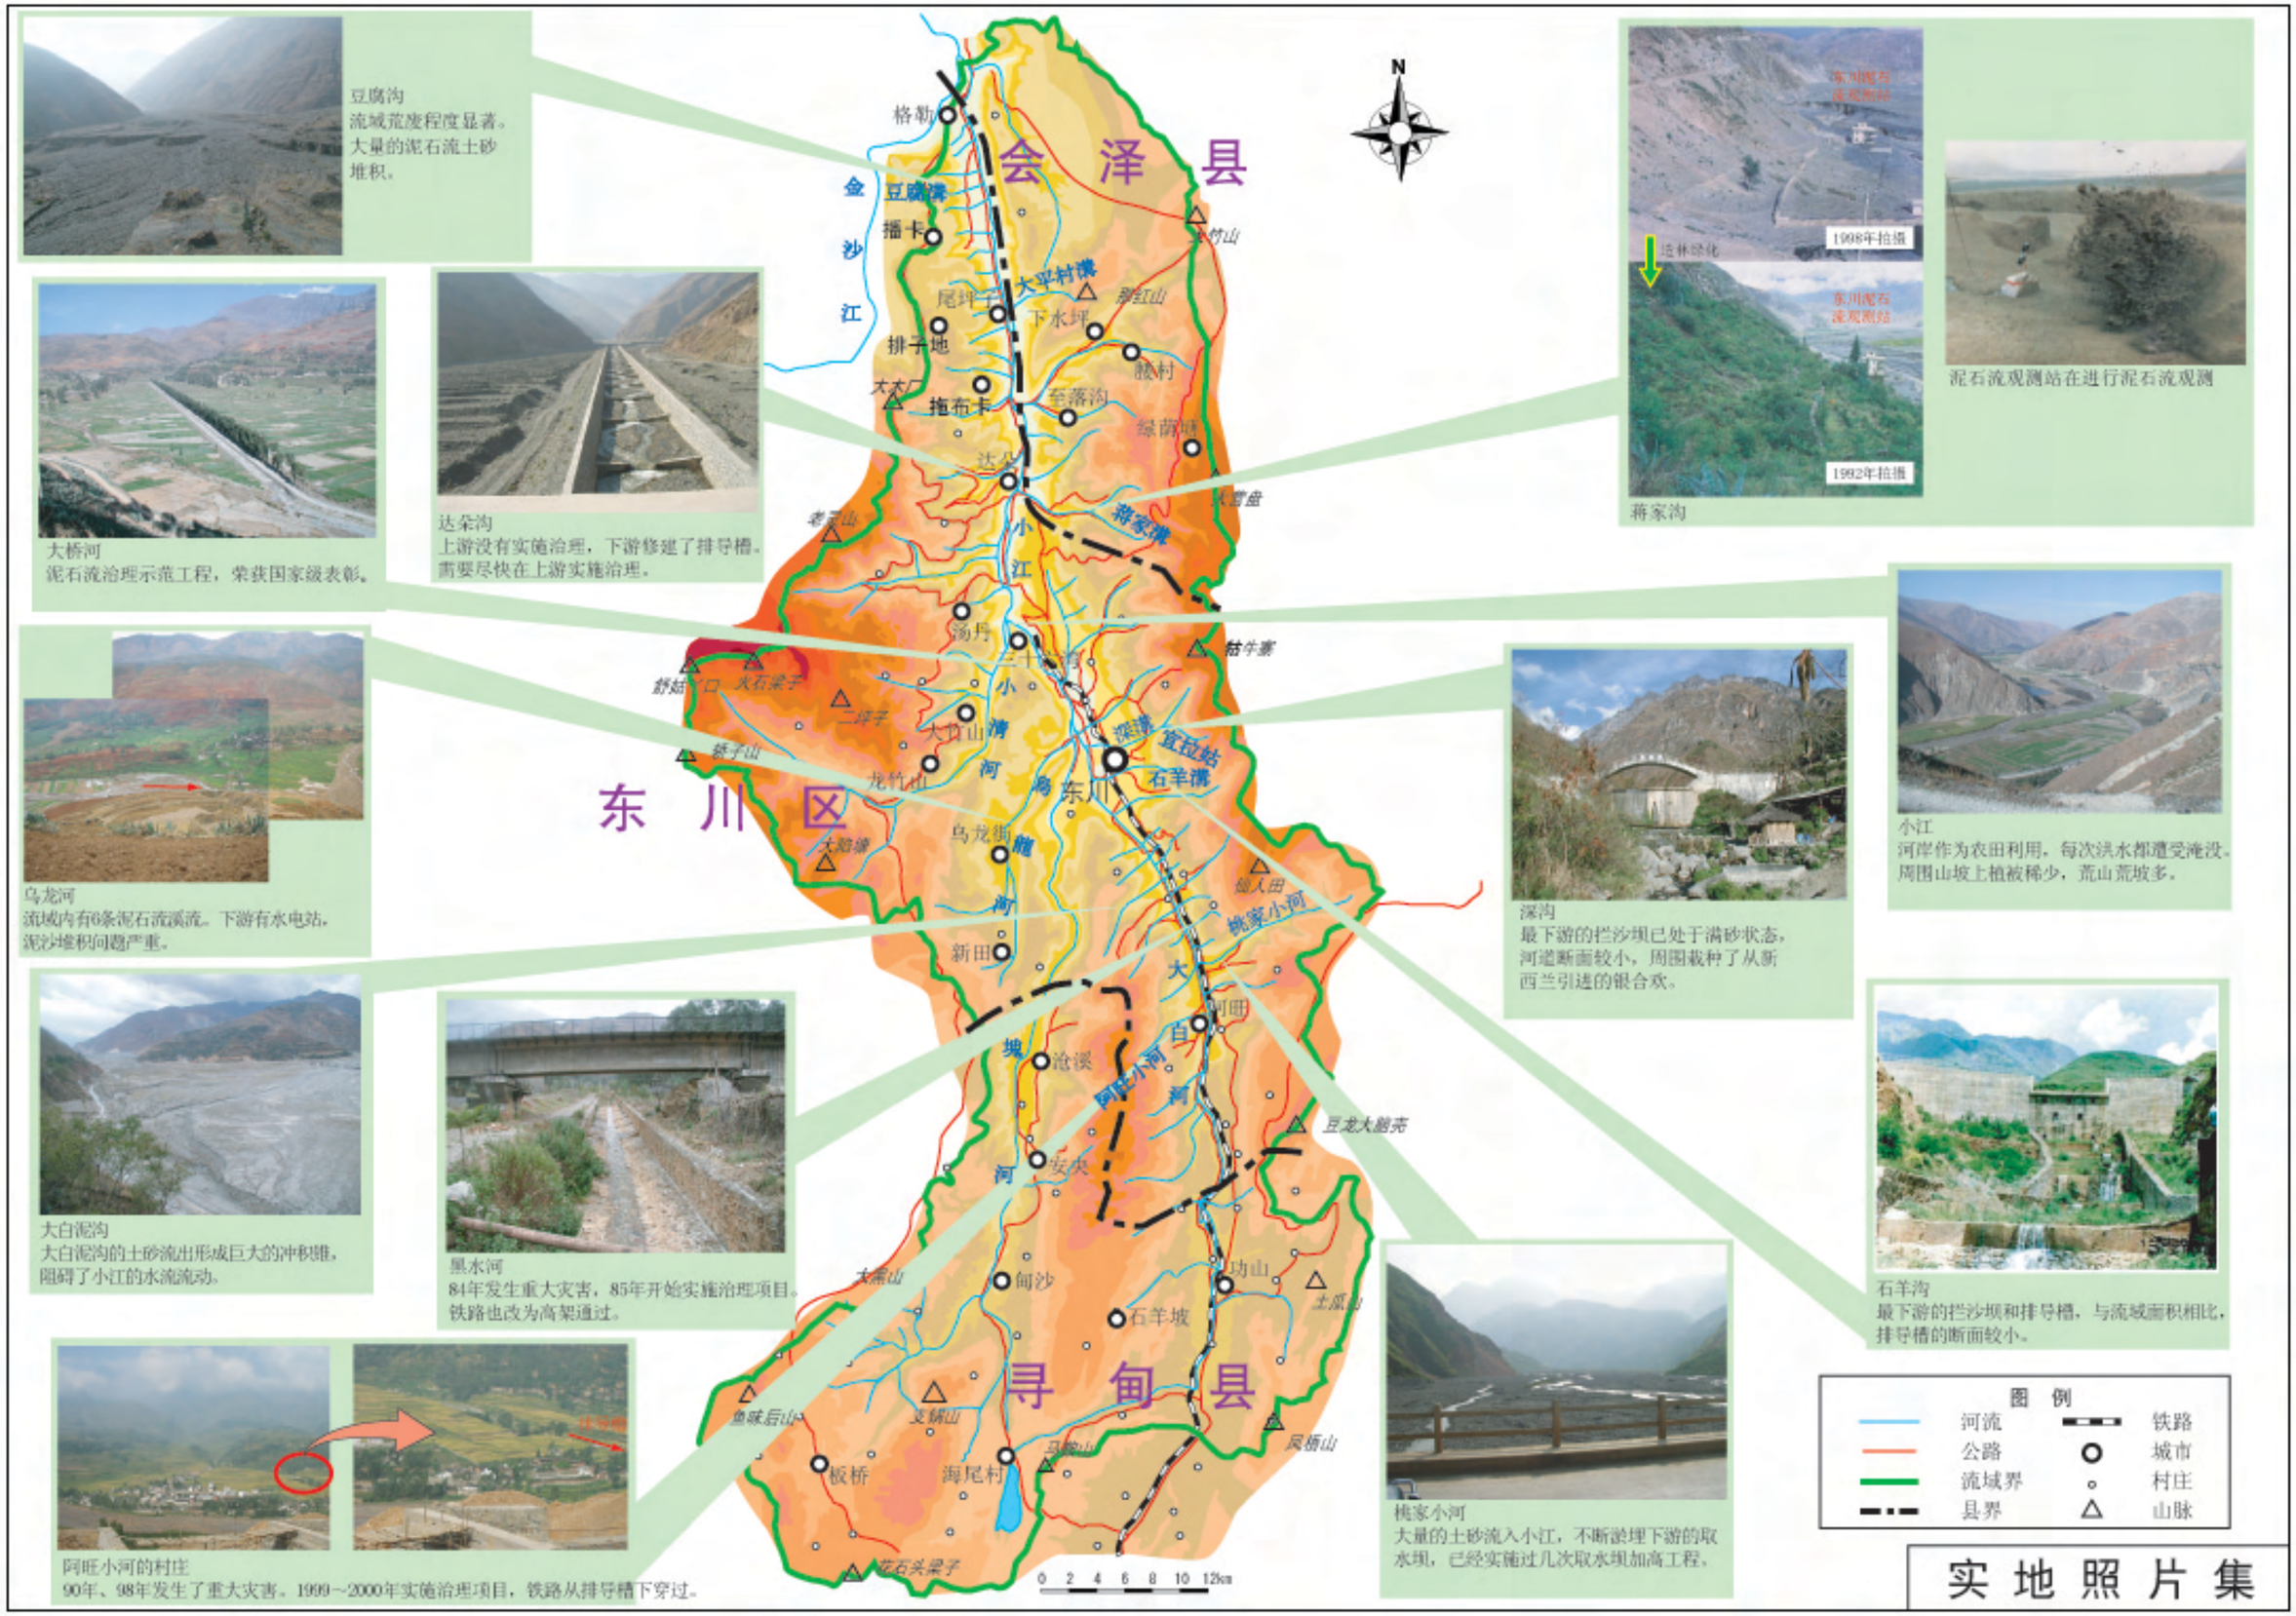

豆腐沟
流域荒废程度显著。大量的泥石流土砂堆积。

大桥河
泥石流治理示范工程，荣获国家级表彰。

达朵沟
上游没有实施治理，下游修建了排导槽。需要尽快在上游实施治理。

乌龙河
流域内有6条泥石流溪流。下游有水电站，泥沙堆积问题严重。

大白泥沟
大白泥沟的土砂流出形成巨大的冲积锥，阻碍了小江的水流流动。

黑水河
84年发生重大灾害，85年开始实施治理项目。铁路也改为高架通过。

阿旺小河的村庄
90年、98年发生了重大灾害。1999～2000年实施治理项目，铁路从排导槽下穿过。

1998年拉摄
造林绿化
东川泥石流观测站
1992年拉摄
蒋家沟

泥石流观测站在进行泥石流观测

小江
河岸作为农田利用，每次洪水都遭受淹没。周围山坡上植被稀少，荒山荒坡多。

深沟
最下游的拦沙坝已处于满砂状态，河道断面较小，周围栽种了从新西兰引进的银合欢。

石羊沟
最下游的拦沙坝和排导槽，与流域面积相比，排导槽的断面较小。

桃家小河
大量的土砂流入小江，不断淤埋下游的取水坝，已经实施过几次取水坝加高工程。

签署着手报告书会谈纪要（2004.4.15）	造林技术交流会（2004.9.23） 地点：东川区水务局
片山正巳副团长应邀出席云南省水利学会年会（2004.11.15）	砂防技术交流会（2004.11.24） 地点：东川区水务局
调查报告研讨会 （2005.1.28）	签署实地报告书会谈纪要（2005.1.31）
