

# チリ貝類増養殖開発計画 計画打合せ調査団報告書

平成10年9月

国際協力事業団

林水産

JR

98-025

**チリ貝類増養殖開発計画  
計画打合せ調査団報告書**

平成10年9月

**国際協力事業団**

# 序 文

国際協力事業団は、チリ共和国政府からの技術協力の要請に基づき、平成8年7月から同国においてチリ貝類増養殖開発計画を開始しました。

このたび当事業団は、本計画の今後の実行計画を協議・検討するため、平成9年3月12日から3月28日まで、マリノフォーラム21畔田正格技監を団長とする計画打合せ調査団を同国に派遣しました。

同調査団は、チリ共和国政府関係者や派遣専門家と協議を行うとともに、プロジェクト・サイトでの現地調査を実施し、帰国後の国内作業を経て、調査結果を本報告書に取りまとめました。


今回の調査・協議の結果が本計画の協力目標達成に役立つとともに、この技術協力事業の実施が、両国の友好・親善の一層の発展に寄与することを期待いたします。

終わりにこの調査にご協力とご支援をいただいた関係者の皆様に対し、心から感謝の意を表します。

平成10年9月

国際協力事業団  
理事 亀若 誠

プロジェクトサイト図

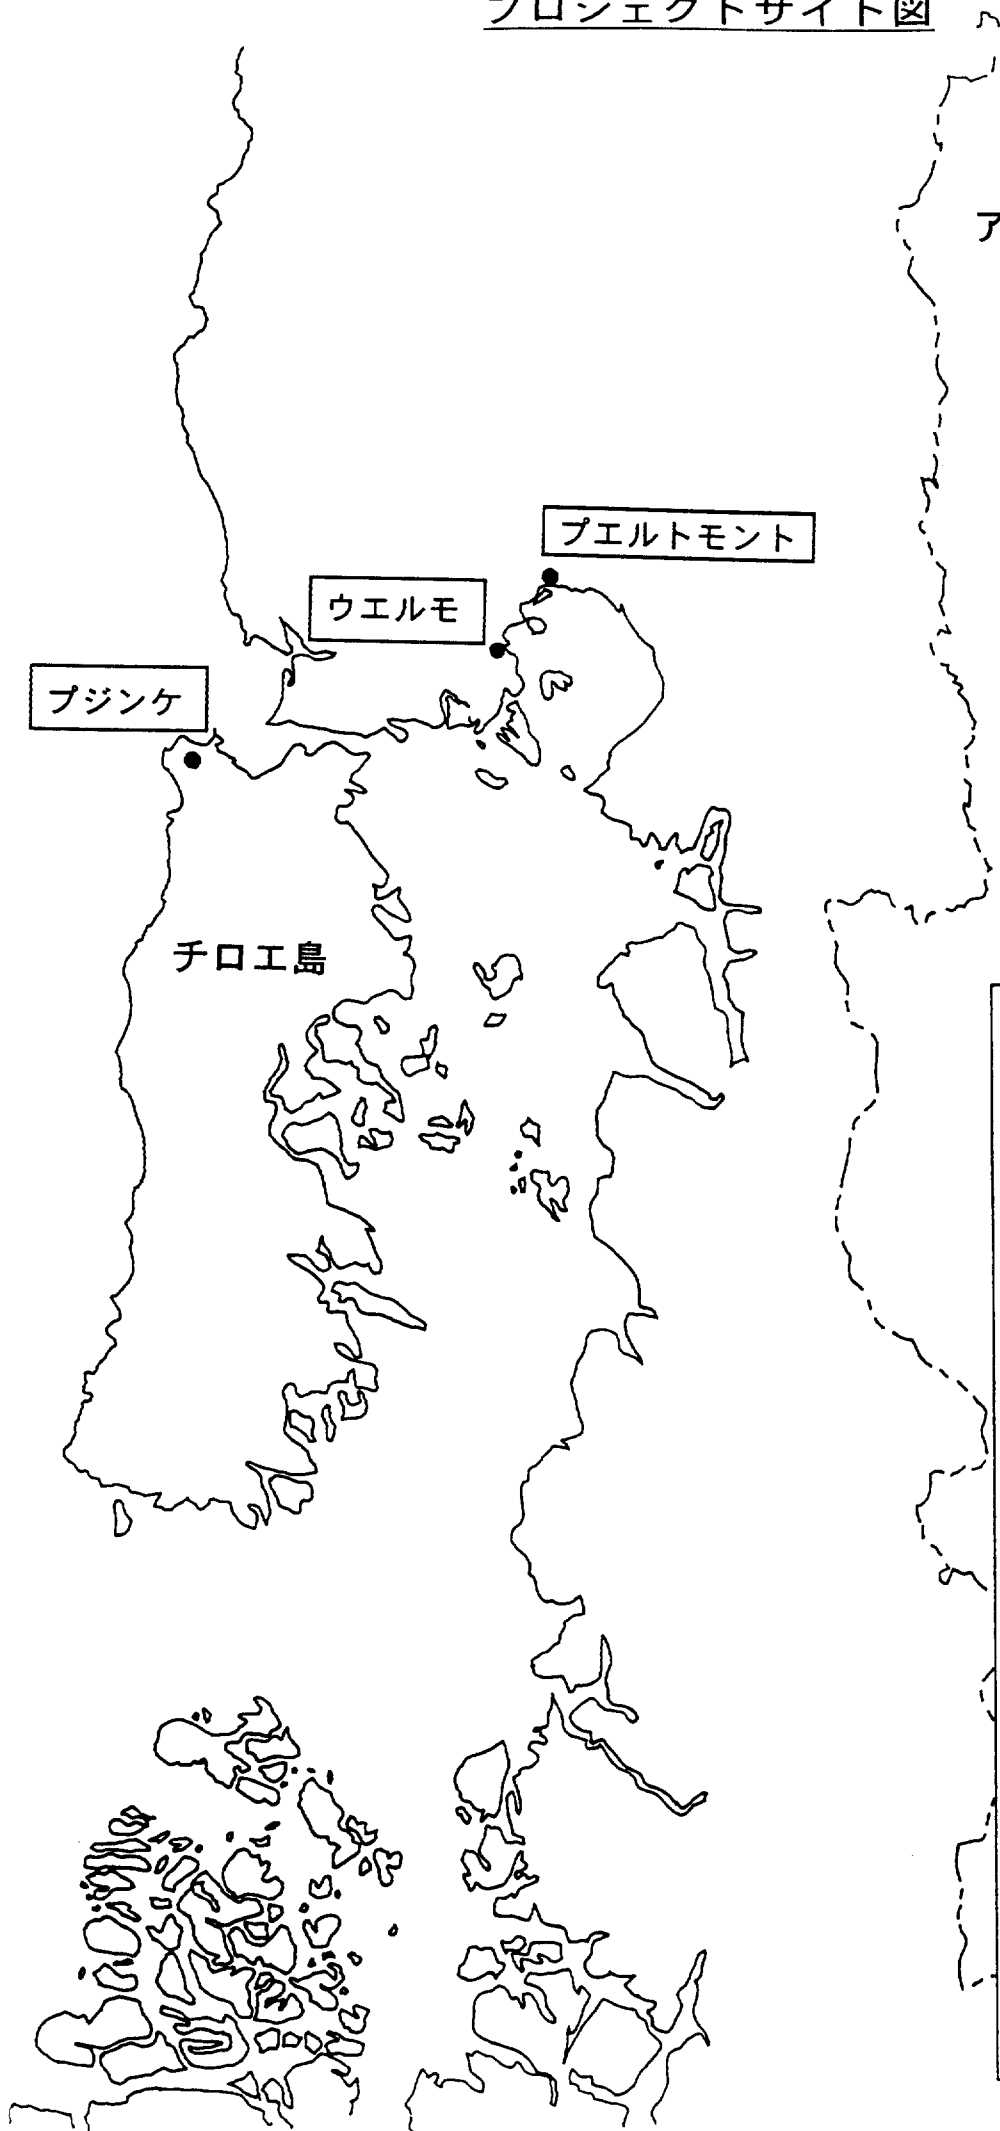


アルゼンティン

プロジェクトサイト位置図






チンキウエ公社  
(種苗センター  
は正面左側)

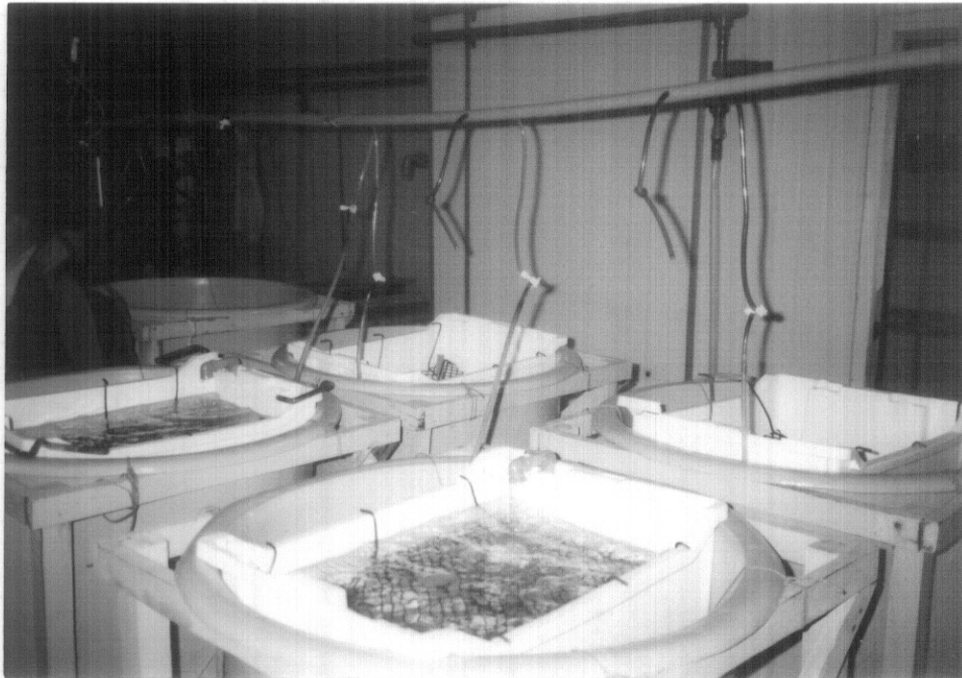

母貝飼育水槽

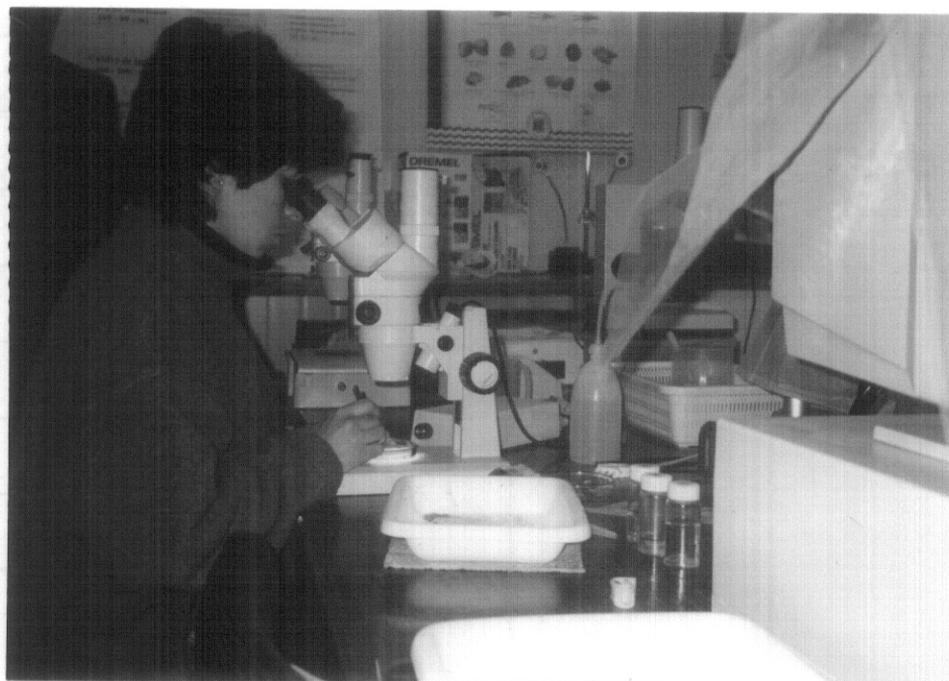

実験室



ブジンケ技術  
訓練センター  
(左：倉庫  
右：事務所)



零細漁民への  
聞き取り調査



第1回合同委員会

## 目次

序文  
地図  
写真

1	計画打合せ調査団の派遣	1
1-1	要請の背景	1
1-2	プロジェクトの概要	1
1-3	調査団派遣の目的	1
1-4	調査団構成	2
1-5	調査日程	2
1-6	主要面談者	3
2	要約	
2-1	現在までの進捗状況	4
2-2	協議結果概要	5
3	プロジェクト実施体制	
3-1	チリ側実施体制	7
3-2	日本側実施体制	9
4	活動の進捗状況	
4-1	貝類種苗生産	10
4-2	貝類養殖	12
4-3	漁村調査	14
5	プロジェクト前半の活動計画	
5-1	貝類種苗生産	17
5-2	貝類養殖	20
5-3	漁村調査	23
5-4	TSI との整合性について	26
6	プロジェクト運営上の留意点	29
7	提言	30
8	団長所感	32
	添付書類	
1	ミニッツ	35
