



# ミャンマー・シードバンク計画 運営指導調査団報告書

平成10年9月

国際協力事業団

農開園
J R
98 - 25

## 序 文

国際協力事業団は、ミャンマー連邦関係機関との討議議事録（R/D）等に基づき、ミャンマー・シードバンク計画に関する技術協力を平成9年6月1日から開始し、今般平成10年8月17日から8月27日まで東京農業大学国際農業開発学科教授 菊池 文雄氏を団長とする運営指導調査団を現地に派遣しました。


同調査団は、本プロジェクトの本格的展開にあたり、詳細年次計画を検討し円滑な運営を行うため、ミャンマー連邦政府関係者と協議及び現地調査を行いました。

本報告書は、同調査団による協議結果等を取りまとめたものであり、今後、本プロジェクトの運営にあたり活用されることを願うものです。

終わりに、この調査にご協力とご支援を頂いた内外の関係各位に対し、心より感謝の意を表します。

平成10年9月

国際協力事業団  
農業開発協力部  
部長 戸水 康二

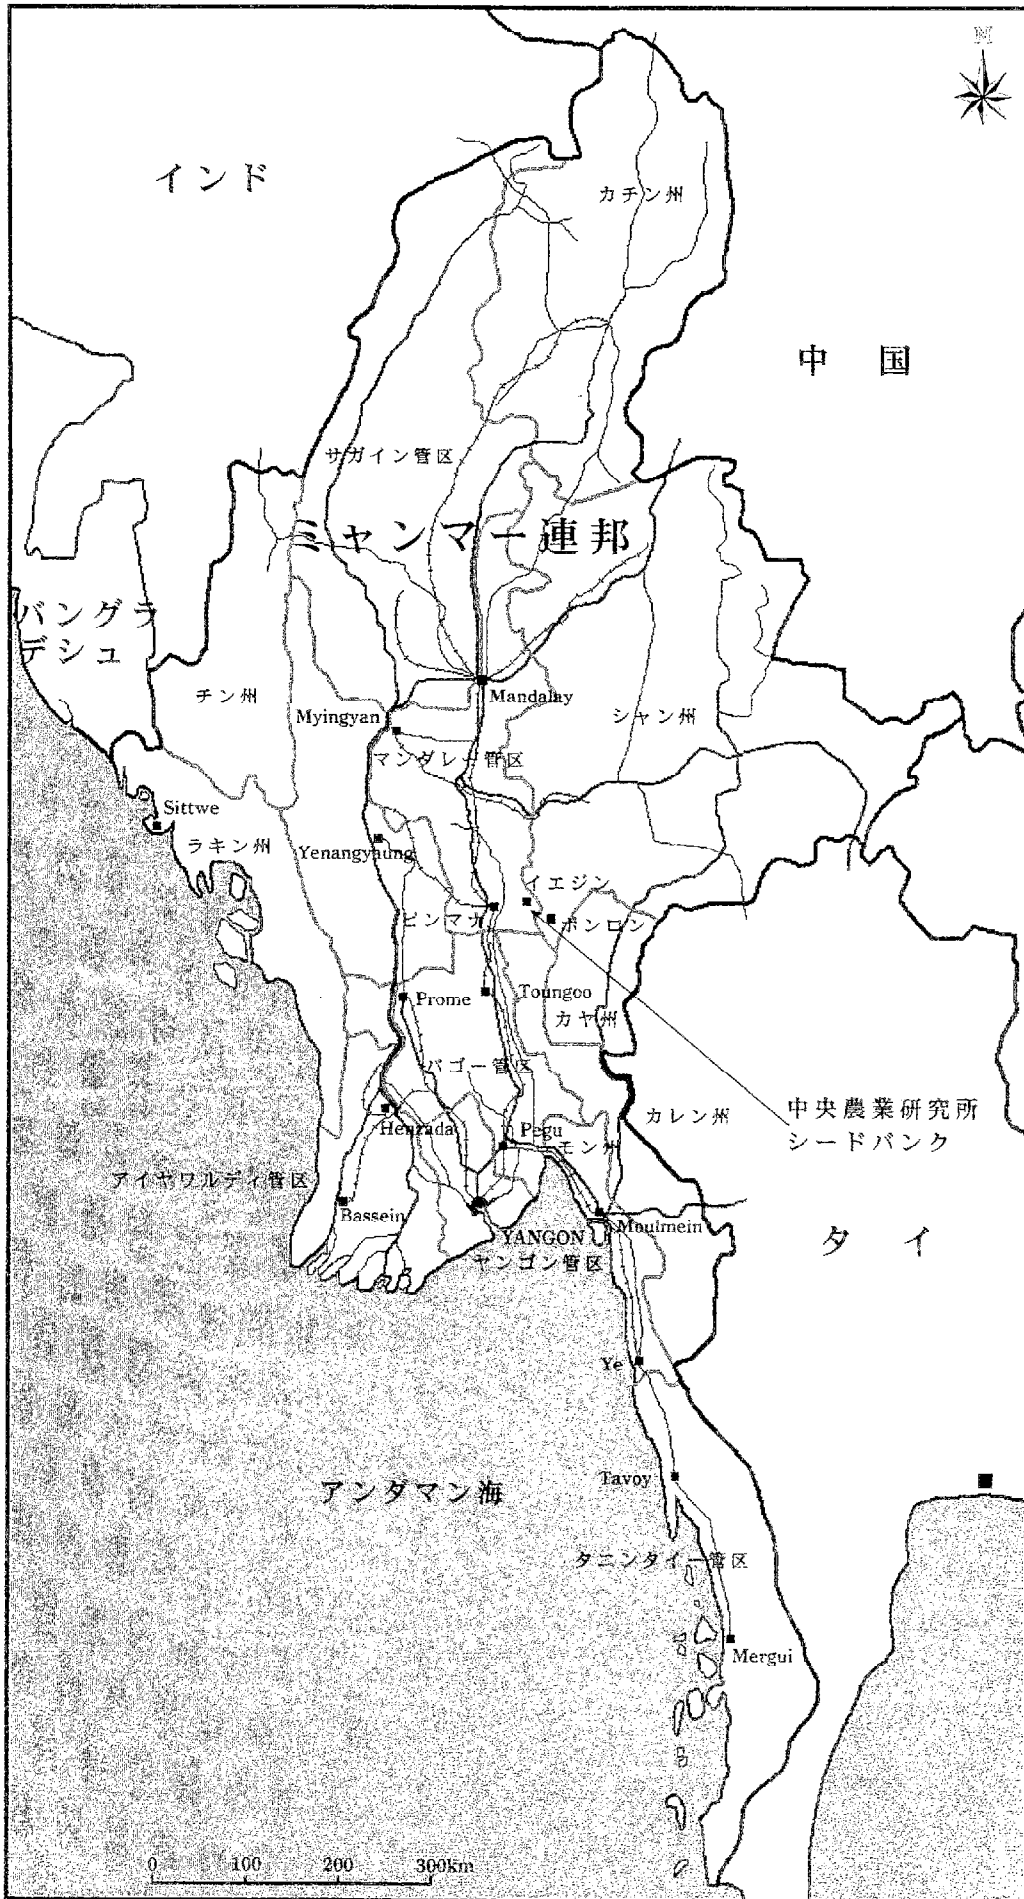

# 目 次

序 文

地 図

第 1 章 運営指導調査団の派遣.....	1
1 - 1 調査団派遣の経緯と目的.....	1
1 - 2 調査団の構成.....	1
1 - 3 調査日程.....	2
1 - 4 主要面談者.....	2
第 2 章 要 約.....	4
第 3 章 暫定実施計画（TSI）の進捗状況 .....	7
3 - 1 協力部門別活動実施状況.....	7
3 - 1 - 1 探索・収集・導入部門.....	7
3 - 1 - 2 増殖・評価部門.....	7
3 - 1 - 3 保存部門.....	8
3 - 1 - 4 データ管理部門.....	8
3 - 1 - 5 中央農業研究所（CARI）の育種部門.....	9
3 - 2 建物・施設.....	10
3 - 3 専門家派遣.....	10
3 - 4 カウンターパート配置及び研修員受入れ.....	11
3 - 5 資機材供与.....	11
3 - 6 ローカルコスト負担事業.....	11
第 4 章 詳細実施計画（DIP） .....	12
第 5 章 プロジェクト実施に係る問題点.....	13
5 - 1 技術面.....	13
5 - 2 運営面.....	14
第 6 章 調査団所見.....	15

付属資料

1 . ミニッツ ( 英文 ) .....	19
2 . Plant genetic resources management system .....	27
3 . Total number of germplasm accessions stored under cold storage .....	28
4 . Collection form and Passport data.....	29
5 . Myanmar descriptor for rice .....	31
6 . Distribution map for different crop germplasms in Myanmar .....	33
7 . Wild rice morphological characterization data .....	46
8 . Stock management data .....	50
9 . Central Agriculture Research Institute (CARI) パンフレット.....	53
