

パラグアイ
中小規模酪農改善計画（仮称）
第1次・第2次短期調査報告書

平成13年10月

国際協力事業団

序 文

国際協力事業団は、パラグアイ共和国政府の要請を受けて平成11年10月、「パラグアイ中小規模酪農改善計画」(仮称)に関する事前調査を実施しましたが、その調査報告を踏まえて、平成12年9月30日から10月30日まで、短期調査員3名を現地に派遣し、プロジェクト協力の内容と実施体制を明確にするための調査を行いました。この第1次短期調査の結果を踏まえ、平成13年8月19日から9月1日まで、第2次短期調査員4名を派遣して、問題点等の追加調査を行うとともに、パラグアイ共和国政府関係者らと、プロジェクトの基本計画策定に係る協議を行いました。

これら2回にわたる短期調査員の派遣を通して、プロジェクトサイトの選定、協力課題の絞り込み、実施体制確認等が行われ、プロジェクト基本計画、プロジェクト・デザイン・マトリックス(PDM)、暫定実施計画の各案作成など、プロジェクト開始に必要な準備が進みました。


本報告書は、第1次及び第2次短期調査員による調査結果等を取りまとめたもので、今後、本プロジェクト実施の検討にあたり、広く活用されることを願うものです。

終わりに、この調査にご協力とご支援を頂いた内外の関係各位に対し、心より感謝の意を表します。

平成13年10月


国際協力事業団
農業開発協力部
理事 中川 和夫

パラグアイ共和国地図

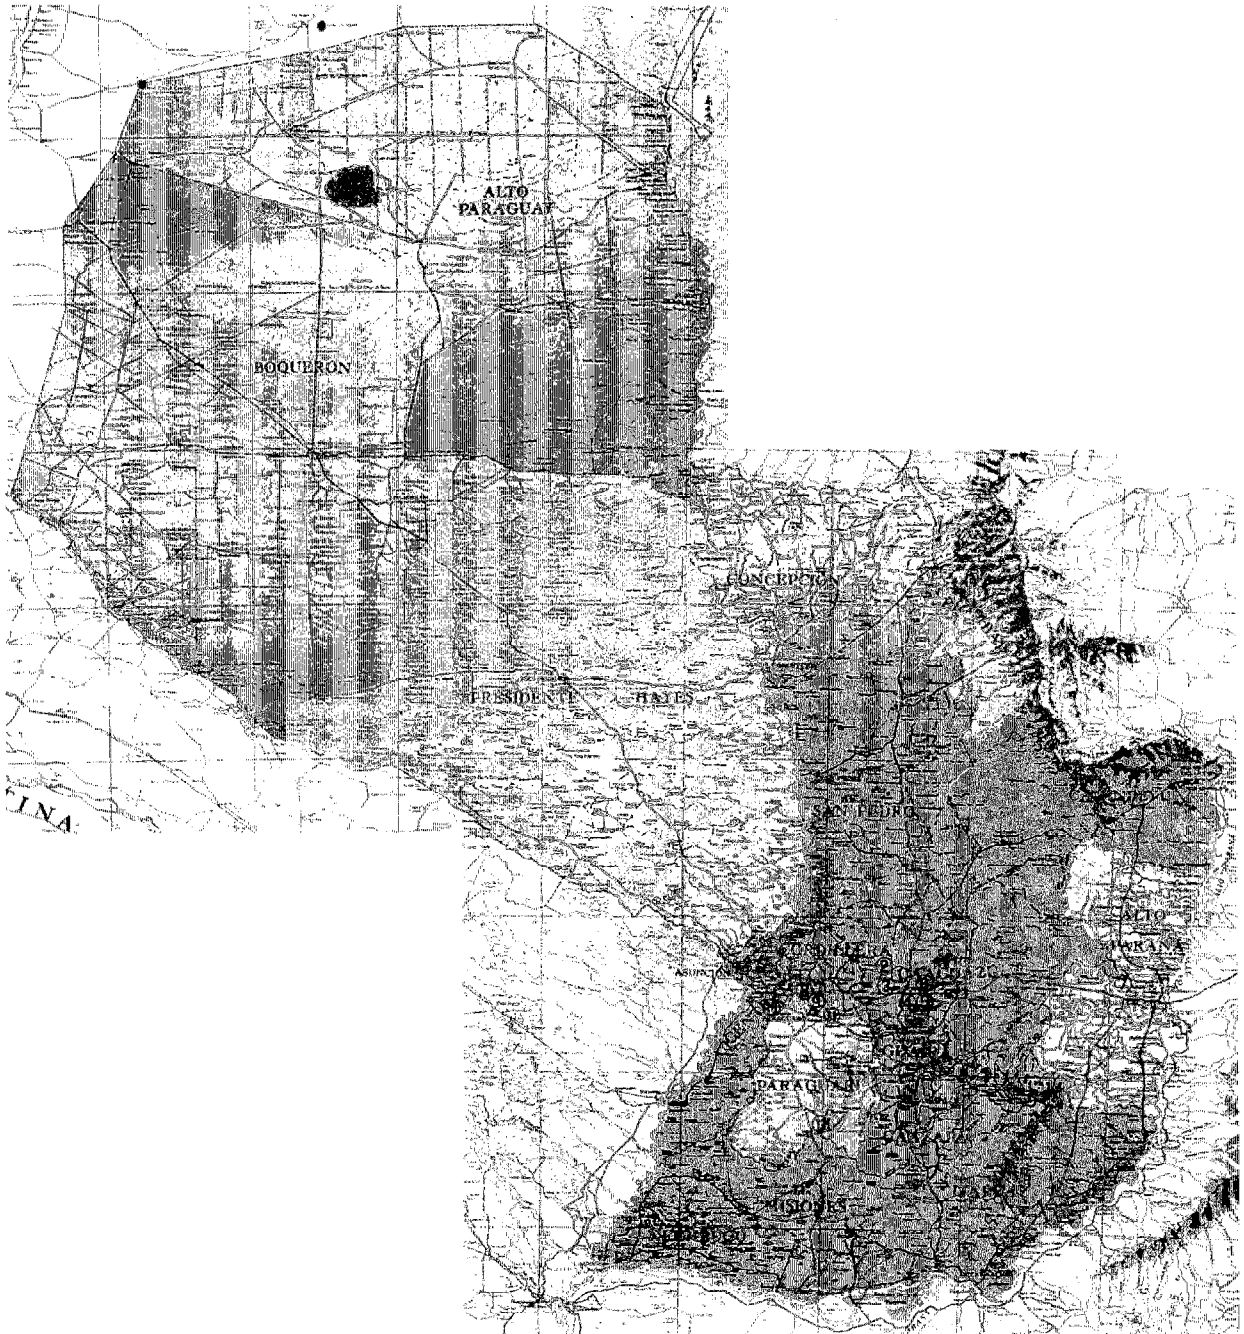



農牧省畜産研究生産局（DIPA）事務局

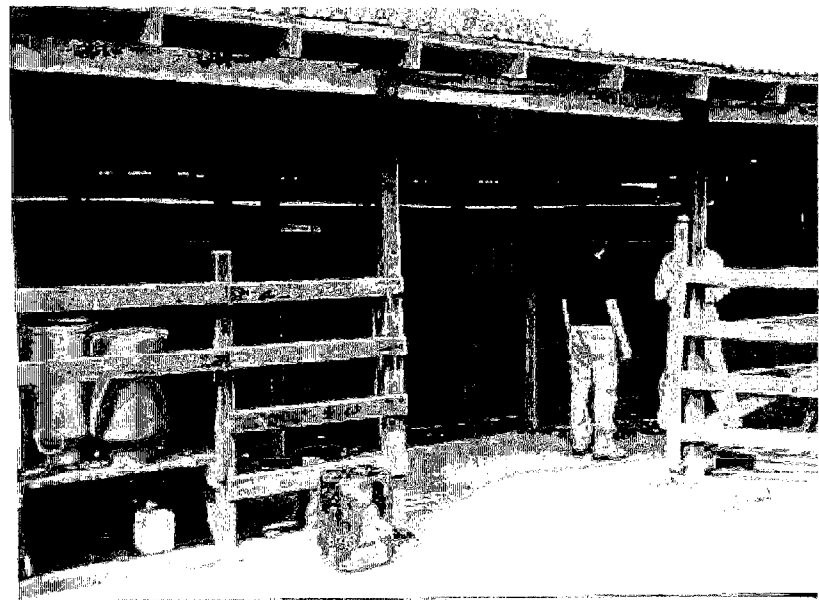

バレリート牧場牛舎



農家の搾乳舎



農家調査



PCMワークショップ

総目次

序文

地図

写真

第 部 第 1 次短期調査報告書

第 1 章 短期調査員の派遣	1
第 2 章 要 約	11
第 3 章 協力分野の現状と実施体制	14
第 4 章 技術協力活動の詳細	26
第 5 章 連携機関との協力	27
第 6 章 協力基本計画（案）	29
第 7 章 次期調査における留意事項	33
附属資料	37

第 部 第 2 次短期調査報告書

第 1 章 第 2 次短期調査員の派遣	81
第 2 章 要 約	84
第 3 章 実施体制	94
第 4 章 PCMワークショップ	108
第 5 章 ワークショップの評価	114
第 6 章 プロジェクト実施に向けた今後の課題（PCM関連事項）	118
第 7 章 本調査から得られた同様な調査への教訓	119
附属資料	123
