

資料：C.4 職業別カテゴリー別最低賃金
1999年1月1日施行（5月24日承認）

1. 建設労働者（ブルーカラー）

カテゴリー分類	最低賃金（FCFA/1時間）
カテゴリー 1 A	167
カテゴリー 1 B	169
カテゴリー 2	178
カテゴリー 3	199
カテゴリー 3 (1年以上)	206
カテゴリー 4 (1等級)	226
カテゴリー 4 (2等級)	224
カテゴリー 5 (1等級)	260
カテゴリー 5 (2等級)	266
カテゴリー 6	274
カテゴリー外	376

2. 建設労働者（ブルーカラー）の分類の基本的な規準

カテゴリー 1 A	経験がない、または必要としない労働者
カテゴリー 1 B	生産的な作業に従事する人（2年毎にクラスが上がる）
カテゴリー 2	特定の業種に従事する人
カテゴリー 3	工員のアシスタント（研修や経験が必要）
カテゴリー 3 (1年以上)	上記で1年毎に5%賃金上昇
カテゴリー 4 (1等級)	特定の仕事に従事する工員 職業適正証明書および経験が必要
カテゴリー 4 (2等級)	1等級を1年以上経験した人
カテゴリー 5 (1等級)	2年以上の実務経験または試験により同等と認められた人
カテゴリー 5 (2等級)	十分な経験を持ち、1等級以上人
カテゴリー 6	その分野において完全な知識を有し、理論と実務を深めた訓練を受けている人 または職業教育終了証明書を持ち6ヶ月以上の実習経験を有している人
カテゴリー外	高度な熟練工

3. 建築の躯体工事の場合の具体例

カテゴリー 1 A	作業内容等 ガードマン、掃除作業員、ランプに明かりをつける人、洗濯作業員
カテゴリー 1 B	工員のアシスタント（カテゴリー 3）のアシスタント
カテゴリー 2	土工（4m ² /日、1m ² 超えるごとに20%賃金アップ）

		モルタルを配合する人 大きなハンマーで岩を砕く人 コンクリートブロック製造で型にはめる人 移動しない建設機械の操作員 トラスを持ち上げる人 カテゴリー 1 で 2 年以上の経験をつんだ人 (工員のアシスタント) 見習期間 3 年を受けた徒弟 職業訓練センターを終了した人 移動する建設機械を 1 種類操作できる人 例：ブルドーザー、ローラーコンプレッサー、ガント リークレーン、グレーダー等 (このカテゴリーの人は 1 年毎に昇給が認められる)
カテゴリー 3		
カテゴリー 3	(1 年以上)	上記で 1 年毎に 5 % 賃金上昇
カテゴリー 4	(1 等級)	石工、型枠工、鉄筋工、レンガ積み工 現場の電気技師 移動しない建設機械を操作し、維持管理・修理ができる人 複数の移動できる建設機械を操作できる人 トラスを組める人 屋根職人、金属加工職人 倉庫番人 (入出庫管理をする人)
カテゴリー 4	(2 等級)	1 等級を 1 年以上経験し、実績が認められた人
カテゴリー 5	(1 等級)	カテゴリー 4 で最低 2 年以上の経験を積み、より上の 技術が認められた人 石工では石垣や石壁の仕上げができる人 石切り工 型枠工や鉄筋工で図面に従って作業ができる人 プラスター仕上げができる人 建設機械全般の運転と維持管理ができる人 トラスを上にあげて、接合ができる人
カテゴリー 5	(2 等級)	1 等級で経験を積み、実績が認められた人
カテゴリー 6		職業教育の終了証明書持った人 またはその分野で全ての仕事をすることができる人 (左官、石工、ペンキ屋) RC において階段の型枠を造れて、自分で図面が引ける 人
カテゴリー外		高度な熟練工

その他の職種として、タイル工、木工大工、ペンキ工、ガラス工、防水工、配管工、電気工等があるが、基本的な規準に従い職種ごとに労働者の分類がされている。

入手先：労働・雇用・青年省

資料:C.5 建設資機材の調達状況

資機材	国内調達		第3国調達	備考
	現地生産品	国内流通 輸入品		
建設工事				
セメント	○	○		国産品はワガドゥグで製造
砂	○			各県で入手可能
砂利	○			各県で入手可能
鉄筋	○	○		素材を輸入しワガドゥグで製品加工
型枠材料		○		木材、合板とも輸入品
鉄骨		○		ヨーロッパ製
コンクリートブロック	○			建設現場で製作
ラテライトブロック	○			産地
磁器タイル		○		
合板		○		ガーナ、コートジボワールから輸入
木材		○		ガーナ、コートジボワールから輸入
アルミ製屋根材	○	○		素材を輸入し製品加工
波形亜鉛鉄板	○	○		素材を輸入し製品加工
ファイバーセメント板		○		
スチール製ドア、サッシュ	○			国内で製作
木製ドア、サッシュ	○			国内で製作
建具金物		○		
ガラス		○		
ガラスブロック		○		
塗料(エマルジョンペイント)		○		
什器・備品 (机、椅子、収納棚等)	○			国内で製作
給排水衛生設備工事				
PVC管		○		
金属製配管類		○		
配管金物		○		
衛生陶器		○		
水栓金物		○		
給水井戸用ハンドポンプ		○		
電気設備工事				
分電盤		○		
PVC配管材料		○		
電線・ケーブル		○		
照明器具		○		
スイッチ・コンセント		○		
発電機		○		

凡例 ○:調達先

資料：C.6 建設資機材コスト（1）

調査先	Hage 社 (資機材卸売・製造業者) Tel: 30.68.28		
取扱商品:	鉄骨、鉄筋、金属屋根材（波板、折版）、金属配管材料、コンクリートミキサー、コンクリート用電動リフト、発電機、電動工具等の建設機材		
〔商品価格〕	厚み	価格	
折版屋根材 (Tole Bac)	アルミ製	45/100 (0.45mm)	4,000 FCFA/m
	アルミ製	60/100 (0.60mm)	5,500 FCFA/m
	アルミ製	70/100 (0.70mm)	6,500 FCFA/m
	亜鉛メッキ鋼板	35/100 (0.35mm)	2,500 FCFA/m
	アルジंक	35/100 (0.35mm)	2,500 FCFA/m
	(備考)		
	1. ワガドゥグの自社工場で製品加工、幅 750 長さは、指定長さで製造可能 (1m単位)		
	2. アルミ製 70/100 は、高価で特殊なサイズであることから、めったにでる商品でなく通常は売れないが、最近小学校建設で使用された（日本と AfD 案件で使用）。学校建設プロジェクトで必要になれば、素材を取り寄せ納品は可能である。		
	(定尺長さ 12m)		
鉄骨	H型鋼	IPN80 (高さ 80mm)	3,000 FCFA/本
		IPN100 (高さ 100mm)	4,200 FCFA/本
	(備考)		
	IPN80 および 100 は、小学校建設の屋根の母屋材に使用される		
	(異形鉄筋径) (tonあたり本数)		
鉄筋	6mm	375 本/ton	325,000 FCFA/ton (867 FCFA/本)
	8mm	210 本/ton	325,000 FCFA/ton (1,548 FCFA/本)
	10mm	135 本/ton	325,000 FCFA/ton (2,407 FCFA/本)
	12mm	93 本/ton	325,000 FCFA/ton (3,495 FCFA/本)
	(備考)		
	ワガドゥグとボボジュラッソの自社工場で製品加工		
	能力		
発電機		5 KVA	135 万 FCFA/台
		3.5 KVA	110 万 FCFA/台
	アルミ屋根材（折版、長さ 9m）の 100 枚の参考見積価格と重量		
	見積価格（2003 年 6 月時点）:		
	60/100	(49,500 FCFA/枚)	4,95,000 FCFA/100 枚
	70/100	(58,500 FCFA/枚)	5,85,000 FCFA/100 枚
	重量約：1.44 トン/100 枚		
	(60/100 厚材の 1 mあたり重量が 1.6kg/m であり、9mで 14.4kg/枚)		
備考	Hage 社の自社工場はワガドゥグとボボジュラッソにあるが、ボボジュラッソでは鉄筋の加工のみである。		
	同社で扱う商品の販売価格は、2 都市とも同じに設定されている。		

資料：C.6 建設資機材コスト（2）

1. ワガドゥグ市内の建設資材小売店調査（2003年6月8日）

調査先 店舗 1	MENUISERIE YAMEOGO（ヤメオゴ建具店）屋根材取扱い業者 代表 DIANDA MARC Tel: 30.16.19 24.02.48 Sankariare
取扱い商品：	金属屋根材
〔商品価格〕	アルジnk（ALUZINC）：アルミメッキ鋼板、波板 規格：800 x 2,000, 27/100 3,250 FCFA/枚
屋根材	亜鉛メッキ鋼板、波板（トタン板） 規格：800 x 2,000, 22/100 価格 2,800 FCFA/枚 （備考） ・この店で扱っているアルジnkの厚みは1種類のみ ・素材を輸入し、Metal Bulkinaで製品加工 ・アルジnkの在庫は十分あり、注文すれば1日で入手可能 ・店頭には折版屋根材（Tole Bac）の在庫はなし

調査先 店舗 2	ETOAF 商店 鉄部材取扱い業者 代表 OUEDRAOGO ADAMA Tel: 31.52.26 24.84.69 Sankariare
取扱い商品：	セメント、左官材料、ペンキ、金属屋根材
〔商品価格〕	
左官材料	壁などの仕上げ用左官材料 12,500 FCFA/25kg bag
セメント	ブルキナセメント（国産、ワガで製造） 97,500 FCFA/50kg bag トーゴからの輸入品 100,000 FCFA/50kg bag （備考） 店の説明では、国産も輸入品も品質は変わらない。以前は輸入品をコートジボワールから輸入していた。 ※1：セメントの販売価格が店舗6（FCORAF 商店）に比べかなり高い。 ※2：フランス語圏 8 カ国間の物品の輸出入において関税がかからない 取り決めになっている。 コートジボワール、セネガル、マリ、ニジェール、ブルキナファソ、ベニン、トーゴ、ギニアビサウ（1994年、西アフリカ経済通貨同盟、8カ国）
ペンキ	油性ペイント（コートジボワールから輸入） 40,000 FCFA/20kg 缶 7,500 CFA/3kg 缶 水性ペイント（コートジボワールから輸入） 14,000 FCFA/30kg 缶 （備考） 店の説明では、ブルキナ産のペンキもあり、価格は同じで品質は変わらない。以前はコートジボワールからの輸入品の方が安かった。

折版屋根材	アルミジンク	35/100	2,600 FCFA/m
(Tole Bac)	アルミ製	45/100	4,750 FCFA/m
		60/100	5,800 FCFA/m
規格：幅 750、長さは注文に応じて製作 (備考)			
折版屋根材 (Tole Bac トールバック) について			
店の説明によると、折版屋根材を製品加工している工場がワガドゥグにたくさんある。			

調査先 店舗 3	Somac 商店 鉄製品加工業者 代表 OUADRAOGO OUSSENI Tel: 31.52.26 24.84.69 Sankariare		
取扱い商品：	スチール建具		
[商品価格]	(ガラリ付 スチール枠、丁番、取っ手、錆止め塗装まで)		
スチールドア	片開き	W800 x H1,800	16,000 FCFA/一式
	両開き	W1,600 x H1,800	40,000 FCFA/一式
可動ルーバー付 スチール窓		W1,600 x H1,000	20,000 FCFA/一式
(備考)			
店の説明によると、価格の安さから、一般に中国製の丁番が使用されるが、モロッコ製の方が頑丈で品質がよい。			
(丁番の価格例：モロッコ製 1,500 FCFA/個、中国製 700 FCFA/個)			

調査先 店舗 4	ETOAF 商店 (店舗 2 と同系列店) 鉄部材取扱い業者 店員 KABORE BOUREIMO Tel: 25.04.63 Sankariare		
取扱い商品：	鉄筋、鉄骨材		
[商品価格]	(異形鉄筋径)	(定尺長さ 12m)	
鉄筋	6mm	1,280 FCFA/本	
	8mm	1,750 FCFA/本	
	10mm	3,000 FCFA/本	
	12mm	4,000 FCFA/本	
H型鋼	(高さ)	(定尺長さ 12m)	
	80	3,500 FCFA/本	
	100	5,000 FCFA/本	
	120	7,000 FCFA/本	
(備考)			
・取扱い商品は輸入品で、輸入卸売り業者から仕入れて販売			
・価格は店頭渡し価格			
・輸送費は、品物の重量と輸送距離により決まるが、詳しくは、輸送業者に問合せ、見積をとることが可能			

調査先 店舗 5	TAPSOBA Idrissa 商会 TAPSOBA IDRISSA Tel: 33. 20. 11 28. 38. 35 Sankariare	合板取扱い業者
取扱い商品： 合板		
〔商品価格〕	品物はガーナ製とコートジボワール製があり、種類は一般的に使用される色が白っぽいものと、家具などに使用される赤っぽいものがある。	
合板	規格：2,400 x 1,220	
	ガーナ製	
	(白)	(赤)
	5mm 3,750 FCFA/枚	5mm 8,000 FCFA/枚
	10mm 7,000 FCFA/枚	
	16mm 8,500 FCFA/枚	
	20mm 10,500 FCFA/枚	20mm 15,000 FCFA/枚
	コートジボワール製	
	(白)	(赤)
	5mm 4,000 FCFA/枚	5mm 8,000 FCFA/枚
	10mm 8,000 FCFA/枚	
	15mm 9,000 FCFA/枚	
	20mm 11,000 FCFA/枚	20mm 19,500 FCFA/枚
	(備考)	
	<ul style="list-style-type: none"> ・コートジボワール製はガーナ製に比べ少し品質がよい。 ・価格は調査日の価格（価格が毎日変動する） ・ガーナ製は調達上、量的に問題はないが、ガーナ製の価格は上がる可能性がある。その理由は、現在コートジボワール製の輸入が止まっており、ガーナ製の輸入品のみのため価格上の競争性が働かないためである。 ・「ブ」国内に建築用木材として利用できる資源がほとんどないため、家具用および構造材、建具用の木材はコートジボワールやガーナから全て輸入している。 ・ワガドゥグは、ガーナからの距離が約147km、コートジボワールからは400km以上はなれていることから、材料の輸入にあたってガーナからの法が調達しやすい位置にある。 	

調査先 店舗 6	FCORAF 商店 CONGO ROSUAE Tel: 31. 12. 47 21. 30. 95
取扱い商品： セメント	
〔商品価格〕	種類
セメント	トーゴ製 (CPJ 35-50kg) 4,750 FCFA/50kg bag
	ブルキナ製 (CPJ 45-50kg) 4,750 FCFA/50kg bag
	(CPA 45-50kg) 5,000 FCFA/50kg bag
	(備考)
	・種類 CPJ：一般用 CPA：建物の仕上げ用で品質がよい

- ・種類 35、45：数字が大きいほど品質が高い
- ・VATについて：工場から仕入れる場合 VATがかかるが、小売では商品に VATが掛からない

2. その他の参考コスト情報

車両用燃料代

ワガドゥグ (2003年6月22日、ガソリンスタンド Total 調べ)

ディーゼルオイル	371 FCFA/L	(76 円/L)
ガソリン (レギュラー)	458 FCFA/L	(94 円/L)
ガソリン (スーパー)	521 FCFA/L	(107 円/L)

ボボジュラッソ (2003年6月23日、ガソリンスタンド Shell 調べ)

ディーゼルオイル	376 FCFA/L	(77 円/L)
ガソリン (レギュラー)	467 FCFA/L	(96 円/L)
ガソリン (スーパー)	534 FCFA/L	(108 円/L)

※ 1 円 = 4.86FCFA として算定

(備考)

地方のガソリンスタンドほど、単価が高くなる。YATENGA 県の中心的都市 Ouahigouya では、ディーゼルオイルが 381 FCFA/L (78 円/L) であった。

車両借上げ費用

レンタカー会社：AVIS (ワガドゥグ)

車代 (燃料費別)

- ・一般乗用車 (PEUGEOT 406 SL) 45,000 FCFA/日
- ・4 輪駆動車 (TOYOTA LAND CRUISER PRADO GX) 60,000 FCFA/日
- ・ピックアップバン (TOYOTA HILUX PICK-UP 4x4 DC) 50,000 FCFA/日

運転手

- ・ワガドゥグ市内 5,000 FCFA/日
- ・ブルキナファソ内の郊外 7,500 FCFA/日
- ・ブルキナファソ国外 10,000 FCFA/日

別途、保険料・VAT

資料：C.7 井戸工事落札費用内訳 (1)

〔井戸掘り工事〕

工区A：A社

2003年5月実施

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
I	DEPLACEMENT ET INSTALLATION				
1.1	Amenée et repli de chantier	FF	1	7 000 000	7 000 000
1.2	Déplacement de site en site	U	44	200 000	8 800 000
1.3	Installation	U	45	150 000	6 750 000
II	FORATION				-
2.1	Foration en terrain tendre en 9"7/8 (30 m en moyenne)	ml	1800	18 000	32 400 000
2.2	Foration en terrain dur en 6"1/2 (40 m en moyenne)	ml	2250	20 000	45 000 000
III	EQUIPEMENT DU FORAGE				-
3.1	Fourniture et pose de tubages en PVC plein 4"1/2	ml	1800	10 000	18 000 000
3.2	Fourniture et pose de tubage en PVC crépinés 4"1/2	ml	2295	11 000	25 245 000
3.3	Fourniture et mise en place d'un massif filtrant	U	45	80 000	3 600 000
3.4	Mise en place d'un bouchon de pied	U	45	10 000	450 000
3.5	Mise en place d'un bouchon d'argile	U	45	75 000	3 375 000
3.6	Mise en place de la cimentation de tête	U	45	45 000	2 025 000
3.7	Mise en place du capot de protection	U	45	7 500	337 500
IV	DEVELOPPEMENT ET ESSAI DE DEBITS				-
4.1	Développement à l'air lift (2,5h)	U	45	125 000	5 625 000
4.2	Essai de débit	U	45	175 000	7 875 000
4.3	Analyses physico-chimiques	U	45	50 000	2 250 000
	TOTAL HT				168 732 500
	TVA				30 371 850
	TOTAL TTC				199 104 350

工区B：B社

2003年5月実施

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
I	DEPLACEMENT ET INSTALLATION				
1.1	Amenée et repli de chantier	FF	1	5 000 000	5 000 000
1.2	Déplacement de site en site	U	54	200 000	10 800 000
1.3	Installation	U	55	50 000	2 750 000
II	FORATION				-
2.1	Foration en terrain tendre en 9"7/8 (30 m en moyenne)	ml	2200	23 000	50 600 000
2.2	Foration en terrain dur en 6"1/2 (40 m en moyenne)	ml	2750	22 000	60 500 000
III	EQUIPEMENT DU FORAGE				-
3.1	Fourniture et pose de tubages en PVC plein 4"1/2	ml	2200	11 000	24 200 000
3.2	Fourniture et pose de tubage en PVC crépinés 4"1/2	ml	2805	11 500	32 257 500
3.3	Fourniture et mise en place d'un massif filtrant	U	55	40 000	2 200 000
3.4	Mise en place d'un bouchon de pied	U	55	5 000	275 000
3.5	Mise en place d'un bouchon d'argile	U	55	50 000	2 750 000
3.6	Mise en place de la cimentation de tête	U	55	50 000	2 750 000
3.7	Mise en place du capot de protection	U	55	4 000	220 000
IV	DEVELOPPEMENT ET ESSAI DE DEBITS				-
4.1	Développement à l'air lift (2,5h)	U	55	80 000	4 400 000
4.2	Essai de débit	U	55	100 000	5 500 000
4.3	Analyses physico-chimiques	U	55	50 000	2 750 000
	TOTAL HT				206 952 500
	TVA				37 251 450
	TOTAL TTC				244 203 950

入手先：農業・水利・漁業資源省

資料：C.7 井戸工事落札費用内訳 (2)

[ポンプ設置工事]

N° Prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire (F.CFA)	Prix total (F.CFA)
I	Mobilisation, déplacement et installation				
1.1	Amenée – repli de chantier	FF	FF		6 500 000
1.2	Déplacement de site en site	U	109	110 000	11 990 000
1.3	installation	U	110	35 000	3 850 000
II	Construction margelle et aménagement autour du forage				-
2.1	Démolition de margelle	U	0	60 000	-
2.2	Démolition de superstructure	U	0	50 000	-
2.3	Construction de margelle	U	100	180 000	18 000 000
2.4	Construction de superstructure	U	100	750 000	75 000 000
III	Fourniture et installation de pompe à motricité humaine et prestations connexes				-
3.1	Fourniture et magasinage des pompes y compris tout accessoires ¹				-
	a. [type de pompe]	U	50	332 000	16 600 000
	b	U	50	350 000	17 500 000
3.2	Fourniture et magasinage des éléments de colonnes y compris tout accessoires ²				-
	a.	Ml	4400	9 200	40 480 000
3.3	Trousseau de clés pour réparateurs villageois	U	100	20 000	2 000 000
3.4	Rémunération de l'artisan réparateur (AR) pour l'installation d'une pompe et frais de contrôle du fournisseur	U	100	47 000	4 700 000
3.5	Rémunération de l'artisan réparateur (AR) pour les tournées de maintenance et frais de contrôle du fournisseur	FF			5 600 000
3.6	Formation des Artisans Réparateurs	FF			5 800 000
3.7	Formation des mécaniciens villageois et frais de contrôle par le fournisseur	FF			2 940 000
3.8	Désinfection du forage	U	100	4 500	450 000
	Total HT				211 410 000
	TVA 18%				38 053 800
	Total TTC				249 463 800

入手先：農業・水利・漁業資源省

資料：C.7 井戸工事落札費用内訳 (3)

[コンサルタント]

140本の井戸工事に対する ・施工監理
 ・住民への啓発活動

CADRE DU DEVIS ESTIMATIF DES PRESTATIONS DE L'INGENIEUR CONSEIL


Prix N°	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	TOTAL (F CFA)
1	HYDROGEOLOGUE CHEF DE MISSION				
1.1	Honoraires	Mois	7	350 000	2 450 000
1.2	Logement	Mois	7	15 000	105 000
1.3	Déplacement	Mois	7	100 000	700 000
2	CONTROLEURS TRAVAUX				
2.1	Honoraires	Mois	5	2 250 000	11 250 000
2.2	Déplacement	Mois	5	750 000	3 750 000
3	SOCIOLOGUE				
3.1	Honoraires	hm	7	555 000	3 885 000
3.2	Déplacement	Mois	7	175 000	1 225 000
4	ANIMATEURS				
4.1	Honoraires	Mois	7	1 000 000	7 000 000
4.2	Déplacement	Mois	7	1 000 000	7 000 000
5	EQUIPE D'IMPLANTATION				
5.1	Honoraires	Mois	5	4 400 000	22 000 000
5.2	Déplacement	Mois	5	560 000	2 800 000
6	FRAIS DE SECRETARIAT				
6	FRAIS DE SECRETARIAT	Mois	7	175 000	1 225 000
7	RAPPORTS MENSUELS				
7	RAPPORTS MENSUELS	U	7	25 000	175 000
8	RAPPORT FINAL				
8	RAPPORT FINAL	U	1	750 000	750 000
	TOTAL HTVA				64 315 000
	TVA = 18%				11 576 700
	TOTAL TTC				75 891 700

入手先：農業・水利・漁業資源省

LOT 3: REALISATION D'UN (1) FORAGE PRODUCTIF
AU SECTEUR 17 DE OUAGADOUGOU


COUPE D'EQUIPEMENT DU FORAGE

井戸施設断面図

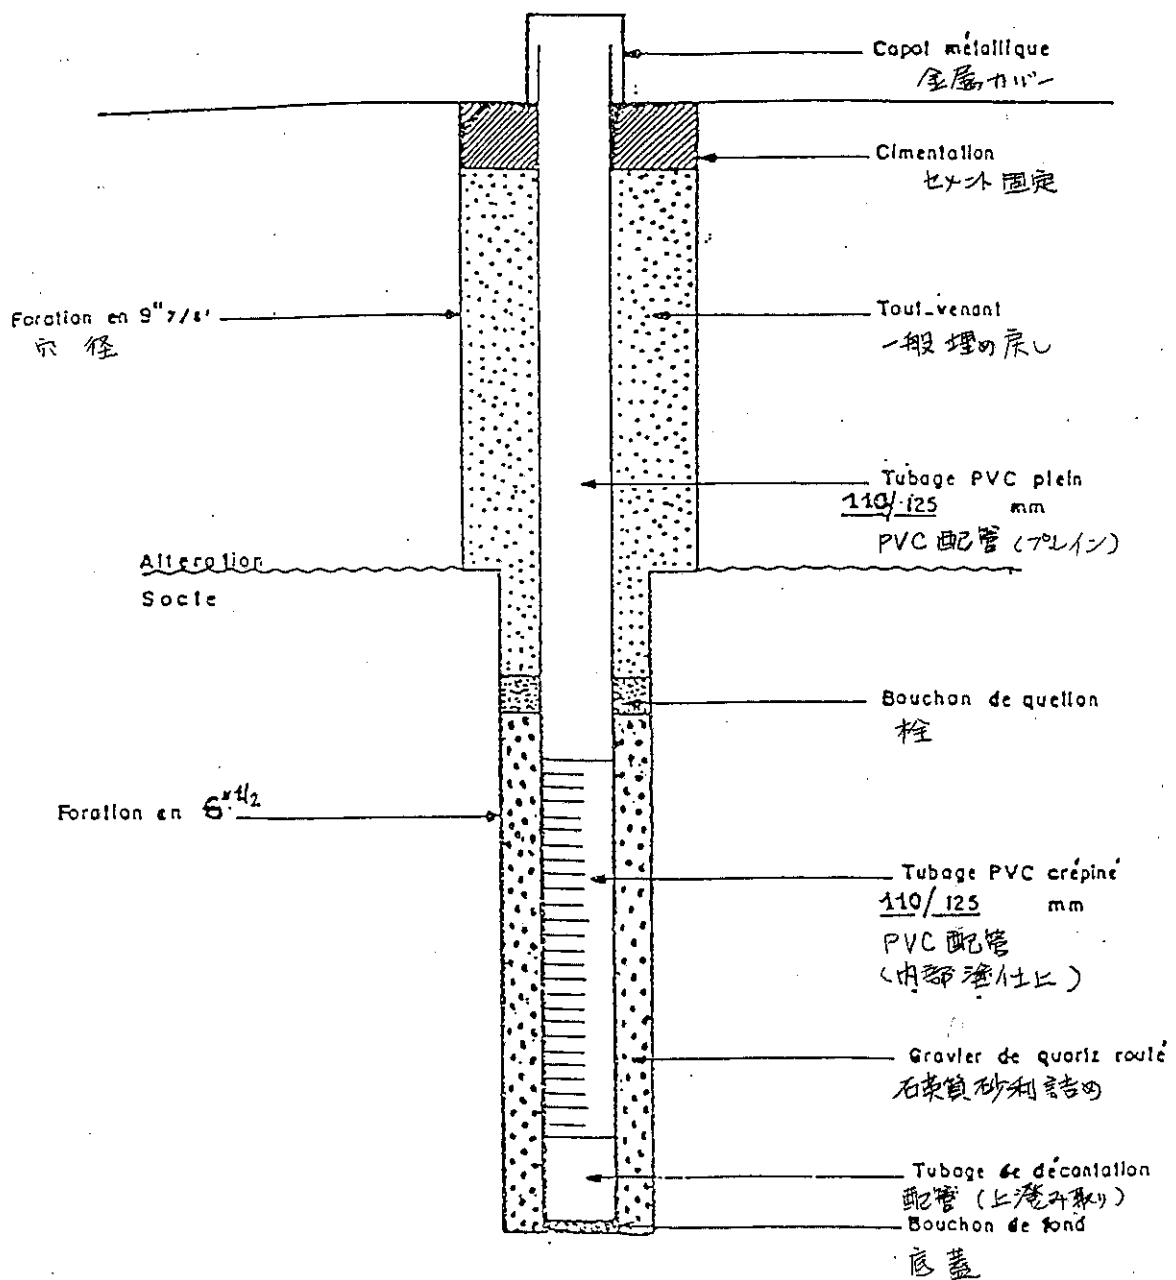

入手先：Faso Baara

AMENAGEMENT DES ABORDS

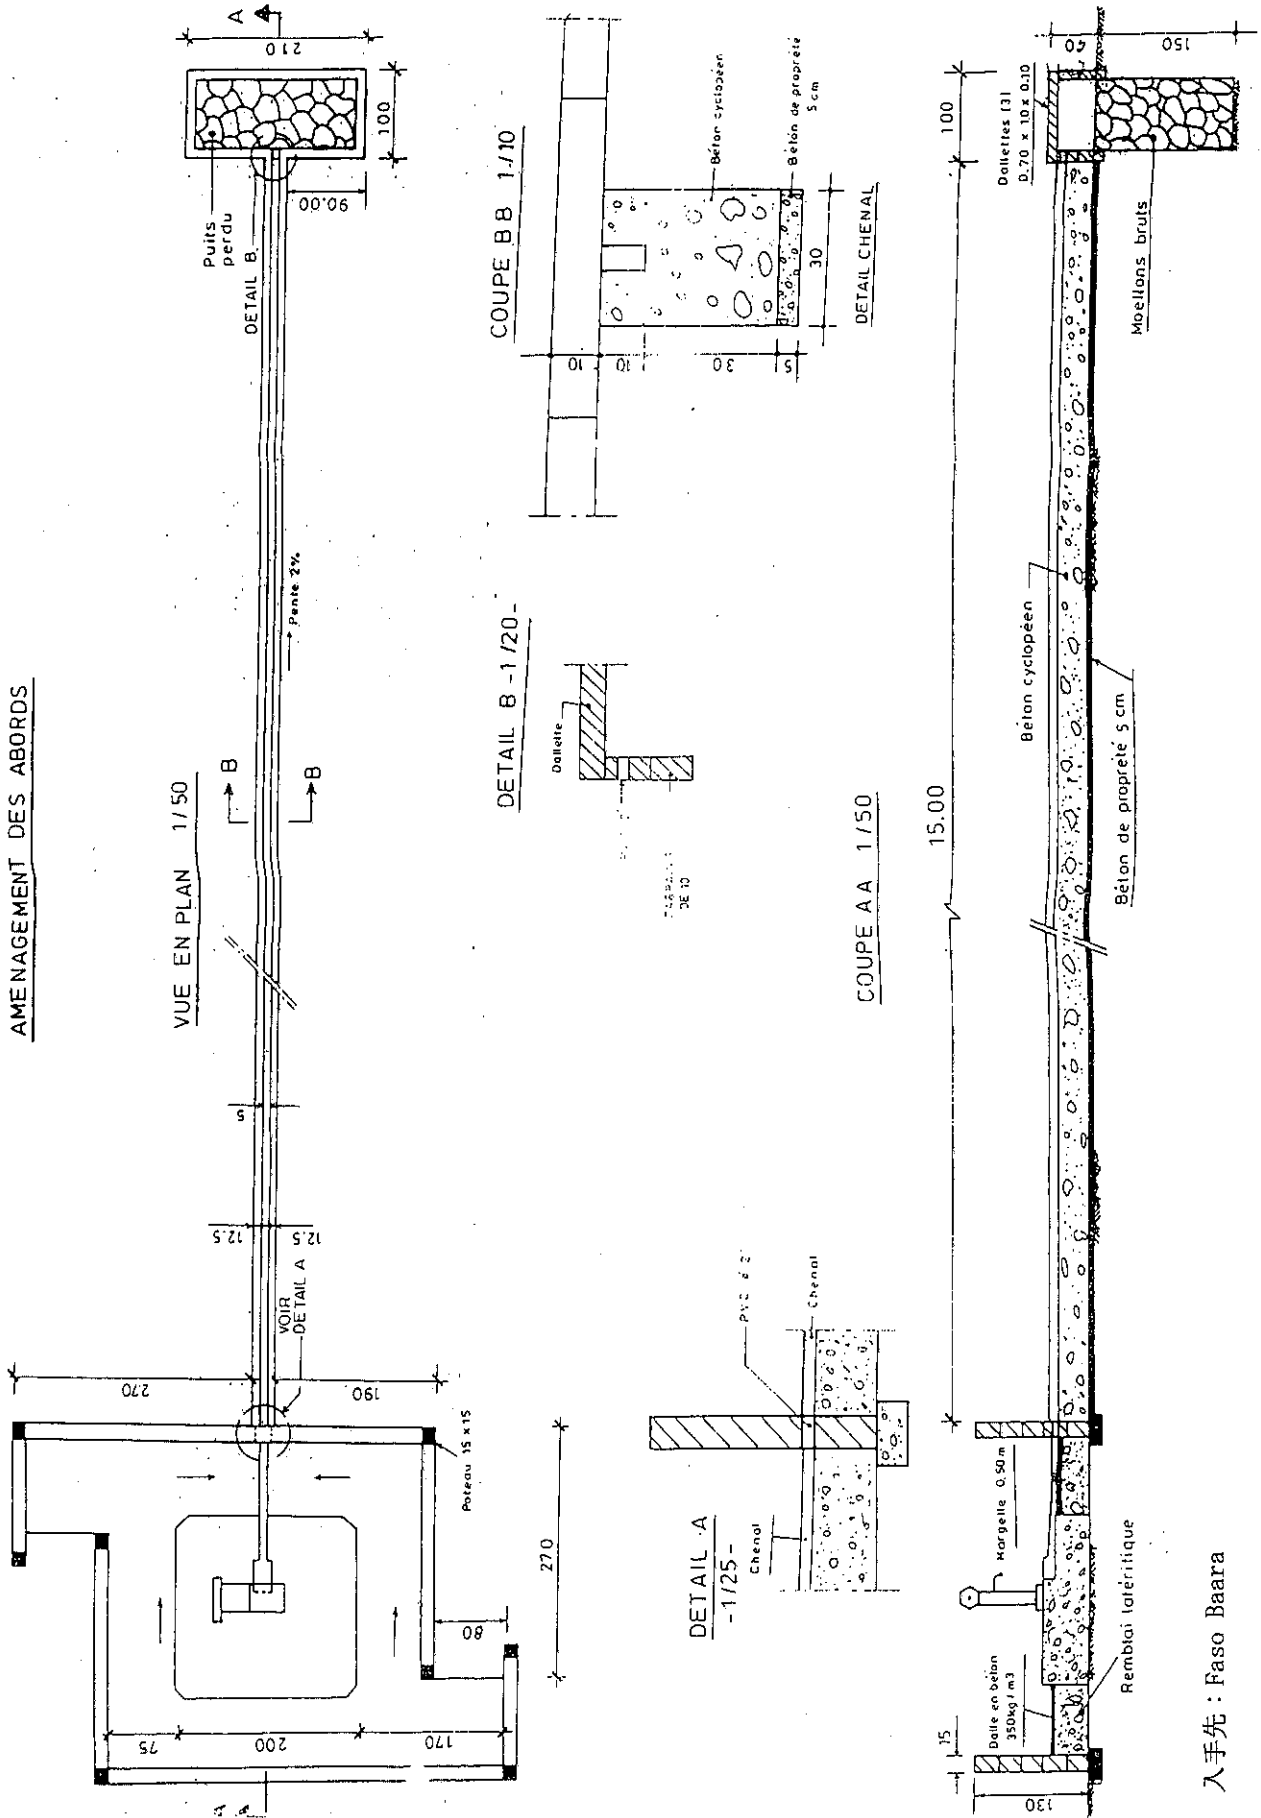

入手先：Faso Baara

[PDDEB]

MINISTÈRE DE L' ENSEIGNEMENT DE BASE
ET DE L' ALPHABÉTISATION
SECRETARIAT GENERAL
BUREAU DES PROJETS EDUCATION

Budget de construction et d'équipement de 129 Ecoles

PROVINCES/ACTIVITES	ESTIMATION BUDGETAIRE				Avance initiale 40% du coût total	Prise en charge par bailleur		
	Unité	Nbre	P.U	Montant		A IDA	B Pays Bas	C ACDI
1. DPEBA DU BAM					104 720 000			
1.1. Construction d'Ecoles et latrines	Ecole	10	23 480 000	261 800 000				
<i>CONSTRUCTIONS SCOLAIRES</i>				234 800 000				
1.2. Tables bancs, chaises, tables de maître, etc..	lot	10	2 520 000	25 200 000				
<i>EQUIPEMENTS SCOLAIRES</i>				1 800 000				
<i>SUPERVISION DES OPERATIONS</i>				1 800 000				
Carburant, frais de missions, entretien motos, fournitures, etc..	Ecole	10	180 000					
2. DPEBA DES BALES					94 248 000			
1.1. Construction d'Ecoles et latrines	Ecole	9	23 480 000	235 620 000				
<i>CONSTRUCTIONS SCOLAIRES</i>				211 320 000				
1.2. Tables bancs, chaises, tables de maître, etc..	lot	9	2 520 000	22 680 000				
<i>EQUIPEMENTS SCOLAIRES</i>				22 680 000				
<i>SUPERVISION DES OPERATIONS</i>				1 620 000				
Carburant, frais de missions, entretien motos, fournitures, etc..	Ecole	9	180 000	1 620 000				
3. DPEBA DES BANWA					10 472 000			
1.1. Construction d'Ecoles et latrines	Ecole	1	23 480 000	26 180 000				
<i>CONSTRUCTIONS SCOLAIRES</i>				23 480 000				
1.2. Tables bancs, chaises, tables de maître, etc..	lot	1	2 520 000	2 520 000				
<i>EQUIPEMENTS SCOLAIRES</i>				180 000				
<i>SUPERVISION DES OPERATIONS</i>				180 000				
Carburant, frais de missions, entretien motos, fournitures, etc..	Ecole	1	180 000					
4. DPEBA DU BAZEGA					125 664 000			
1.1. Construction d'Ecoles et latrines	Ecole	12	23 480 000	314 160 000				
<i>CONSTRUCTIONS SCOLAIRES</i>				281 760 000				
1.2. Tables bancs, chaises, tables de maître, etc..	lot	12	2 520 000	30 240 000				
<i>EQUIPEMENTS SCOLAIRES</i>				30 240 000				
<i>SUPERVISION DES OPERATIONS</i>				2 160 000				
Carburant, frais de missions, entretien motos, fournitures, etc..	Ecole	12	180 000	2 160 000				
								125 664 000

入手先：教育プロジェクト室

[PDDEB]

PROVINCES/ACTIVITES	ESTIMATION BUDGETAIRE			Avance initiale 40% du coût total	Prise en charge par bailleur		
	Unité	Nbre	P.U		Montant	IDA	Pays Bas
5. DPEBA DU GANZOURGOU <i>CONSTRUCTIONS SCOLAIRES</i> 1.1. Construction d'Ecoles et latrines <i>EQUIPEMENTS SCOLAIRES</i> 1.2. Tables bancs, chaises, tables de maître, etc.. <i>SUPERVISION DES OPERATIONS</i> Carburant, frais de missions, entretien motos, fournitures, etc..	Ecole lot Ecole	7 7 7	23 480 000 2 520 000 180 000	183 260 000 164 360 000 164 360 000 17 640 000 17 640 000 1 260 000 1 260 000	73 304 000	73 304 000	
6. DPEBA DU GOURMA <i>CONSTRUCTIONS SCOLAIRES</i> 1.1. Construction d'Ecoles et latrines <i>EQUIPEMENTS SCOLAIRES</i> 1.2. Tables bancs, chaises, tables de maître, etc.. <i>SUPERVISION DES OPERATIONS</i> Carburant, frais de missions, entretien motos, fournitures, etc..	Ecole lot Ecole	5 3 3	23 480 000 2 520 000 180 000	785 400 000 704 000 000 704 400 000 7 560 000 7 560 000 5 200 000 5 400 000	311 416 000	311 416 000	
7. DPEBA DU IOBA <i>CONSTRUCTIONS SCOLAIRES</i> 1.1. Construction d'Ecoles et latrines <i>EQUIPEMENTS SCOLAIRES</i> 1.2. Tables bancs, chaises, tables de maître, etc.. <i>SUPERVISION DES OPERATIONS</i> Carburant, frais de missions, entretien motos, fournitures, etc..	Ecole lot Ecole	9 9 9	23 480 000 2 520 000 180 000	235 620 000 211 320 000 211 320 000 22 680 000 22 680 000 1 620 000 1 620 000	94 248 000	94 248 000	
8. DPEBA DE LA LERABA <i>CONSTRUCTIONS SCOLAIRES</i> 1.1. Construction d'Ecoles et latrines <i>EQUIPEMENTS SCOLAIRES</i> 1.2. Tables bancs, chaises, tables de maître, etc.. <i>SUPERVISION DES OPERATIONS</i> Carburant, frais de missions, entretien motos, fournitures, etc..	Ecole lot Ecole	4 4 4	23 480 000 2 520 000 180 000	104 720 000 93 920 000 93 920 000 10 080 000 10 080 000 720 000 720 000	41 888 000	41 888 000	

[PDDEB]

PROVINCES/ACTIVITES	ESTIMATION BUDGETAIRE			Prise en charge par bailleur				
	Unité	Nbre	P.U	Montant	Avance initiale 40% du coût total	IDA	Pays Bas	ACDI
9 .DPEBA DU LORUM				<u>157 080 000</u>	<u>62 832 000</u>	<u>62 832 000</u>		
<i>CONSTRUCTIONS SCOLAIRES</i>								
1.1. Construction d'Ecoles et latrines	Ecole	6	23 480 000	<u>140 880 000</u>				
<i>EQUIPEMENTS SCOLAIRES</i>								
1.2. Tables bancs, chaises, tables de maitre, etc..	lot	6	2 520 000	<u>15 120 000</u>				
<i>SUPERVISION DES OPERATIONS</i>								
Carburant ,frais de missions ,entretien motos,fournitures,etc..	Ecole	6	180 000	<u>1 080 000</u>				
10 .DPEBA DU NAMENTENGA				<u>130 900 000</u>	<u>52 360 000</u>	<u>52 360 000</u>		
<i>CONSTRUCTIONS SCOLAIRES</i>								
1.1. Construction d'Ecoles et latrines	Ecole	5	23 480 000	<u>117 400 000</u>				
<i>EQUIPEMENTS SCOLAIRES</i>								
1.2. Tables bancs, chaises, tables de maitre, etc..	lot	5	2 520 000	<u>12 600 000</u>				
<i>SUPERVISION DES OPERATIONS</i>								
Carburant ,frais de missions ,entretien motos,fournitures,etc..	Ecole	5	180 000	<u>900 000</u>				
11 .DPEBA DE L'OU DALAN				<u>26 180 000</u>	<u>10 472 000</u>	<u>10 472 000</u>		
<i>CONSTRUCTIONS SCOLAIRES</i>								
1.1. Construction d'Ecoles et latrines	Ecole	1	23 480 000	<u>23 480 000</u>				
<i>EQUIPEMENTS SCOLAIRES</i>								
1.2. Tables bancs, chaises, tables de maitre, etc..	lot	1	2 520 000	<u>2 520 000</u>				
<i>SUPERVISION DES OPERATIONS</i>								
Carburant ,frais de missions ,entretien motos,fournitures,etc..	Ecole	1	180 000	<u>180 000</u>				
12 .DPEBA DU PONI				<u>183 260 000</u>	<u>73 304 000</u>	<u>73 304 000</u>		
<i>CONSTRUCTIONS SCOLAIRES</i>								
1.1. Construction d'Ecoles et latrines	Ecole	7	23 480 000	<u>164 360 000</u>				
<i>EQUIPEMENTS SCOLAIRES</i>								
1.2. Tables bancs, chaises, tables de maitre, etc..	lot	7	2 520 000	<u>17 640 000</u>				
<i>SUPERVISION DES OPERATIONS</i>								
Carburant ,frais de missions ,entretien motos,fournitures,etc..	Ecole	7	180 000	<u>1 260 000</u>				

[PDDEB]

PROVINCES/ACTIVITES	ESTIMATION BUDGETAIRE			Prise en charge par bailleur				
	Unité	Nbre	P.U	Montant	Avance initiale 40% du coût total	IDA	Pays Bas	ACDI
13 .DPEBA DU SANMATENGA				352 700 000	157 080 000	157 080 000		
<i>CONSTRUCTIONS SCOLAIRES</i>				<i>352 200 000</i>				
1.1. Construction d'Ecoles et latrines	Ecole	15	23 480 000	352 200 000				
<i>EQUIPEMENTS SCOLAIRES</i>				<i>37 800 000</i>				
1.2. Tables bancs, chaises, tables de maître, etc..	lot	15	2 520 000	37 800 000				
<i>SUPERVISION DES OPERATIONS</i>				<i>2 700 000</i>				
Carburant , frais de missions , entretien motos, fournitures, etc..	Ecole	15	180 000	2 700 000				
14 .DPEBA DE LA SISSILI				287 980 000	115 192 000		115 192 000	
<i>CONSTRUCTIONS SCOLAIRES</i>				<i>258 280 000</i>				
1.1. Construction d'Ecoles et latrines	Ecole	11	23 480 000	258 280 000				
<i>EQUIPEMENTS SCOLAIRES</i>				<i>27 720 000</i>				
1.2. Tables bancs, chaises, tables de maître, etc..	lot	11	2 520 000	27 720 000				
<i>SUPERVISION DES OPERATIONS</i>				<i>1 980 000</i>				
Carburant , frais de missions , entretien motos, fournitures, etc..	Ecole	11	180 000	1 980 000				
15 .DPEBA DU SOUM				157 080 000	62 832 000		62 832 000	
<i>CONSTRUCTIONS SCOLAIRES</i>				<i>140 880 000</i>				
1.1. Construction d'Ecoles et latrines	Ecole	6	23 480 000	140 880 000				
<i>EQUIPEMENTS SCOLAIRES</i>				<i>15 120 000</i>				
1.2. Tables bancs, chaises, tables de maître, etc..	lot	6	2 520 000	15 120 000				
<i>SUPERVISION DES OPERATIONS</i>				<i>1 080 000</i>				
Carburant , frais de missions , entretien motos, fournitures, etc..	Ecole	6	180 000	1 080 000				
16 .DPEBA DU SOUROU				183 260 000	73 304 000	73 304 000		
<i>CONSTRUCTIONS SCOLAIRES</i>				<i>164 360 000</i>				
1.1. Construction d'Ecoles et latrines	Ecole	7	23 480 000	164 360 000	147 924 000			
<i>EQUIPEMENTS SCOLAIRES</i>				<i>17 640 000</i>				
1.2. Tables bancs, chaises, tables de maître, etc..	lot	7	2 520 000	17 640 000				
<i>SUPERVISION DES OPERATIONS</i>				<i>1 260 000</i>				
Carburant , frais de missions , entretien motos, fournitures, etc..	Ecole	7	180 000	1 260 000				

[PDDEB]

PROVINCES/ACTIVITES	ESTIMATION BUDGETAIRE			Prise en charge par bailleur		ACDI	
	Unité	Nbre	P.U	Montant	Avance initiale 40% du coût total		IDA
17 .DPEBA DU YAGHA				52 360 000	20 944 000		20 944 000
CONSTRUCTIONS SCOLAIRES				46 960 000			
1.1. Construction d'Ecoles et latrines	Ecole	2	23 480 000	46 960 000			
EQUIPEMENTS SCOLAIRES				5 040 000			
1.2. Tables bancs, chaises, tables de maître, etc..	lot	2	2 520 000	5 040 000			
SUPERVISION DES OPERATIONS				360 000			
Carburant ,frais de missions ,entretien motos,fournitures,etc..	Ecole	2	180 000	360 000			
18 .DPEBA DU ZIRO				157 080 000	62 832 000		62 832 000
CONSTRUCTIONS SCOLAIRES				140 880 000			
1.1. Construction d'Ecoles et latrines	Ecole	6	23 480 000	140 880 000			
EQUIPEMENTS SCOLAIRES				15 120 000			
1.2. Tables bancs, chaises, tables de maître, etc..	lot	6	2 520 000	15 120 000			
SUPERVISION DES OPERATIONS				1 080 000			
Carburant ,frais de missions ,entretien motos,fournitures,etc..	Ecole	6	180 000	1 080 000			
19.DPEBA DU ZONDOMA				209 440 000	83 776 000		83 776 000
CONSTRUCTIONS SCOLAIRES				187 840 000			
1.1. Construction d'Ecoles et latrines	Ecole	8	23 480 000	187 840 000			
EQUIPEMENTS SCOLAIRES				20 160 000			
1.2. Tables bancs, chaises, tables de maître, etc..	lot	8	2 520 000	20 160 000			
SUPERVISION DES OPERATIONS				1 440 000			
Carburant ,frais de missions ,entretien motos,fournitures,etc..	Ecole	8	180 000	1 440 000			
TOTAL GENERAL 19 PROVINCES CONCERNÉES				3 377 220 000	1 350 888 000		303 688 000
CONSTRUCTIONS SCOLAIRES	Ecole	129	26 180 000	3 377 220 000	1 350 888 000	921 536 000	125 664 000
EQUIPEMENTS SCOLAIRES	Lot	129	23 480 000	3 028 920 000	1 332 724 800		
SUPERVISION DES OPERATIONS	Ecole	129	180 000	23 220 000	130 032 000		
					9 288 000		

[HIPC] COUT UNITAIRE

	Nombre de complexes		Nombre de logements		Nombre de forages		Montant des engagements				Observations
	complexes	logements	logements	forages	complexes	logement	forage	forage	forage		
1 ^{ere} tranche 1 期	68	94	85		2 556 948 680	577 297 097	505 805 995				
2 ^{eme} tranche 2 期	17	34			641 612 686	183 949 382					
Reprise de lots infructueux やり直し工事	0	5				38 768 289					
2 ^{eme} tranche- suite 2 期の継続	16	22	16		582 005 096	124 187 915	89 930 000				
TOTAL travaux	101	155	101		3 780 566 462	924 202 683	595 735 995				
Cout unitaire (RCFA /ITC)					37 431 351	5 962 598	5 898 376				

入手先：Faso Baara

[AfD 第1次]

	DETAIL PROJET	MARCHES ENGAGÉS	RESTE A ENGAGER	DEBLOCAGES	RESTE A PAYER	% DEBLOC/ENG
TRANSCHE A TRAVAUX	2 971 261 477 2 084 407 613	2 578 133 299 2 084 407 613	393 128 178 0	2 183 745 550 1 828 258 839	292 687 585 255 688 616	84,70% 87,71%
BANWA		555 837 166		443 722 050	112 115 116	79,83%
LOT 1 ENTREPRISE KGB		93 939 952		85 223 049	8 716 903	90,72%
LOT 2 EBOMAF		95 920 580		70 142 025	25 778 555	73,13%
LOT 3 EBOMAF		124 609 589		82 535 798	42 073 791	66,24%
LOT 4 EPSWT		82 925 208		78 475 956	4 449 252	94,63%
LOT 5 EPSWT		76 631 136		64 119 072	12 512 064	83,67%
LOT 6 EDBAF		81 810 701		63 226 150	18 584 551	77,28%
KOSSI 1		443 336 395		382 124 660	61 211 735	
LOT 1 ECW		147 733 168		136 407 216	11 325 952	92,33%
LOT 2 TRAORE LAMINE		57 181 833		54 069 583	3 112 250	94,56%
LOT 5 AFRIQUE GRUE		61 333 979		48 817 943	12 516 036	79,59%
LOT 7 EBU		71 468 850		56 507 461	14 961 389	79,07%
ECOBAA (suite TRAORE LAMINE)		105 618 565		86 322 457	19 296 108	81,73%
KOSSI 2		411 769 182		380 983 087	30 786 095	
LOT 3 ECOBAA		115 807 995		109 897 595	5 910 400	94,90%
LOT 4 ECW		108 543 777		100 161 858	8 381 919	92,28%
LOT 6 SOGEBP		111 822 557		110 584 332	1 238 225	98,89%
LOT 8 AFRIQUE GRUE		75 594 853		60 339 302	15 255 551	79,82%
ZIRO		612 992 400		561 598 288	51 394 112	
LOT 1 EGRF		150 017 836		127 629 520	22 388 316	85,08%
LOT 2 A. CONSTRUC		146 442 908		134 185 874	12 257 034	91,63%
LOT 3 ECMAF		47 200 611		47 200 611	0	100,00%
LOT 4 ETICAP		79 056 167		72 894 080	6 162 087	92,21%
LOT 5 BUR. OUVRAGE		166 724 611		157 762 904	8 961 707	94,62%
LOT 3 ETICAP (suite ECMAF)		23 550 267		21 925 299	1 624 968	93,10%
FERMES METALLIQUES FADOU		60 472 470		59 867 745	604 725	
Lot 1 BANWA		17 114 850		16 943 701	171 149	99,00%
Lot 2 KOSSI		25 101 780		24 850 762	251 018	99,00%
Lot 3 ZIRO		18 255 840		18 073 282	182 558	99,00%
MOBILIER & MAT. DIDACTIQUE		345 333 382	83 072 699	160 632 686	0	
Lot 1 BANWA ETSMF		49 567 500		46 147 342	3 420 158	93,10%
Lot 2 KOSSI VMAP		70 576 000		65 706 256	4 869 744	93,10%
Lot 3 ZIRO ETSMF		52 448 000		48 829 088	3 618 912	93,10%
GTI Biomedical		89 369 183		0	89 369 183	0,00%
RESTATIONS INTELLECTUELLE		231 195 083	123 763 691	194 767 034	36 997 969	
FASO BAARA TRANSCHE A		134 251 575		113 084 886	21 166 689	84,23%
ARDI		20 100 000		16 570 440	3 529 560	82,44%
CETIS		19 420 000		17 283 800	2 136 200	89,00%
CINCAT		36 662 628		29 696 728	6 965 900	81,00%
ENGI CODES		21 330 800		18 131 180	3 199 620	85,00%
DIVERS IMPREVU		0	186 291 788	0	0	
TRANSCHE B	2 314 156 153	2 005 699 372	308 456 781	10 253 034	1 821 061 797	0
TOTAL CFA	5 285 417 630	4 583 832 671	701 584 959	2 193 998 584	2 113 749 382	47,86%
TOTAL €	8 057 567	6 988 008	1 069 559	3 344 729	3 222 390	

入手先：AfD

PROJET DE CONSTRUCTION DE 53 COMPLEXES DU PAOEB
DANS LES PROVINCES DES BANWAS, DE LA KOSSIE ET DU ZIRO

[AFD 第1次]

Maîtres d'œuvre	N° ordre	Lots	Désignation / composition	Entreprise attributaire	Responsable	Adresse	Montant HT-HD	Taxes	Montant TTC	Date démarrage	Délai (mois)
CINCAT	T0-BCN-0607-01-01/01	1	Construction de 03 complexes scolaires dans la province des Banwa : Tansila, Moara, Nangouna.	KCB	LABORE Ghamba	01 BP 4995 Ouaga 01 Tél. : 36-50-30	93 939 952	24 993 272	118 933 224	15-janv-02	6
	T0-BCN-0607-01-02/01	2	Construction de 03 complexes scolaires dans la province des Banwa : Molié-Kotou, Kouka, Sairé	EBOMAF	BONKOUNGOU Mahamadou	10 BP 13395 Ouaga 10 Tél. : 37-23-83	95 920 580	23 073 906	118 994 486	15-janv-02	6
	T0-BCN-0607-01-03/01	3	Construction de 03 complexes scolaires dans la province des Banwa : Gama, Darsalam, Déré	EBOMAF	BONKOUNGOU Mahamadou	10 BP 13395 Ouaga 10 Tél. : 37-23-83	124 609 589	29 906 322	154 515 911	15-janv-02	6
	T0-BCN-0607-01-04/01	4	Construction de 02 complexes scolaires dans la province des Banwa : Bana, Lanfiera	EPSWT	PARKOUDA S. W. Théodore	BP 1922 Ouagadougou Tél. : 38-22-28	81 925 208	23 905 712	106 830 920	15-janv-02	6
	T0-BCN-0607-01-05/01	5	Construction de 02 complexes scolaires dans la province des Banwa : Darsalamy, Monttonkuy	EPSWT	PARKOUDA S. W. Théodore	BP 1922 Ouagadougou Tél. : 38-22-28	76 631 136	21 681 533	98 312 669	15-janv-02	6
	T0-BCN-0607-01-06/01	6	Construction de 02 complexes scolaires dans la province des Banwa : Sorowa, Bérenkuy	EDBAF	DRABO Bakary	BP 04 Dédougou Tél. : 52-0070	81 810 701	24 202 478	106 013 179	15-janv-02	6
ARDI	T0-BCN-0607-02-01/01	1	Construction de 04 complexes scolaires dans la province de la Kossi : Késsékuy, Damahoun, Koulérou, Babakuy	ECW	NANA L. Souleymane	BP 170 Koudougou Tél. : 44-06-16	147 733 168	40 203 093	187 936 261	15-janv-02	6
	T0-BCN-0607-02-02/01	2	Construction de 04 complexes scolaires dans la province de la Kossi : Boulgamporo, Wéréssé, Kinséré, Jyérébéré	ETS TRAORE LAMINE	TRAORE LAMINE	01 BP 6291 Ouaga 01 Tél. : 31-22-41	132 908 057	43 817 438	176 725 495	15-janv-02	6
	T0-BCN-0607-02-03/01	5	Construction de 02 complexes scolaires dans la province de la Kossi : Kalé, Kourji	AFRIQUE GRUE	BANHORO Noufou	01 BP 5144 Ouaga 01 Tél. : 35-09-42	61 333 979	17 500 952	78 834 931	15-janv-02	6
	T0-BCN-0607-02-07/01	7	Construction de 02 complexes scolaires dans la province de la Kossi : Simbadougou, Séré	EBJ	BONANE Jacob	BP 88 Nouna Tél. : 53-70-74	71 468 850	27 703 767	99 172 617	15-janv-02	6
CETIS	T0-BCN-0607-02-03/01	3	Construction de 03 complexes scolaires dans la province de la Kossi : Dassi, Kémenso, Sobon	ECOBAA	ZANGO Laurent	01 BP 4275 Ouaga 01 Tél. 34-31-47	115 807 995	36 880 775	152 688 770	15-janv-02	6
	T0-BCN-0607-02-04/01	4	Construction de 01 complexes scolaires dans la province de la Kossi : Piga, Saba, Naérna	ECW	NANA Souleymane	BP 170 Koudougou Tél. : 44-06-16	108 543 777	29 839 259	138 383 036	15-janv-02	6
	T0-BCN-0607-02-06/01	6	Construction de 02 complexes scolaires dans la province de la Kossi : Nérékoy, Kanadougou	SOCEBP	OUEDRAOGO Hamidou	06 BP 9254 Ouaga 06 Tél. 31-50-04	111 822 557	31 240 435	144 062 992	15-janv-02	6
	T0-BCN-0607-02-08/01	8	Construction de 02 complexes scolaires dans la province de la Kossi : Sanakadougou, Mangadian	AFRIQUE CRUE	BANHORO Noufou	01 BP 5144 Ouaga 01 Tél. : 35-09-42	75 594 853	20 067 910	95 662 763	15-janv-02	6

入手先：AFD

[AfD 第1次]

Lots	Désignation / composition	Entreprise attributaire	Responsable	Adresse	Montant HT-HD	Taxes	Montant TTC	Date démarrage	Délai (mois)
1	Construction de 04 complexes scolaires dans la province du Ziro : Bolgo, Sinyé, Dana, Guéjén	EGSRF	SEMDE Rasmanté	BP 106 Koudougou Tél. : 44-00-41	150 017 836	38 319 160	188 336 996	15-janv-02	6
2	Construction de 04 complexes scolaires dans la province du Ziro : Tampouré, Zimloua, Lorou, Lao	AFRICA CONSTRUCTION	SORE Hassan I. Christitan	01 BP 3660 Ouaga 01 Tél. : 35-77-44	146 442 988	51 946 195	198 389 103	15-janv-02	6
3	Construction de 02 complexes scolaires dans la province du Ziro : Oupon, Bonapio	ECMAF	MINOUNGOU N. Abdoulaye	01 BP 1662 Ouaga 01 Tél. : 36-03-28	72 063 868	17 021 624	89 085 492	15-janv-02	6
4	Construction de 02 complexes scolaires dans la province du Ziro : Gallo, Balogo	ETICAP	OUEDRAOGO Bouréma	04 BP 8190 Ouaga 01 Tél. : 34-44-95	79 056 167	25 974 274	105 030 441	15-janv-02	6
5	Construction de 04 complexes scolaires dans la province du Ziro : Nélin, Bouyoua, Tiago, Dianzé	BURKINA OUVRAGE	OUEDRAOGO Robert	01 BP 400 Ouaga 01 Tél. : 43-10-58	166 724 611	43 690 747	210 415 358	15-janv-02	6

ENGI-CODES

Maitre d'Ouvrage : MEBA
Financement : Agence Française de Développement
Date de la soumission : 6 novembre 2001

入手先 : AfD

PROJET DE CONSTRUCTION DE 38 COMPLEXES DU PAOEB tranche B
DANS LES PROVINCES DES BANWAS, DE LA KOSSI ET DU ZIRO

[AfD 第2次]

Mailles d'œuvre	N° ordre	Lois	Désignation / composition	Entreprise attributaire	Responsable	Adresse	Montant HT-HD	Taxes	Montant TTC	Date démarrage
ENGI-CODES	T0-BCN-0627-01-01/02	A1	Construction de 03 complexes scolaires dans la province des Banwa : Mahuana, Toukoro, Biéna	EDBAF	DRABO Bakary	BP 04 Dédougou Tél. : 52-0070	128 877 672			9-juin-03
	T0-BCN-0627-01-02/02	A2	Construction de 02 complexes scolaires dans la province des Banwa : Maljout, Samba	ECOBAG	SAWADOGO P. Boukary	01 BP 884 Ouaga 01 Tél:32-25-15/31-35-72	105 481 844			9-juin-03
	T0-BCN-0627-01-03/02	A3	Construction de 02 complexes scolaires dans la province des Banwa : Moussakongo, Héré-dougou	EDBAF	DRABO Bakary	BP 04 Dédougou Tél. : 52-0070	66 923 166			9-juin-03
	T0-BCN-0607-01-04/02	A4	Construction de 02 complexes scolaires dans la province des Banwa : Toula, Driko	AL-KO	SALAMBERE Ahmed	01 BP 3806 Ouaga 01 Tél. : 31-46-26	84 712 442			9-juin-03
	T0-BCN-0627-01-05/02	A5	Construction de 02 complexes scolaires dans la province des Banwa : Kouyéni, Kellé	INFRACO	TAPSOBA Alfred	01 BP 5 883 Ouaga 01 Tél:31-59-48	101 796 003			9-juin-03
	T0-BCN-0627-01-06/02	A6	Construction de 02 complexes scolaires dans la province des Banwa : Kousséba, Ziga	SOGEBP	OUEDRAOGO Hamidou	06 BP 9254 Ouaga 06 Tél. 31-50-04	102 862 328			9-juin-03
	T0-BCN-0627-02-01/02	B1	Construction de 03 complexes scolaires dans la province de la Kossi : Ba, Kolonkan, Barapi	INFRACO	TAPSOBA Alfred	01 BP 5 883 Ouaga 01 Tél:31-59-48	117 607 797			9-juin-03
	T0-BCN-0627-02-02/02	B2	Construction de 02 complexes scolaires dans la province de la Kossi : Tiéngkuy, Madouba	INFRACO	TAPSOBA Alfred	01 BP 5 883 Ouaga 01 Tél:31-59-48	100 792 279			9-juin-03
	T0-BCN-0627-02-05/02	B3	Construction de 02 complexes scolaires dans la province de la Kossi : Bourgaso, Sorp-	EJS	SOMDAH Jeanne	07 BP 047 Ouaga 07 Tél: 20-43-33	50 506 503			9-juin-03
	ARDI									

入手先 : AfD

[AfD 第2次]

Maîtres d'œuvre	N° ordre	Lots	Désignation / composition	Entreprise attributaire	Responsable	Adresse	Montant HT-IB	Taxes	Montant TTC	Date démarrage	Délai (mois)
CETIS	T0-BCN-0627-03-01/02	C1	Construction de 02 complexes scolaires dans la province du Ziro : Nékrou, Tiaré	SART DECOR	COMPAORE Denis	01 BP 6 374 Ouaga 01 Tel : 31-39-02	87 318 549			9-juin-03	6
	T0-BCN-0627-03-02/02	C2	Construction de 02 complexes scolaires dans la province du Ziro : Nadoonon, Poun	BURKINA OUVRAGES	OUEDRAOGO Robert	01 BP 400 Ouaga 01 Tel : 43-10-58	93 589 629			9-juin-03	6
	T0-BCN-0627-03-03/02	C3	Construction de 02 complexes scolaires dans la province du Ziro : Kada, Lalian	BURKINA OUVRAGES	OUEDRAOGO Robert	01 BP 400 Ouaga 01 Tel : 43-10-58	86 487 666			9-juin-03	6
	T0-BCN-0627-03-04/02	C4	Construction de 02 complexes scolaires dans la province du Ziro : Kasso, Diallo	ETB	KABORE Paul Charles	01 BP 2 869 Ouaga 01 Tel : 31-04-85	64 514 607			9-juin-03	6
	T0-BCN-0627-03-05/02	C5	Construction de 02 complexes scolaires dans la province du Ziro : Tiabien, Kinkirsgogo	SART DECOR	COMPAORE Denis	01 BP 6 374 Ouaga 01 Tel : 31-39-02	130 977 824			9-juin-03	6
	T0-BCN-0627-03-06/02	C6	Construction de 02 complexes scolaires dans la province du Ziro : Moun-Nessirai, Tékrou	SART DECOR	COMPAORE Denis	01 BP 6 374 Ouaga 01 Tel : 31-39-02	93 631 904			9-juin-03	6
	T0-BCN-0627-03-07/02	C7	Construction de 03 complexes scolaires dans la province du Ziro : Biyéni, Boutié Déboré, Danthou	BURKINA OUVRAGES	OUEDRAOGO Robert	01 BP 400 Ouaga 01 Tel : 43-10-58	134 667 427			9-juin-03	6
	T0-BCN-0627-03-08/02	C8	Construction de 03 complexes scolaires dans la province du Ziro : Cassou B, Taré, Sia	EMC	COMPAORE Gilbert	01 BP 4 518 Ouaga 01 Tel : 37-02-25736-51-70	110 253 521			9-juin-03	6

1 661 001 161


Maître d'Ouvrage : MEBA
 Financement : Agence Française de Développement
 Date de la soumission : 25/02/2003 pour les lots A1 à C6 et 03/03/2003 pour les lots C7 et C8

調査実施県：LOROUM

2 学区 A : TITAO
B : BANH

△ : 調査校

No.	学校名
1	Colonga 校
2	Rimassa 校
3	Solobo 校
4	Guilan 校

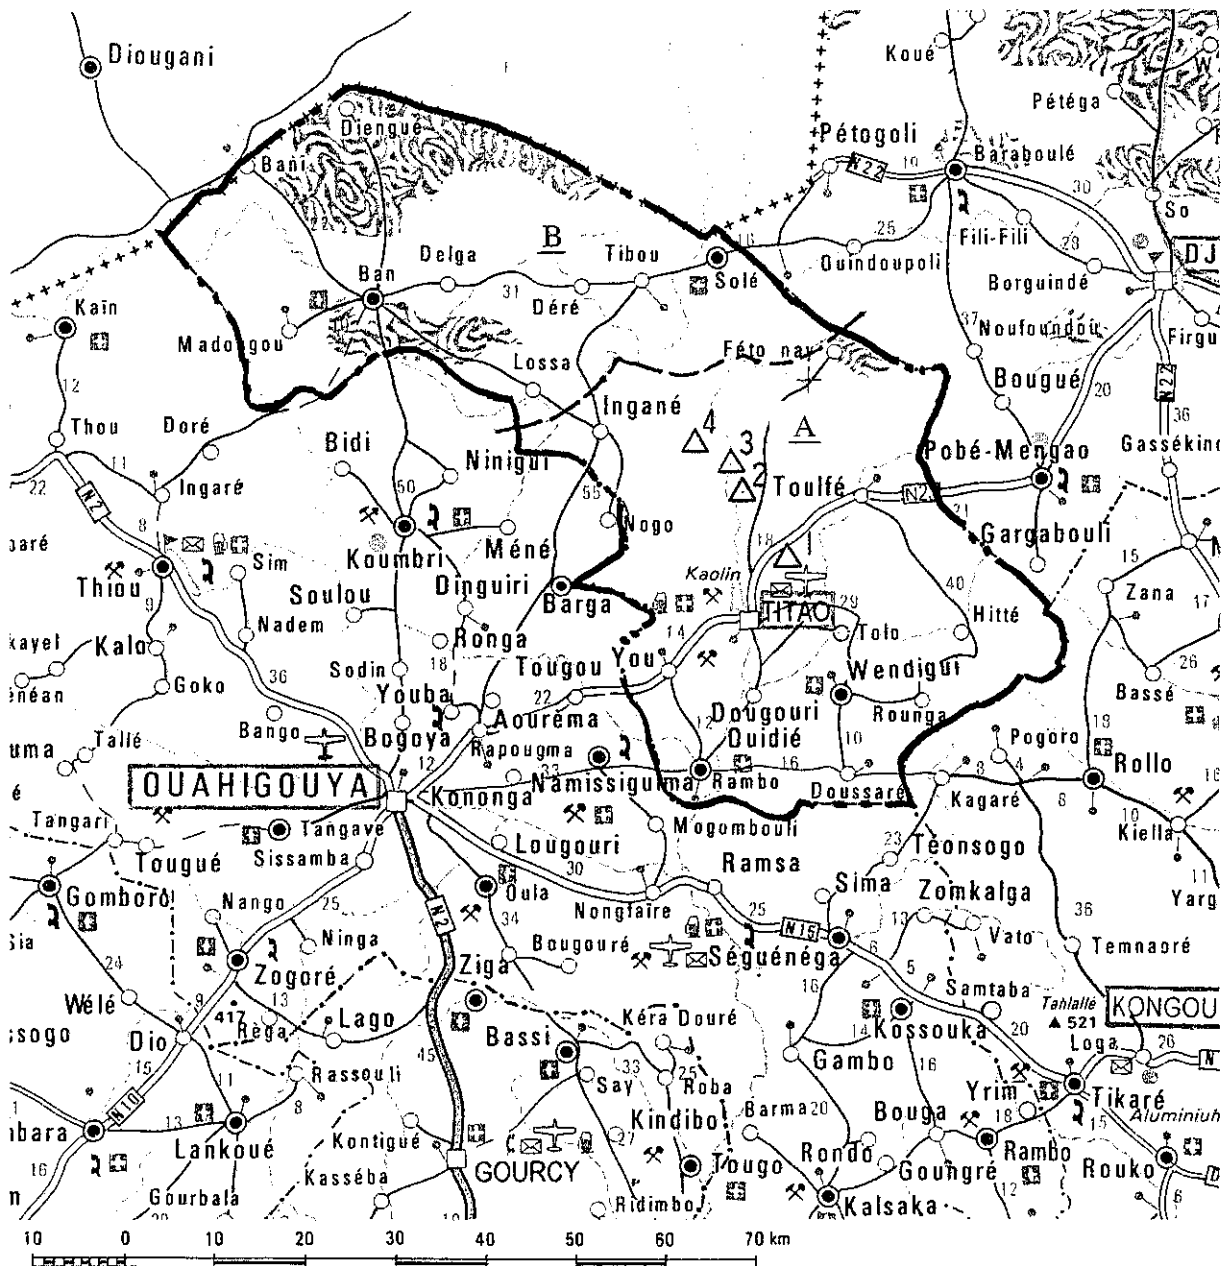

調査実施県：ZONDOMA

3 学区

A : GOURCY I

B : GOURCY II

C : BASSI

△ : 調査校

No.	学校名
1	Gourcy-C 校
2	Secteur-2 校
3	Zoongo 校
4	Rom 校
5	Secteur-3 校
6	Kibilo 校
7	Kindibo 校
8	Koudoumbo 校




調査実施県：PASSORE

5 学区 A : ARBOLLE
B : BOKIN
C : LA-TODIN
D : SAMBA
E : YAKO

△ : 調査校

No.	学校名
1	Kabo 校
2	Secteur-3 校
3	Minisia 校
4	Kingria 校
5	Kolbila 校

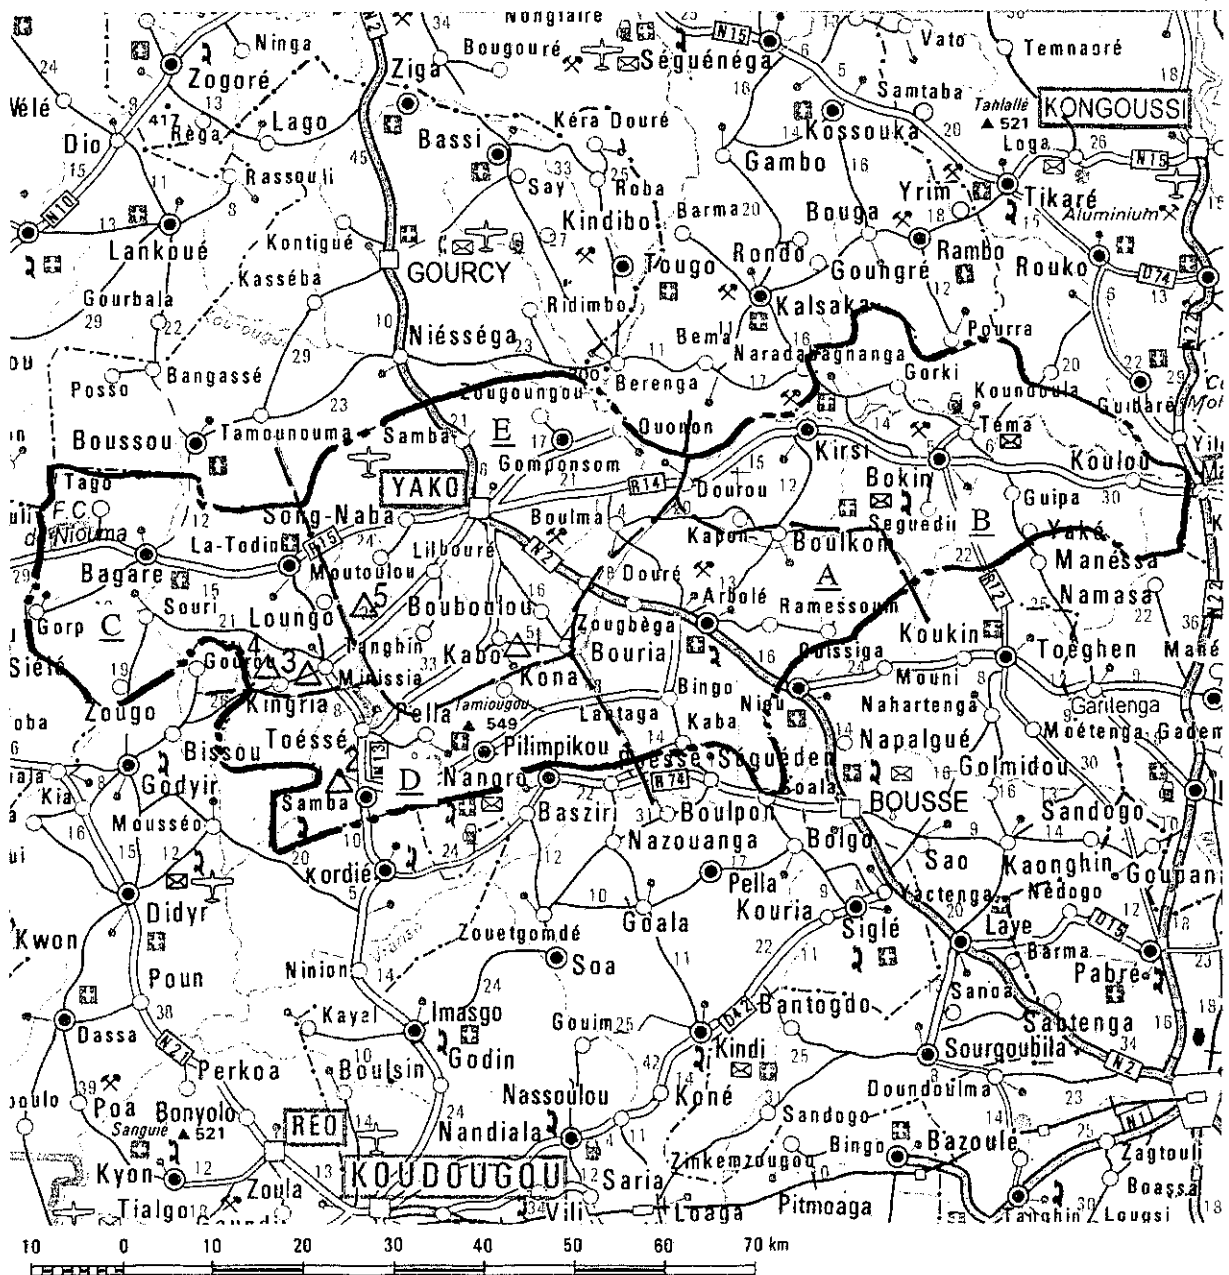

調査実施県：SANMATENGA



調査実施県：KOURWEGO

3 学区


A : BOUSSE

B : LAYE

C : SOURGOUBILA

△ : 調査校

No.	学校名
1	Secteur-3 校
2	Ritiguekoudogo 校
3	Tangseghin 校
4	Bousse-A 校

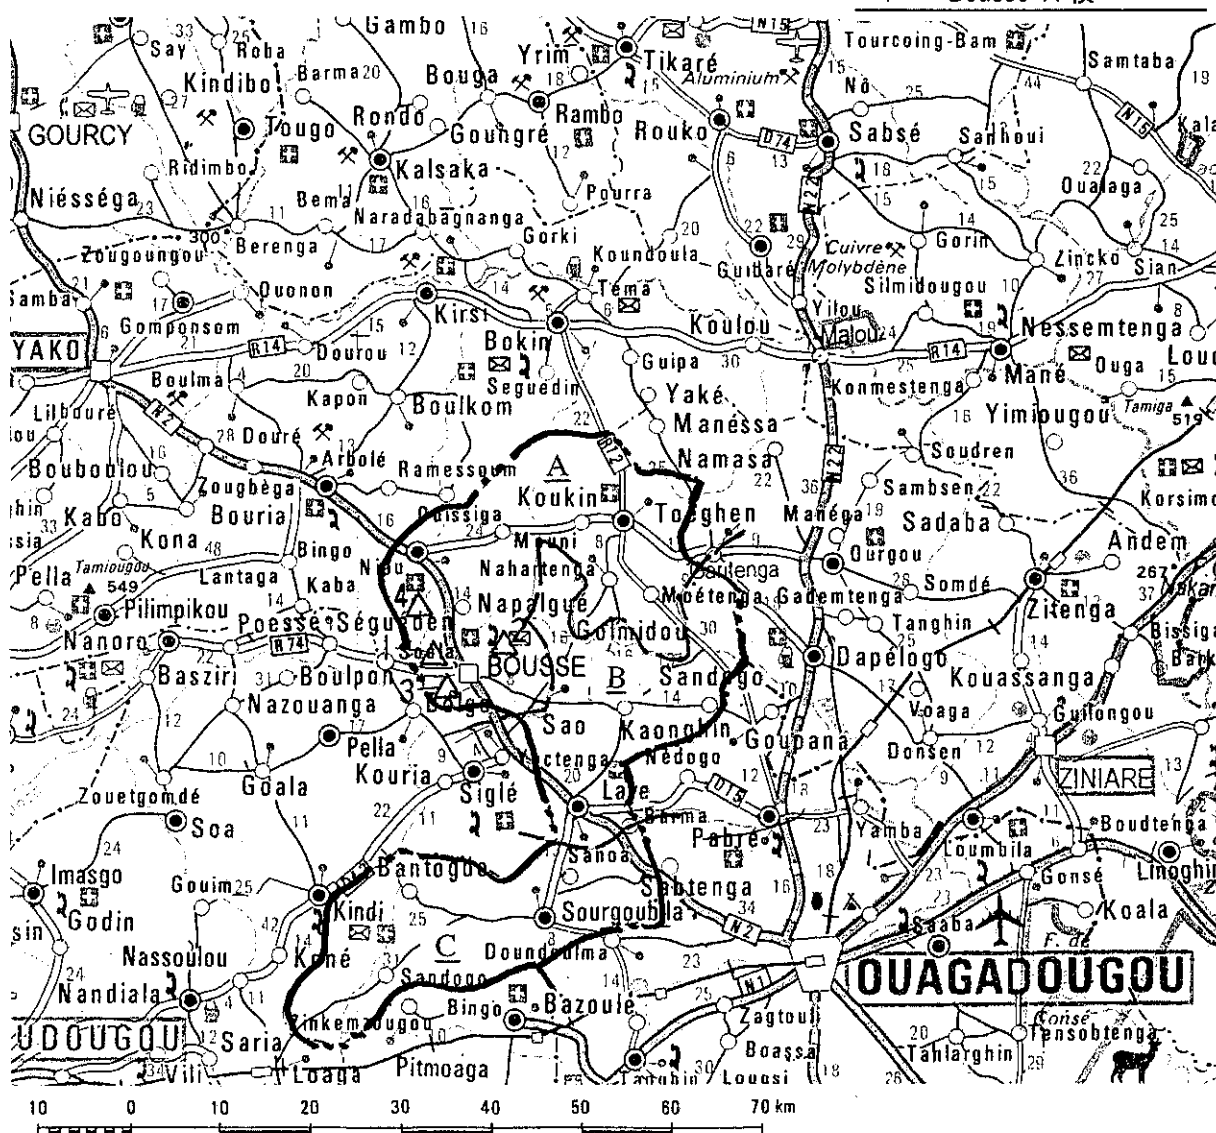


調査実施県：KENEDOUGOU

5 学区

- A : ORODARA
- B : MORALABA
- C : N'DOROLA
- D : SAMOROGUOUAN
- E : KOLOKO

△ : 調査校


No.	学校名
1	Kourignon-A 校
2	Sababounouma 校
3	Benkadi 校

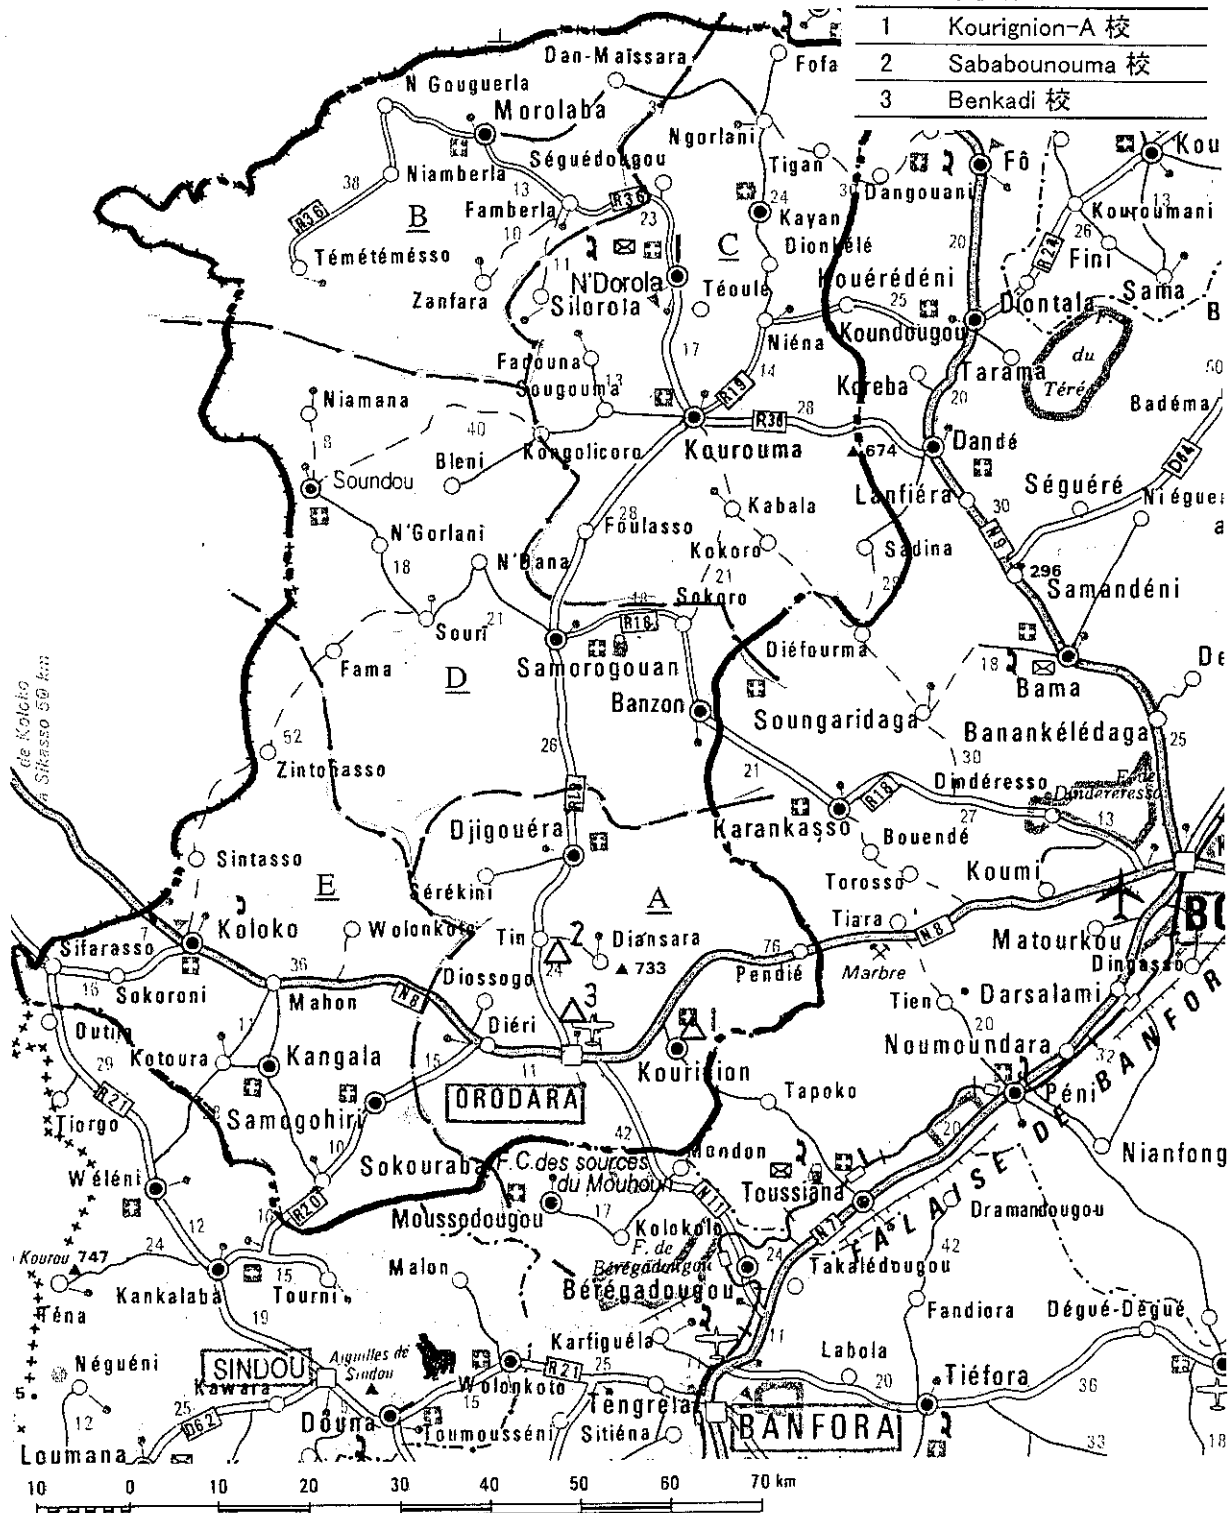


調査実施県：HOUET

6 学区 A : BAMA
 (BOBO市以外) B : BOBO IV
 C : BOBO V
 D : BOBO VII
 E : FO
 F : TOUSSIANA


BOBO市： BOBO I, II, III, VI

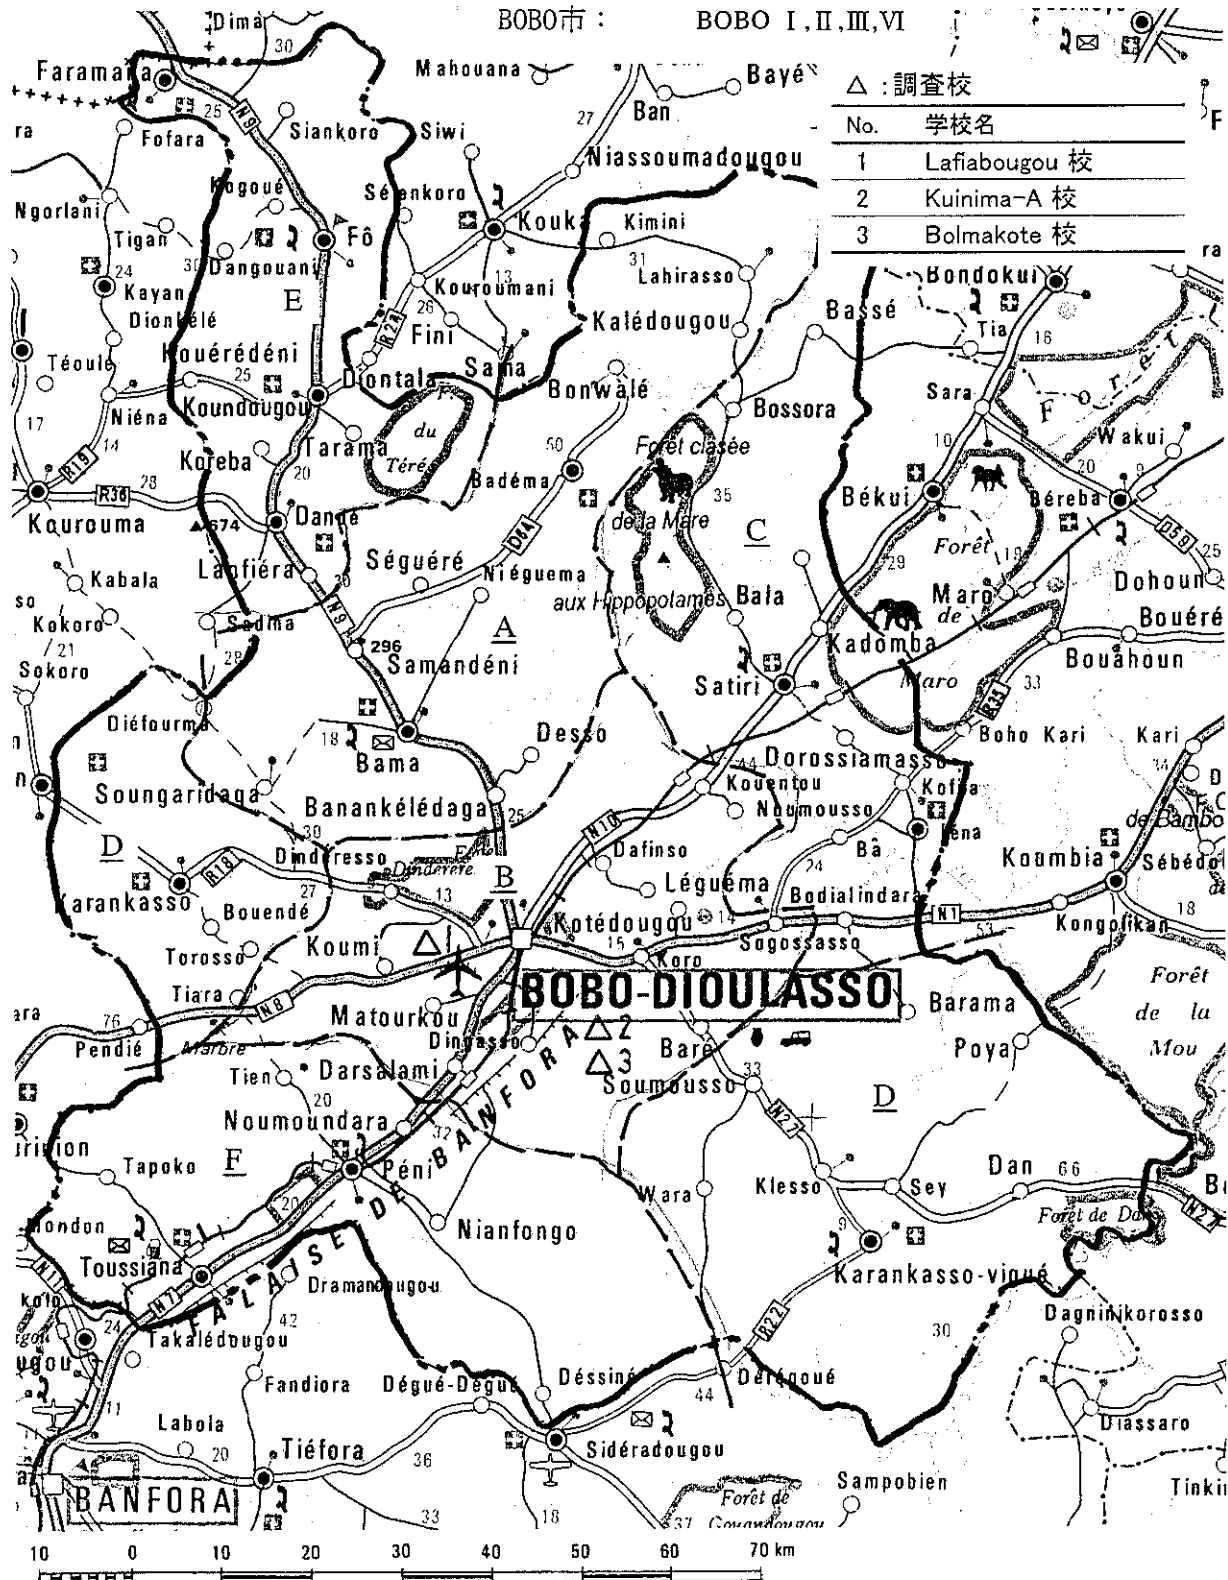

要請県：BAM

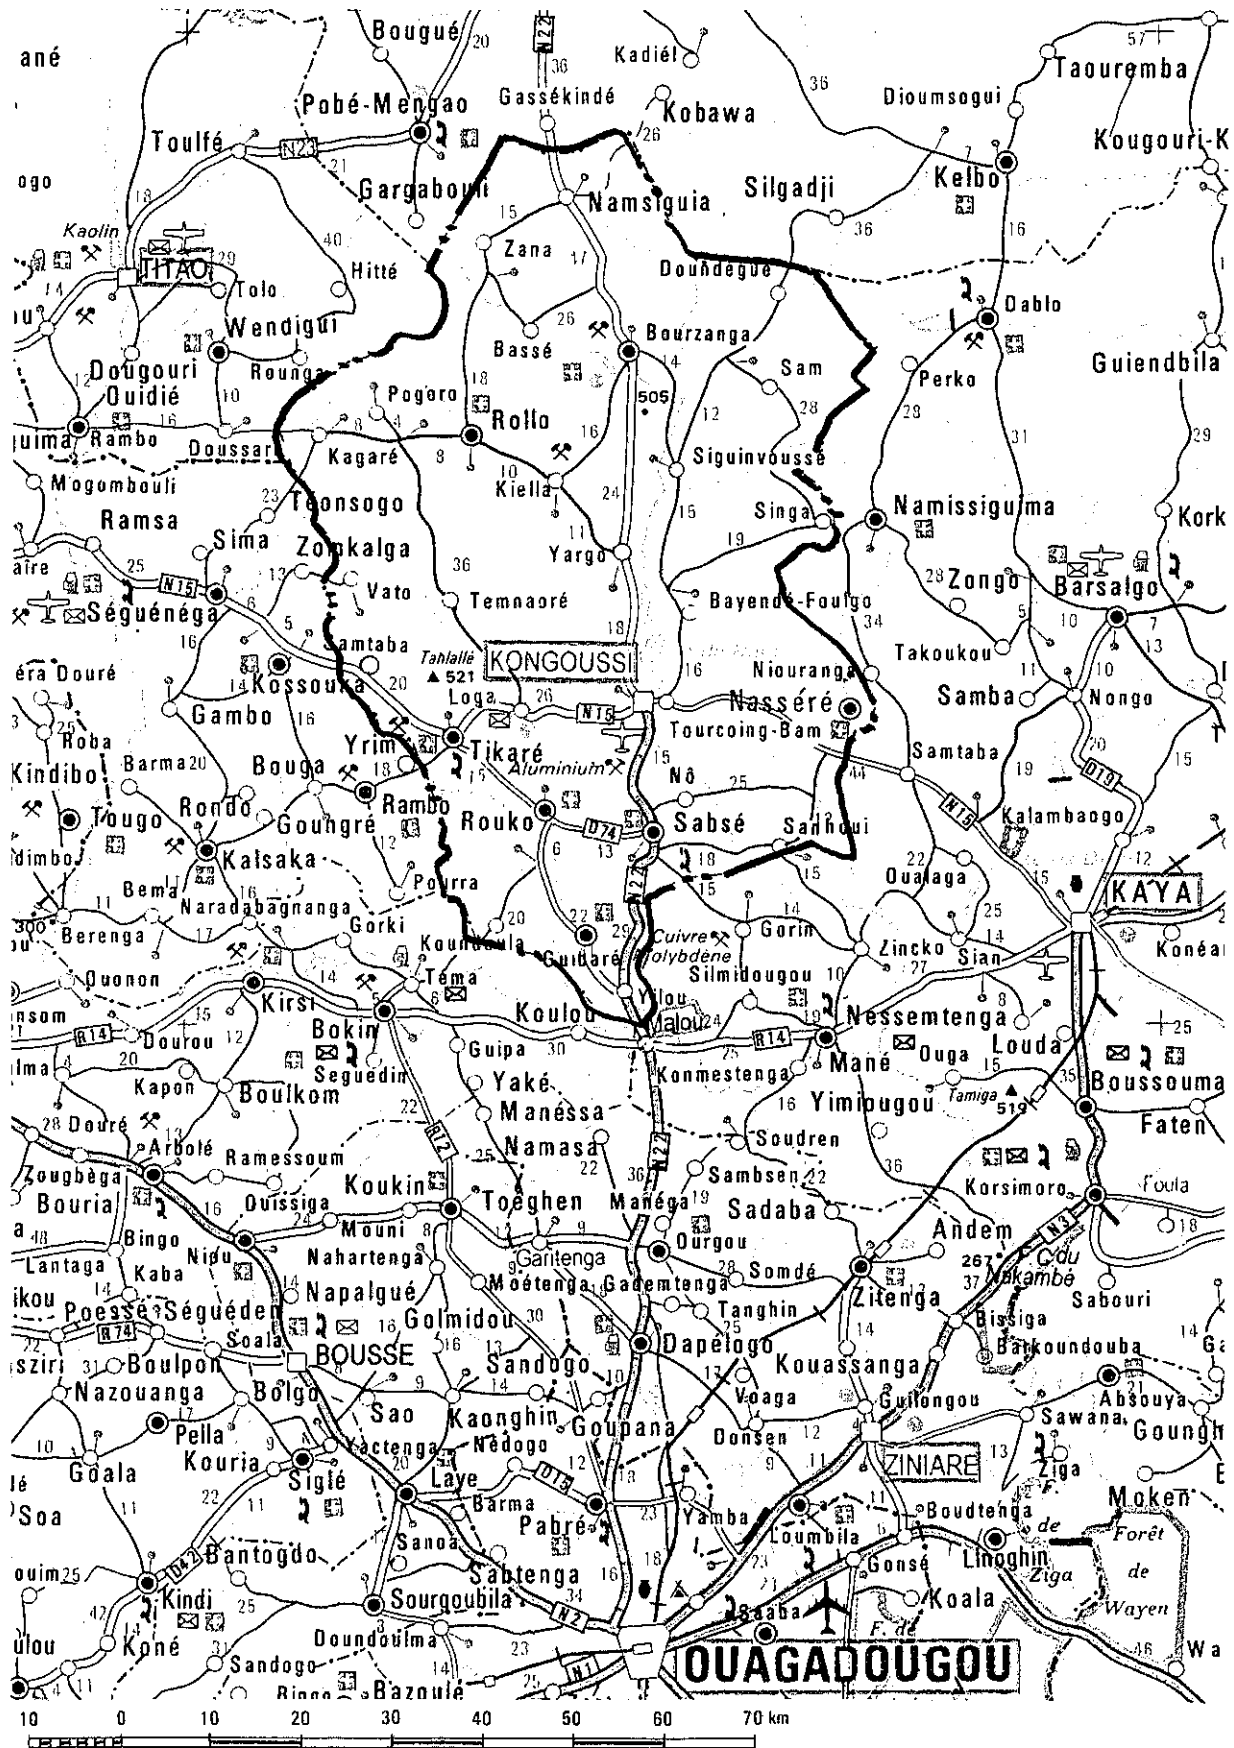

要請県：NAMENTENGA

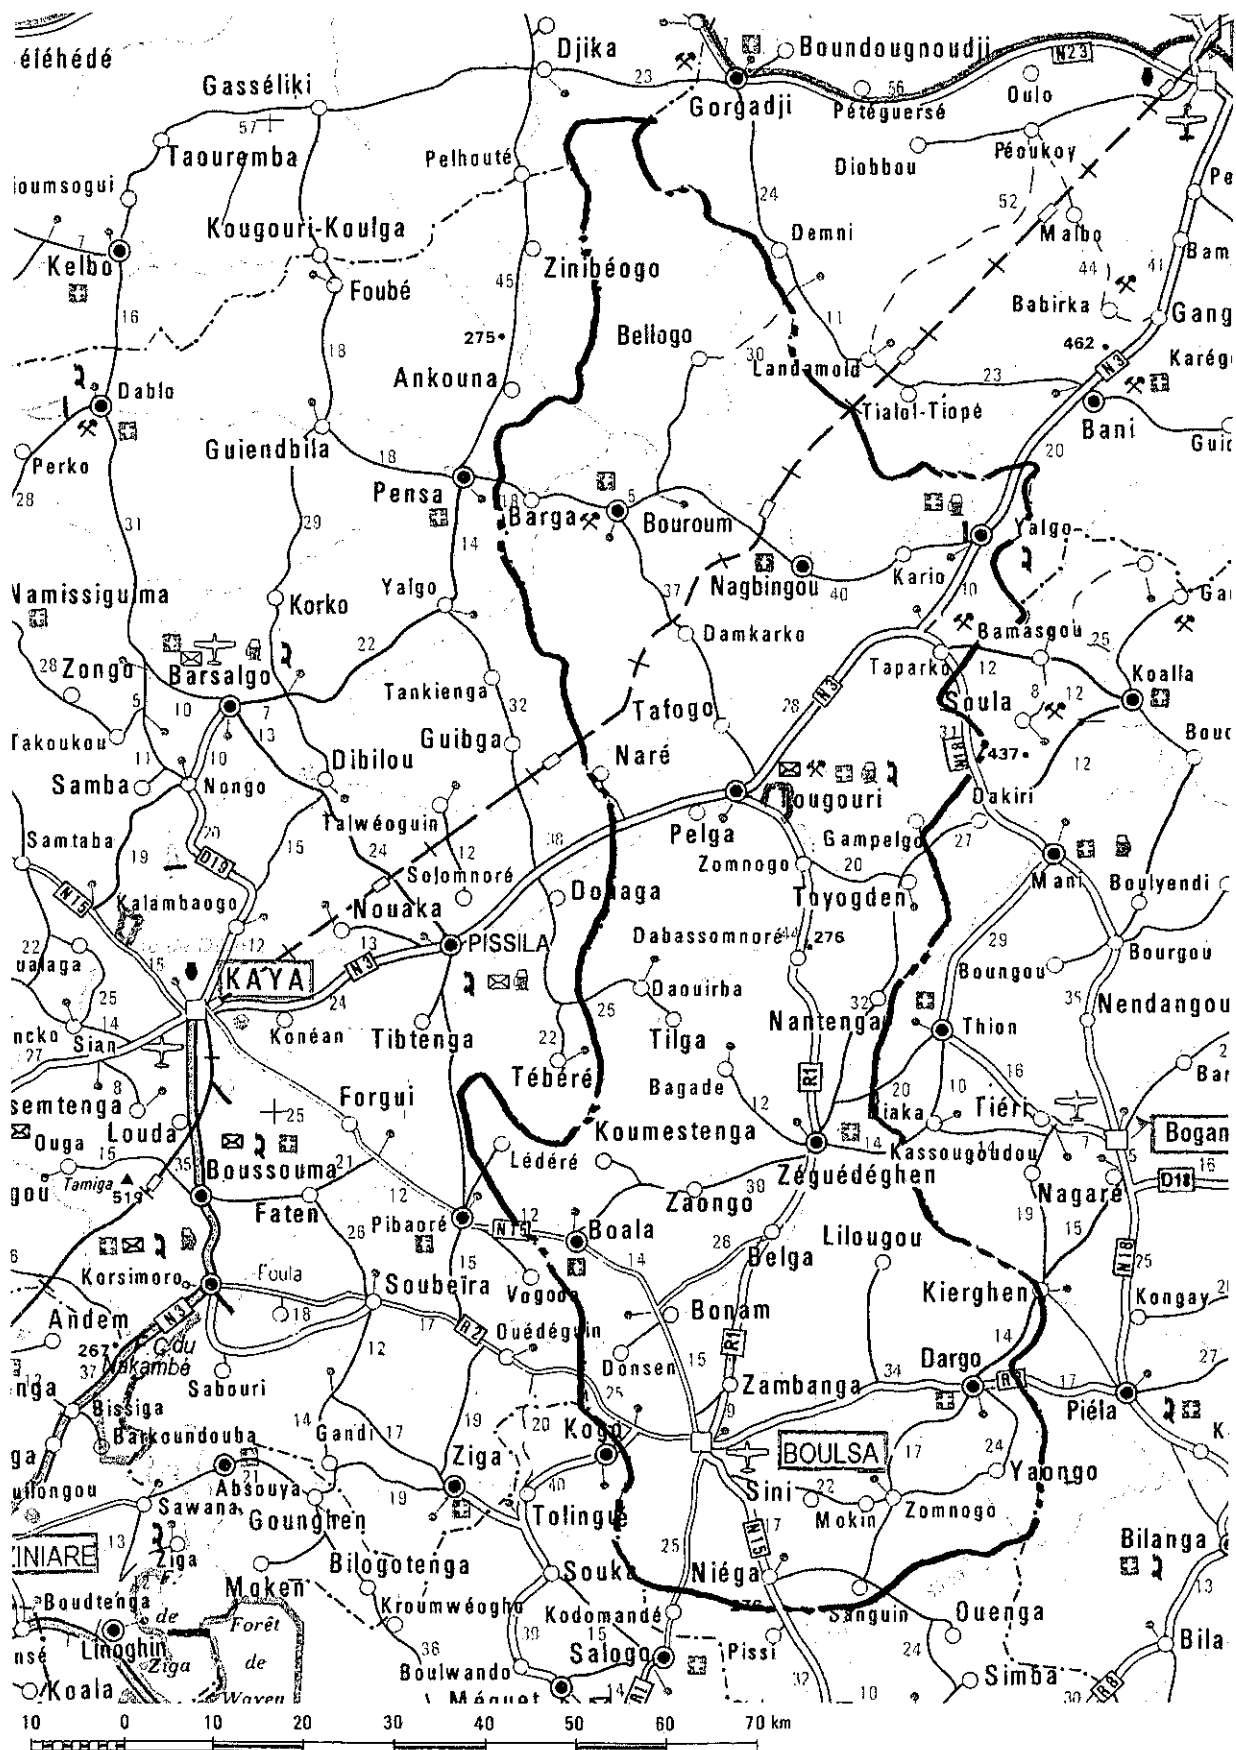

要請県：BOULKIEMDE

