

中華人民共和国
河北省飼料作物生産利用技術向上計画
終了時評価報告書

平成 12 年 1 月

国 際 協 力 事 業 団
農 業 開 発 協 力 部

序 文

中国河北省飼料作物生産利用技術向上計画は、平成 6 年 11 月 25 日に署名された討議議事録(R / D)に基づき、滄州市農林科学院の研究者および畜牧水産局の技術者の飼料作物生産利用技術の向上を図ること、ひいては中国における畜産業の発展に寄与することを目的として、平成 7 年 4 月 1 日から 5 年間の予定で技術協力を行ってきました。

プロジェクト協力期間の終了を 4 カ月後に控え、国際協力事業団は、平成 11 年 12 月 6 日から 12 月 15 日まで 10 日間、全国農業協同組合連合会畜産生産部技術主管 千葉寿夫氏を団長とする終了時評価調査団を現地に派遣し、中国側評価チームと合同でこれまでの活動実績などについて総合的な評価を行うとともに、今後の対応策などについて協議しました。

これらの評価結果は日本および中国双方の評価チームによる討議を経て合同評価報告書としてまとめられ、署名のうえ、両国の関係機関に提出されました。

本報告は、同調査団の調査および協議の結果を取りまとめたものであり、今後広く関係者に活用され、日本・中国両国の親善と国際協力の推進に寄与することを願うものです。

最後に、本調査の実施にあたりご協力をいただいた中国政府関係機関およびわが国の関係各位に厚く御礼申し上げるとともに、当国際協力事業団の業務に対して今後ともいっそうのご支援をお願いする次第です。

平成 12 年 1 月

国際協力事業団

理事 後藤 洋


プロジェクト・サイト位置図



沧州市の概要

プロジェクトがある河北省沧州市は中国の穀倉地帯、華北平原にあり、市の東部は渤海湾に面している。東西181km、南北165km、面積は14,033km²であり、日本の仙台とはほぼ同じ緯度にある。地形は殆ど平坦で海拔は7～10mである。沧州市は4市10県2区から構成され、人口は620万人で、そのうち約90%が農民である。地域全体としてみれば農業地域に位置づけられる。

沧州市は、北京市から約250km(列車・車で約4時間)天津から120km(同約2時間)南方にある。鉄道は京滬線(北京―上海)、道路は4本の国道が通り、交通の面では恵まれている。

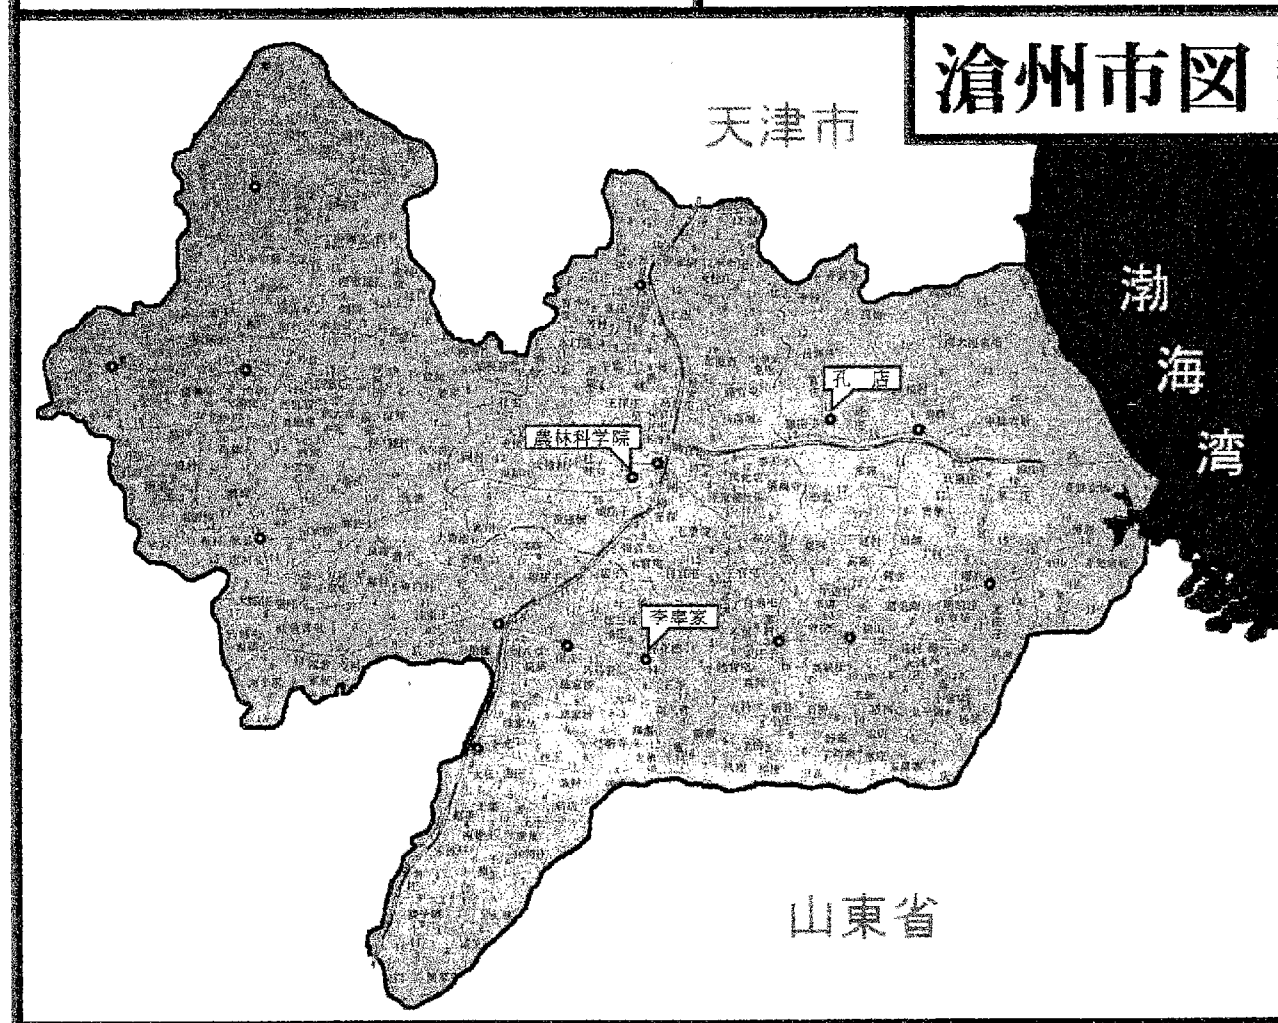





▲农林科学院 試驗園場



▲农林科学院 土壤分析室

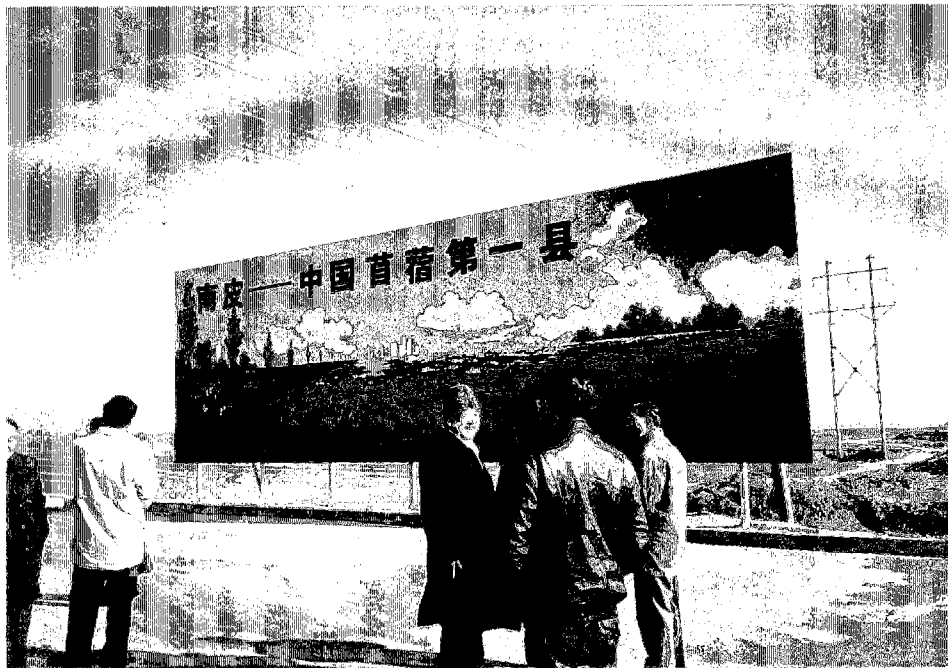

▲南皮県李皋家村のアルファルファ草地

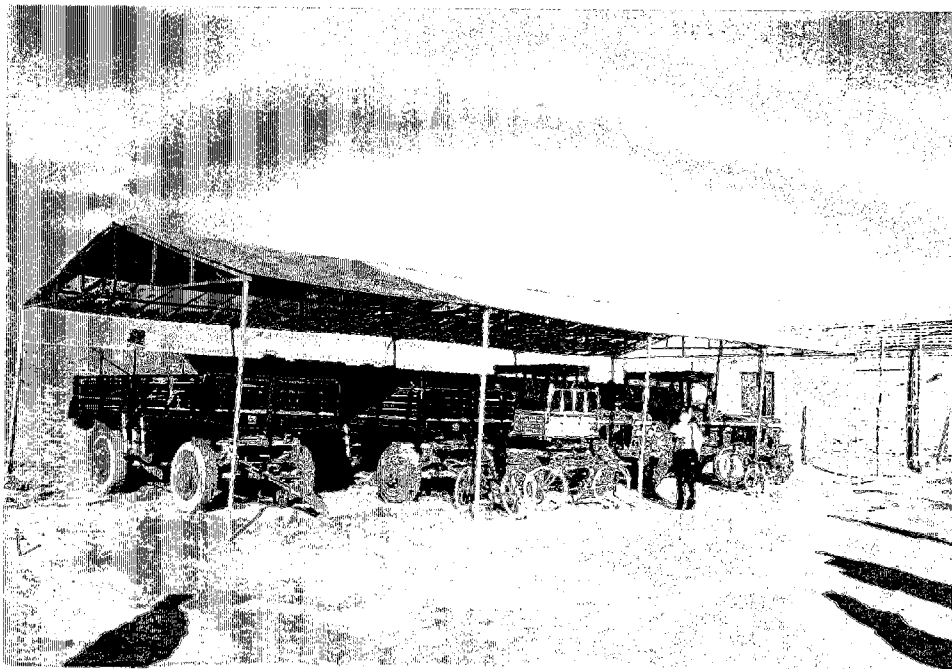

▲南皮県李皋家村の農機具庫

目 次

序文

プロジェクト・サイト位置図

写真

第1章 終了時評価調査団の派遣	1
1 - 1 調査団派遣の経緯と目的	1
1 - 2 調査団の構成	2
1 - 3 調査日程	3
1 - 4 主要面談者	4
1 - 5 終了時評価の方法	5
第2章 要約	7
第3章 プロジェクトの概要	9
3 - 1 協力の背景と経緯	9
3 - 2 協力の内容	9
第4章 プロジェクトの実績	11
4 - 1 投入実績	11
4 - 2 活動実績および達成状況	12
第5章 評価結果	17
5 - 1 目標達成度	17
5 - 2 実施の効率性	18
5 - 3 計画の妥当性	19
5 - 4 効果	20
5 - 5 自立発展の見通し	22
第6章 結論	25
6 - 1 評価結果の要約	25
6 - 2 提言	26

第7章 調査団所感	28
-----------------	----

資料

1 協議議事録：合同評価報告書（和文）.....	31
付属資料1 専門家派遣実績	49
2 カウンターパート研修実績	51
3 機材供与実績	53
4 日本側運営費負担	63
5 調査団派遣実績	64
6 カウンターパート配置一覧表	66
7 土地、建物、事務所、施設一覧表.....	68
8 中国側投入予算実績	75
9 TDIP に沿った活動実績および評価	76
10 当該計画期間中に作成された成果品	84
11 当該計画期間中に実施された研究発表、セミナー、収集データ	87
12 当該計画関連組織図	91
13 当該計画終了後の活動計画	93
2 協議議事録：合同評価報告書（中文）.....	101
3 プロジェクト方式技術協力終了時評価調査表	123
