

# ミャンマー・シードバンク計画 巡回指導（中間評価）調査団報告書

平成12年1月

国際協力事業団

## 序 文

国際協力事業団は、ミャンマー連邦国実施機関との討議議事録(R/D)等に基づき、ミャンマー・シードバンク計画を平成9年6月から5か年間の計画で実施しています。

本プロジェクトの協力開始後3年目にあたり、事業の進捗状況及び現状を把握して中間評価するとともに、相手国プロジェクト関係者及び派遣専門家に対し適切な指導と助言を行うことを目的として、当事業団は、平成11年11月28日から12月9日まで東京農業大学国際農業開発学科教授菊池文雄氏を団長とする巡回指導調査団を現地に派遣しました。

本報告書は、同調査団によるミャンマー国政府関係者との協議及び現地調査結果等を取りまとめたものであり、本プロジェクトの円滑な運営のために活用されることを願うものです。


終わりに、この調査にご協力とご支援を頂いた内外の関係各位に対し、心より感謝の意を表します。

平成12年1月

**国際協力事業団**

**農業開発協力部**

**部長 鮫 島 信 行**

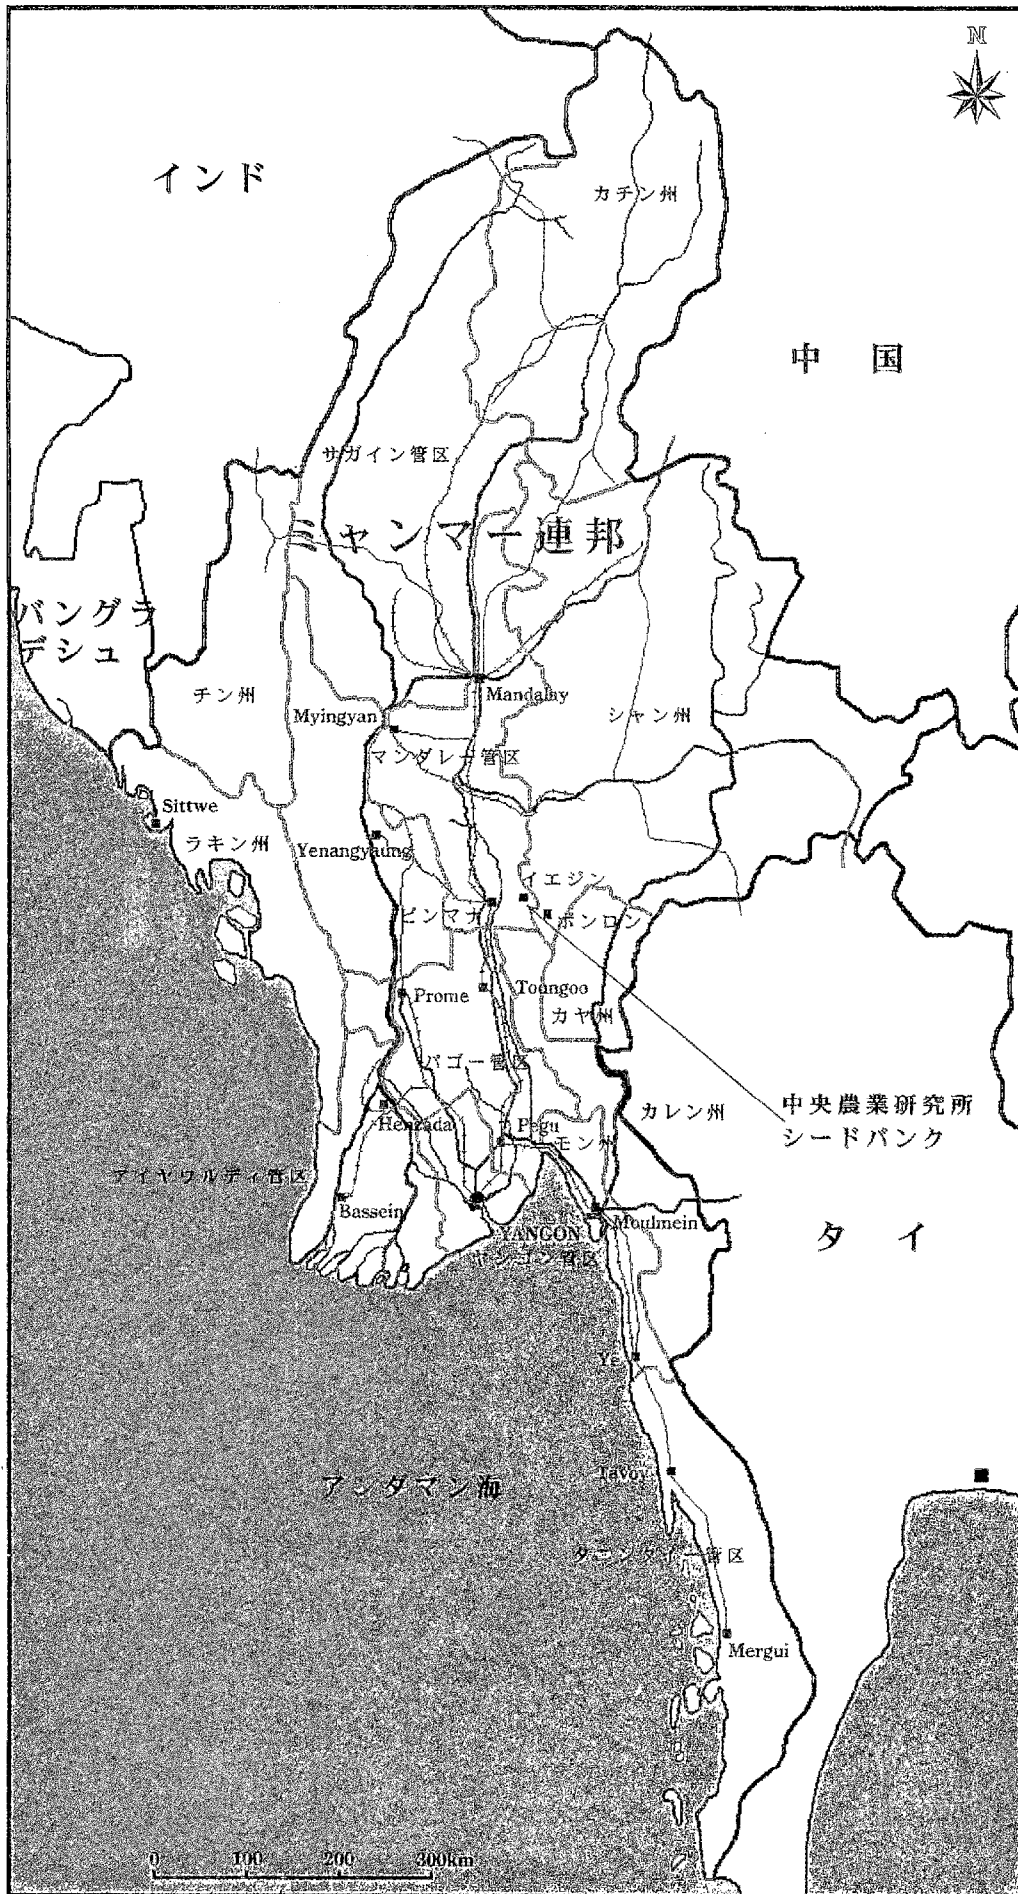

プロジェクトサイト位置図

# 目 次

序 文

地 図

1 . 巡回指導調査団の派遣 .....	1
1 - 1 調査団派遣の経緯と目的 .....	1
1 - 2 調査団の構成 .....	1
1 - 3 調査日程 .....	2
1 - 4 主要面談者 .....	2
1 - 5 中間評価の方法 .....	3
2 . 要 約 .....	5
3 . 評価結果 .....	7
3 - 1 計画の妥当性 .....	7
3 - 2 実施の効率性 .....	7
3 - 3 目標達成度 .....	7
3 - 4 効 果 .....	20
3 - 5 自立発展性の見通し .....	20
4 . 結論と提言 .....	21
5 . 調査団所見 .....	22
付属資料	
1 . 中間評価報告書( 英文 ) .....	27
2 . 中間評価報告書付表3 DIP項目の評価( 和文 ).....	50
3 . Progress in Seed Bank Project .....	54
4 . Album of Seed Bank Activities .....	93
